

# INTERVENTI COMMISSARIATI

## 24 feb. 2022

### Direzione Investimenti Area Sud



Febbraio 2022

# Commissario Straordinario: Roberto Pagone

- Completamento del raddoppio Pescara – Bari
- Realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari
- Potenziamento collegamento Lamezia Terme – Catanzaro Lido – Dorsale jonica



# Stato di avanzamento dei progetti commissariati

## Completamento del raddoppio Pescara – Bari. Tratta Termoli-Lesina

(Commissario: R. PAGONE)


### Descrizione dell'intervento

Il progetto completa il programma di raddoppio della direttrice Adriatica nella tratta Pescara – Bari ed interessa le Regioni Molise e Puglia.

Il progetto, inizialmente suddiviso in tre lotti funzionali (lotto 1: tratta Ripalta – Lesina interamente in Regione Puglia; lotto 2: tratta Termoli – Campomarino interamente nel territorio della Regione Molise; lotto 3: raddoppio tra Campomarino e Ripalta a cavallo tra Molise e Puglia) è attualmente articolato in due lotti funzionali:

Lotto 1: Ripalta –Lesina: totalmente in affiancamento tra Ripalta a Lesina.

Lotto 2: Termoli-Ripalta: parte in variante e parte in affiancamento, che recepisce la prescrizione della regione Molise.

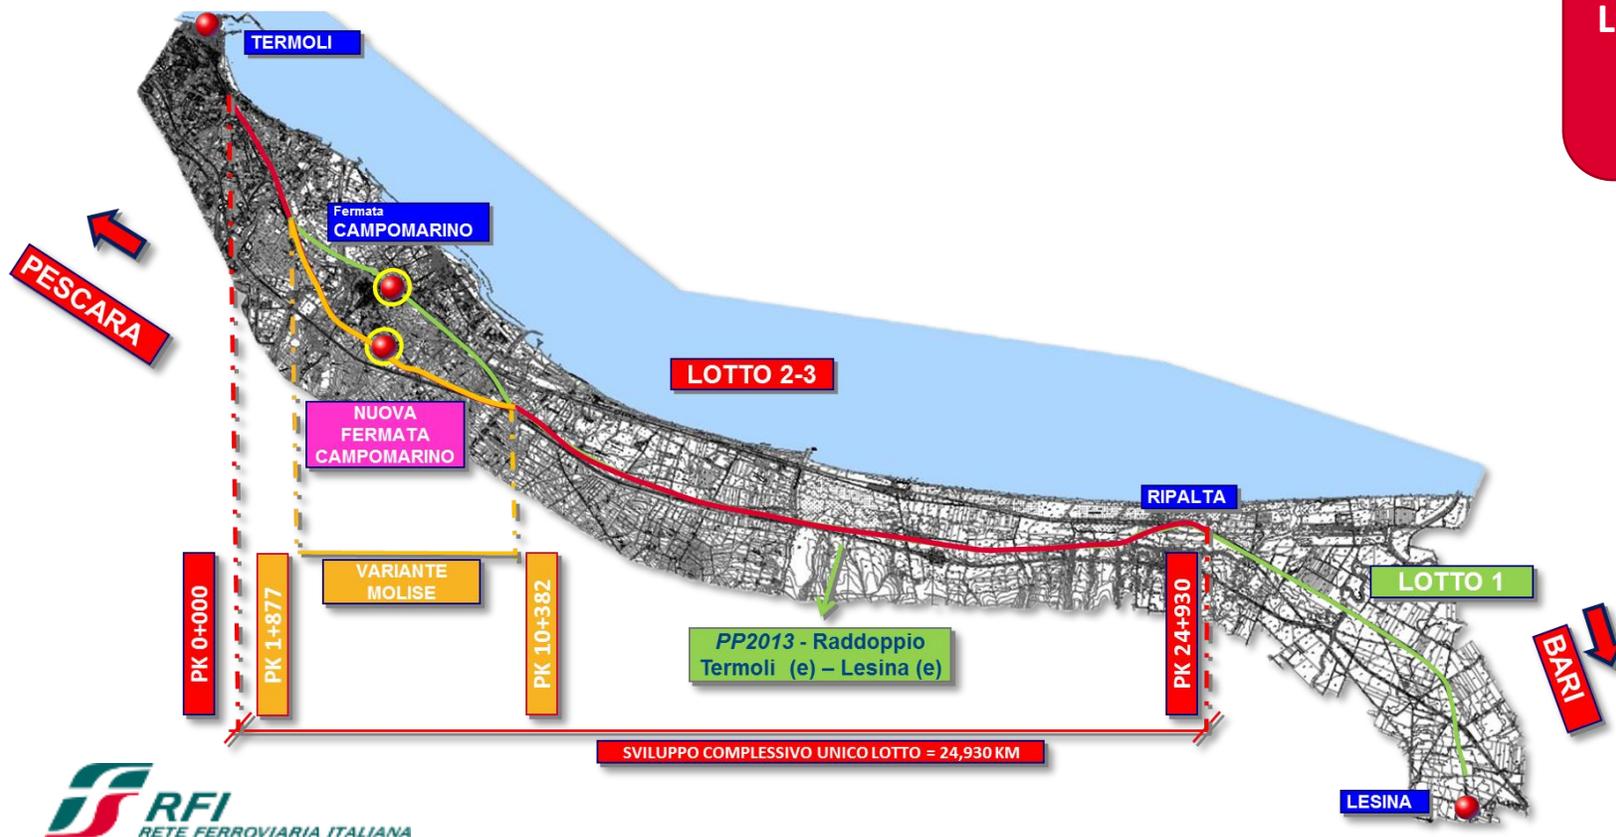

**CVI: 700 M€**  
**Finanziati: 700 M€**

**Avanzamento ad oggi:**  
**Lotto 1: in corso la progettazione esecutiva**  
**Lotto 2+3: avviata fase negoziale**

**Attivazione Ripalta – Lesina: 2025**  
**Attivazione Termoli - Ripalta: 2028**

### Stato di attuazione

#### LOTTO 1 (Ripalta – Lesina)

- Stipula convenzione marzo 2021
- Inizio lavori (BOE + cant.) dicembre 2021
- Attivazione 2^ trimestre 2025

### Stato di attuazione

#### LOTTO 2+3 (Termoli – Ripalta)

- Parere VIA aprile 2021
- Chiusura CdS aprile 2021
- Approvazione PD con Ord. Commissario n.3/21 del 24 giugno 2021
- Bando di gara inviato al GUCE in data 29/11/2021
- Inizio lavori aprile 2023
- Attivazione 3^ trimestre 2028

# Stato di avanzamento dei progetti commissariati

## Completamento del raddoppio Pescara – Bari. Tratta Termoli-Lesina

(Commissario: R. PAGONE)

### Programma di Riferimento – Ordinanza n. 2 del 21 – 06 – 2021


| Completamento del raddoppio Pescara – Bari |              |        |      |             |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
|--|--------------|--------|------|-------------|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
| Attività                                   | Inizio       | Durata |      | Fine        | 2021 |    |    | 2022 |    |    | 2023 |    |    | 2024 |    |    | 2025 |    |    | 2026 |    |    | 2027 |    |    | 2028 |    |    | 2029 |    |    |
|  |              | giorni | mesi |             | Q1   | Q2 | Q3 |
| <b>Termoli - Ripalta</b>                   |              |        |      |             |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Validazione PD                             | settembre-21 | 76     | 3    | novembre-21 | █    |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Attività Negoziali                         | novembre-21  | 215    | 7    | luglio-22   |      |    |    | █    |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Progettazione esecutiva, Verifica PE       | luglio-22    | 291    | 10   | aprile-23   |      |    |    | █    |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Fase realizzativa                          | aprile-23    | 1836   | 61   | aprile-28   |      |    |    | █    |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Completamento attività e Messa in Servizio | aprile-28    | 240    | 8    | dicembre-28 |      |    |    | █    |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| <b>Ripalta - Lesina</b>                    |              |        |      |             |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Progettazione esecutiva, Verifica PE       | marzo-21     | 260    | 9    | dicembre-21 | █    |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Fase realizzativa                          | dicembre-21  | 1030   | 34   | ottobre-24  |      |    |    | █    |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Completamento attività e Messa in Servizio | ottobre-24   | 240    | 8    | giugno-25   |      |    |    | █    |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |

| Criticità   | Azioni  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lotto 1 Ripalta – Lesina:</b> l'appaltatore ha richiesto una proroga dei tempi contrattuali della progettazione esecutiva.</li> </ul> | <p>Per recuperare lo scorrimento dovuto al ritardo della consegna della progettazione esecutiva da parte dell'Appaltatore è stato sottoscritto in data 23/12/2021 il 1° Atto Integrativo Modificativo per l'avvio anticipato delle BOE e della cantierizzazione. Nell'ambito della progettazione esecutiva, in corso di perfezionamento, si è concordato con l'appaltatore di recuperare completamente il ritardo maturato riducendo la durata dei lavori. Pertanto il recupero effettivo sarà confermato all'atto dell'approvazione del PE</p> |

# Stato di avanzamento dei progetti commissariati

## Realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari

(Commissario: R. PAGONE)

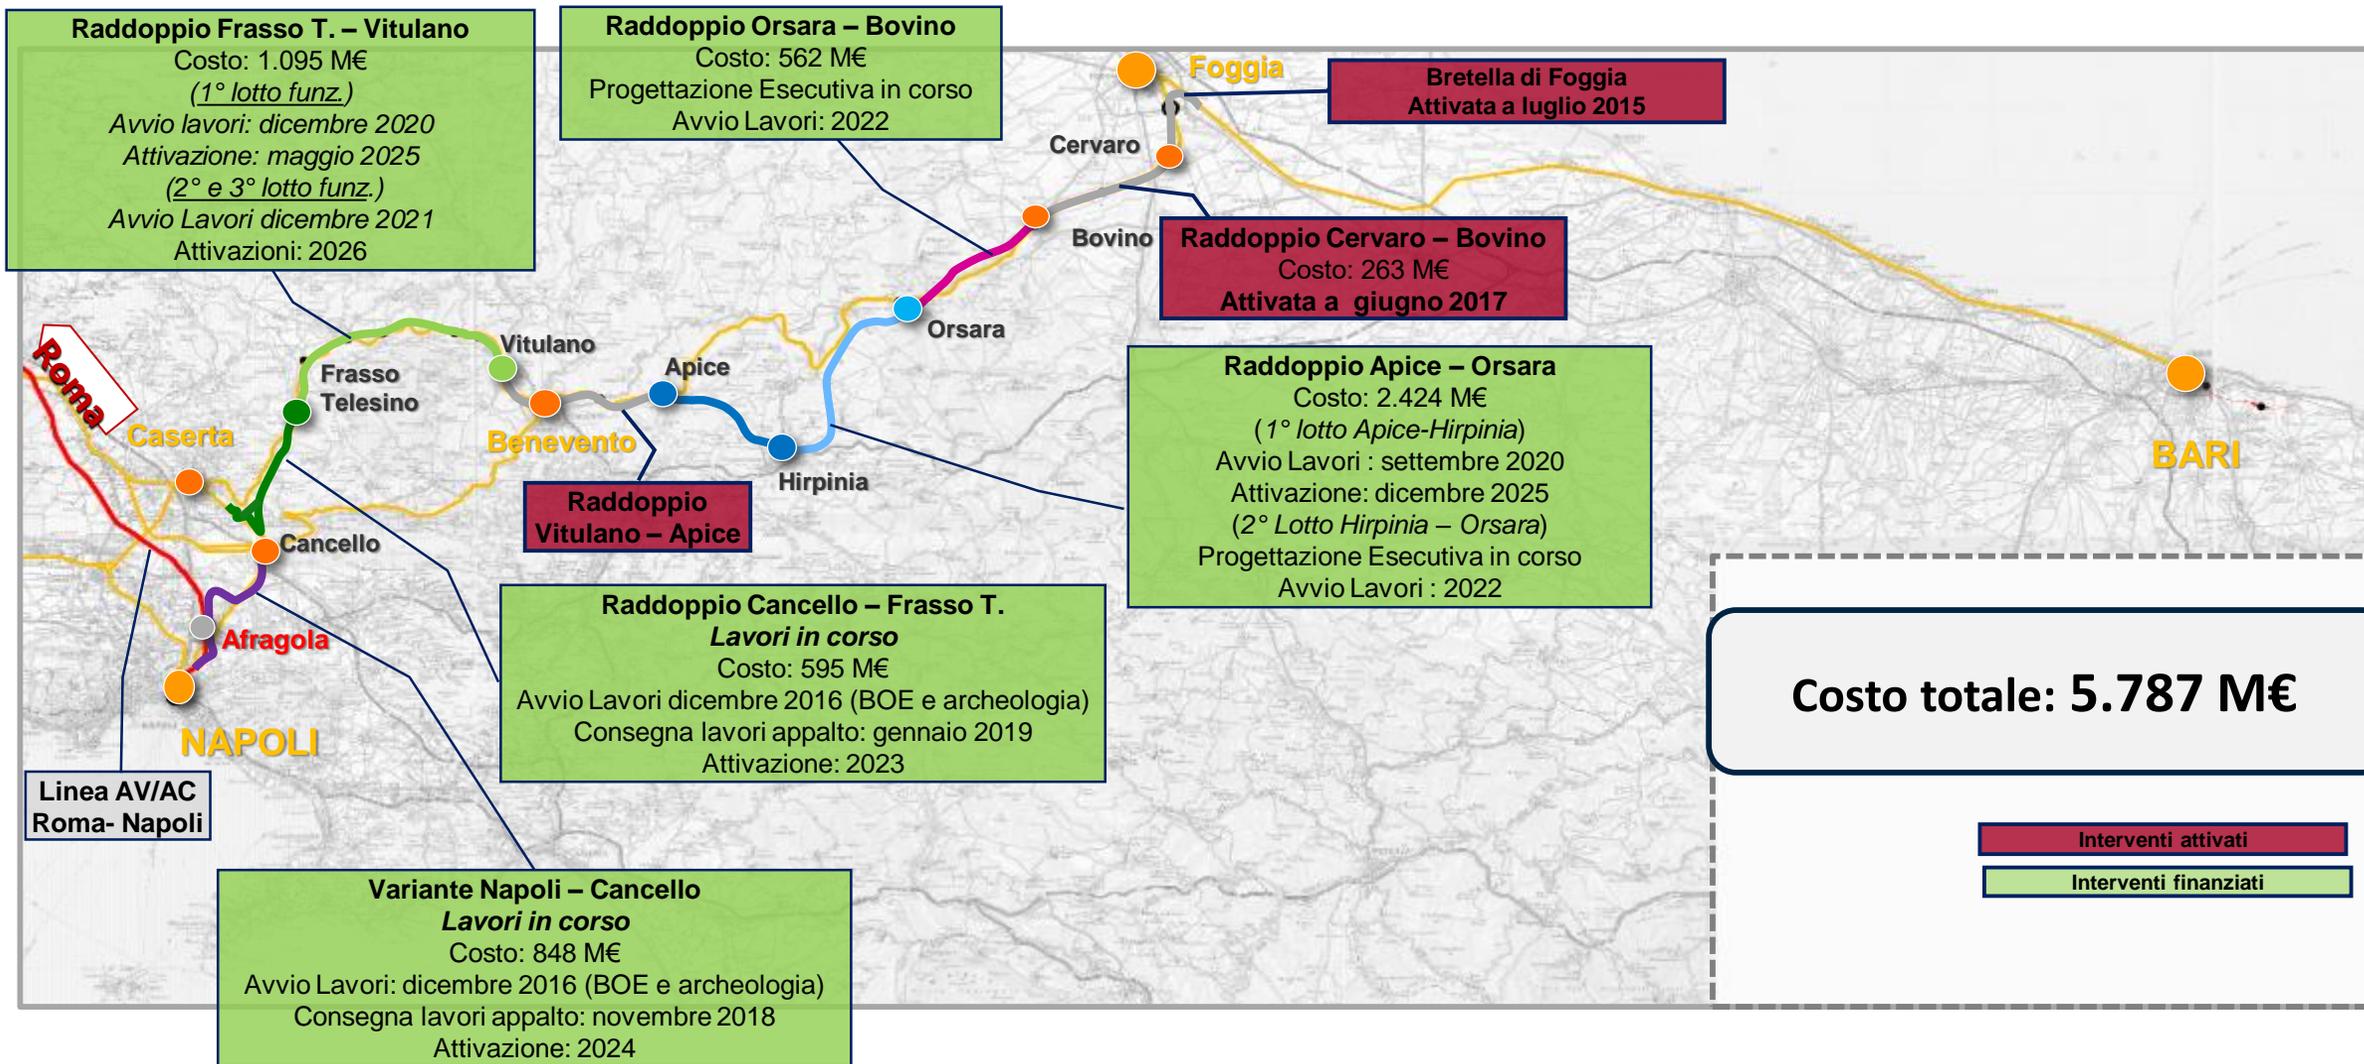

# Stato di avanzamento dei progetti commissariati

## Realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari

(Commissario: R. PAGONE)



### Programma di Riferimento – Ordinanza n. 2 del 21 – 06 – 2021

| Attività  | Inizio       | Durata |      | Fine        | 2021 |    |    | 2022 |    |    | 2023 |    |    | 2024 |    |    | 2025 |    |    | 2026 |    |    | 2027 |    |    | 2028 |    |    |
|---|--------------|--------|------|-------------|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
|   |              | giorni | mesi |             | Q1   | Q2 | Q3 |
| <b>Variante Napoli - Canello</b>                              |              |        |      |             |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Fase realizzativa   | dicembre-16  | 2662   | 89   | marzo-24    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Completamento attività e Messa in Servizio                    | marzo-24     | 92     | 3    | giugno-24   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| <b>Canello - Frasso Telesino</b>                              |              |        |      |             |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Fase realizzativa, completamento attività e Messa in Servizio | dicembre-16  | 2563   | 85   | dicembre-23 |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| <b>Frasso Telesino - Telese</b>                               |              |        |      |             |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Fase realizzativa   | dicembre-20  | 1550   | 52   | marzo-25    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Completamento attività e Messa in Servizio                    | marzo-25     | 60     | 2    | maggio-25   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| <b>Telese - San Lorenzo</b>                                   |              |        |      |             |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Progettazione Esecutiva + VPE                                 | dicembre-20  | 359    | 12   | dicembre-21 |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Fase realizzativa   | dicembre-21  | 1489   | 50   | gennaio-26  |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Completamento attività e Messa in Servizio                    | gennaio-26   | 60     | 2    | marzo-26    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| <b>San Lorenzo - Vitulano</b>                                 |              |        |      |             |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Progettazione Esecutiva + VPE                                 | dicembre-20  | 359    | 12   | dicembre-21 |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Fase realizzativa   | dicembre-21  | 1599   | 53   | maggio-26   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Completamento attività e Messa in Servizio                    | maggio-26    | 90     | 3    | agosto-26   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| <b>Apice - Hirpinia</b>                                       |              |        |      |             |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Fase Realizzativa   | settembre-20 | 1850   | 62   | ottobre-25  |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Completamento attività e Messa in Servizio                    | ottobre-25   | 60     | 2    | dicembre-25 |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| <b>Hirpinia - Orsara (non in PNRR)</b>                        |              |        |      |             |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Attività Negoziali  | novembre-20  | 244    | 8    | luglio-21   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Progettazione Esecutiva + VPE                                 | luglio-21    | 210    | 7    | febbraio-22 |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Fase Realizzativa   | febbraio-22  | 1997   | 67   | luglio-27   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Completamento attività e Messa in Servizio                    | giugno-27    | 60     | 2    | agosto-27   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| <b>Orsara - Bovino</b>  |              |        |      |             |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Attività Negoziali  | ottobre-20   | 262    | 9    | giugno-21   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Progettazione Esecutiva + VPE                                 | giugno-21    | 210    | 7    | gennaio-22  |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Fase Realizzativa   | gennaio-22   | 1735   | 58   | ottobre-26  |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |
| Completamento attività e Messa in Servizio                    | ottobre-26   | 60     | 2    | dicembre-26 |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |

# Stato di avanzamento dei progetti commissariati

Realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari

(Commissario: R. PAGONE)

| Criticità  | Azioni   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ritrovamenti archeologici:</i> pur avendo eseguito l'archeologia preventiva durante la fase di progettazione definitiva di concerto con la Soprintendenza, comunque durante il corso dei lavori si stanno ritrovando numerosi reperti/siti archeologici diffusi lungo il tracciato del "Raddoppio in variante della Linea Napoli – Cancello" e del "Raddoppio Cancello – Frasso Telesino" e del "Raddoppio Frasso Telesino – Vitulano".</li> </ul> <p>Gli scavi in modalità archeologica sono ancora in corso su vaste aree non ancora svincolate e molti ritrovamenti stanno impattando pesantemente sul percorso critico del programma lavori.</p> | <p>il Commissario si è reso parte attiva nel monitoraggio dell'avanzamento delle risoluzioni delle criticità archeologiche partecipando alle riunioni appositamente organizzate dalla Referenza di Progetto con tutti gli attori interessati.</p> <p>Il Commissario ha inviato il 26 luglio 2021 nota alle Soprintendenze competenti per chiedere un incontro tecnico-istituzionale finalizzato all'individuazione di un percorso condiviso che coniugasse le esigenze di conoscenza e documentazione del sito archeologico con il rispetto dei tempi di realizzazione delle opere.</p> <p>Il Commissario ha inviato il 21 ottobre 2021 nota alle Soprintendenze, al MiC e al MIMS per evidenziare i possibili impatti del permanere di alcune criticità archeologiche che metterebbero a rischio il rispetto dell'obiettivo di attivazione del collegamento diretto Napoli – Bari programmato a dicembre 2023. Contestualmente il Commissario ha chiesto la possibilità di adottare qualsivoglia azione utile che, garantendo la corretta esecuzione delle attività di indagini archeologiche, consenta il rispetto dei tempi di attivazione della linea già comunicati e concordati con il MIMS.</p> <p>In data 5 novembre 2021 il MiC ha riscontrato le sopracitate note, invitando le Soprintendenze interessate a valutare e porre in essere tutte le soluzioni operative finalizzate a contemperare il rispetto delle tempistiche di realizzazione del progetto con le precipue finalità di tutela del patrimonio archeologico dello Stato</p> |

# Stato di avanzamento dei progetti commissariati

Realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari

(Commissario: R. PAGONE)

| • <i>Criticità</i>   | • <i>Azioni</i>  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Risoluzione delle interferenze con sottoservizi:</i> nonostante RFI si sia fatta parte attiva con gli Enti interferiti stipulando prima dell'avvio dei lavori specifiche Convenzioni tese alla risoluzione delle interferenze, permangono alcune criticità con TERNA e SNAM in parte connesse a problematiche archeologiche che gli stessi enti interferiti stanno incontrando.</li> </ul> | <p>Il Commissario si è reso parte attiva nel monitoraggio dell'avanzamento delle risoluzioni delle interferenze sulle tratte per le quali sono state sottoscritte le suddette Convenzioni, affiancando la Referenza di Progetto nel promuovere le interlocuzioni tra gli Enti interferenti e le Soprintendenze competenti.</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rispetto del cronoprogramma</i></li> </ul>   | <p>Allo scopo di garantire il rispetto del cronoprogramma generale delle attività il Referente di Progetto, in accordo con il Commissario, ha provveduto ad effettuare la consegna delle prestazioni in via d'urgenza, in anticipo alla stipula delle Convenzioni con gli appaltatori, per l'avvio delle progettazioni esecutive relativamente ai lotti "Hirpinia – Orsara" e "Orsara – Bovino".</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ritardi maturati durante la fase di progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore</i> (Lotto «Telese-S-Lorenzo-Vitulano», Lotto «Hirpinia-Orsara» e Lotto «Orsara-Bovino»)</li> </ul>  | <p>Al fine di ridurre la durata della fase esecutiva per rientrare con l'ultimazione dei lavori entro la pianificazione di riferimento, saranno analizzate e successivamente attuate ottimizzazioni all'organizzazioni di cantiere ed al cronoprogramma delle attività realizzative.</p>   |

# Stato di avanzamento dei progetti commissariati

## Potenziamento collegamento Lamezia Terme - Catanzaro Lido - Dorsale Jonica (Commissario: R. PAGONE)

### Descrizione Progetto


Gli interventi, individuati nel Protocollo d'Intesa del 18.10.2016, si articolano nei seguenti macro interventi e fasi funzionali:

- Potenziamento infrastrutturale ed elettrificazione Lamezia Terme - Catanzaro Lido
  - ✓ Fase funzionale 1 – Potenziamento Lamezia Terme – Settingiano
  - ✓ Fase funzionale 2 – Elettrificazione Lamezia Terme – Catanzaro Lido
- Elettrificazione Linea Jonica
  - ✓ Fase funzionale 1 – Elettrificazione Catanzaro Lido – Crotona
  - ✓ Fase funzionale 2 – Elettrificazione Crotona – Sibari

### Stato d'attuazione

Il PFTE degli interventi di Potenziamento Lamezia Terme - Settingiano e di Elettrificazione delle tratte della linea jonica è stato trasmesso in data 9 novembre 2021 al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'espressione del parere di competenza.

Il 3 gennaio 2022 è stata inviata al MiTE l'istanza per l'avvio della procedura VIA.

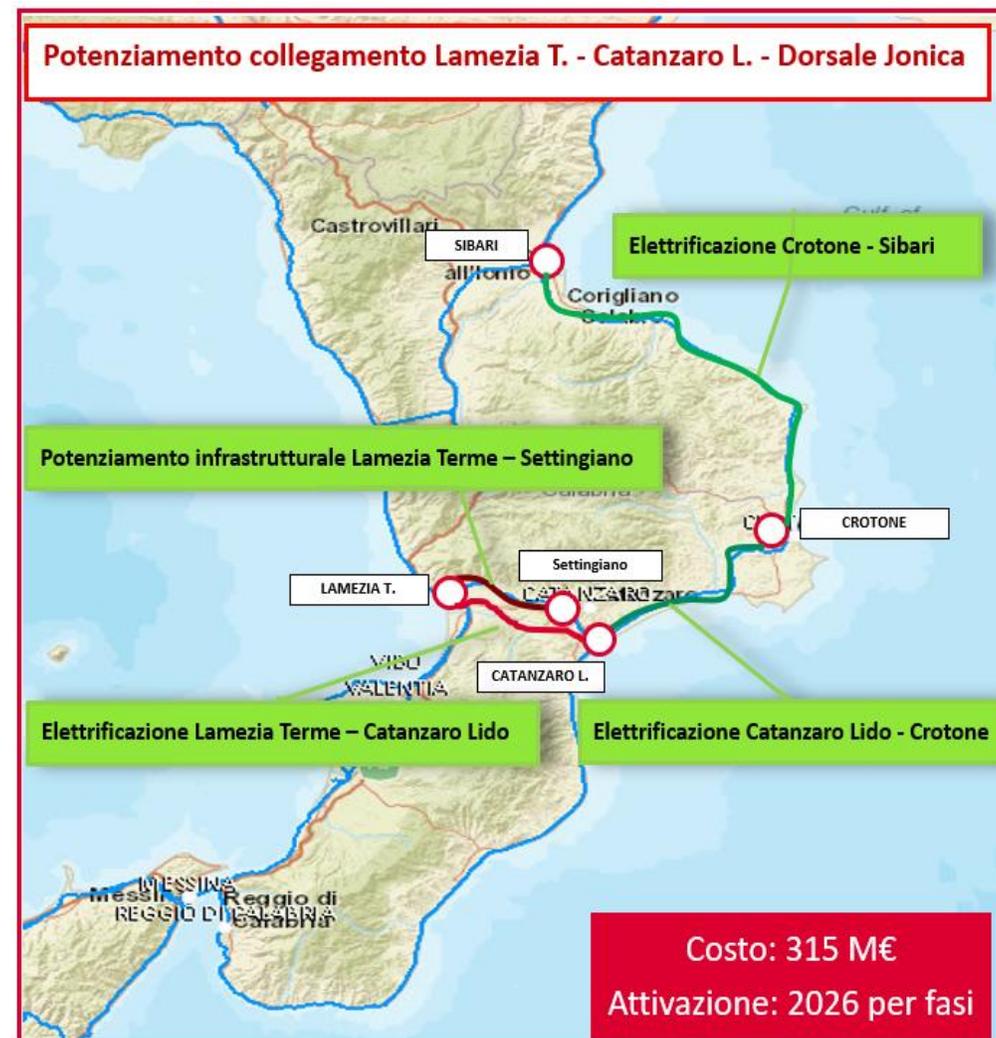

**Costo: 315 M€**  
**Attivazione: 2026 per fasi**

| Intervento  | Costo  | Risorse disponibili al 2018-2019 | Nuove Risorse PNRR e altro | Attivazione |
|---|--------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| Potenziamento collegamento Lamezia Terme – Catanzaro Lido -Dorsale Jonica | 315 M€ | 221 M€                           | 94 M€                      | 2026        |

# Stato di avanzamento dei progetti commissariati

## Potenziamento collegamento Lamezia Terme - Catanzaro Lido - Dorsale Jonica (Commissario: R. PAGONE)

| Potenziamento collegamento Lamezia Terme - Catanzaro Lido - Dorsale jonica                   |              |        |      |              |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
|--|--------------|--------|------|--------------|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|--|--|
| Attività   | Inizio       | Durata |      | Fine         | 2021 |    |    | 2022 |    |    | 2023 |    |    | 2024 |    |    | 2025 |    |    | 2026 |  |  |
|  |              | giorni | mesi |              | Q1   | Q2 | Q3 |      |  |  |
| Redazione PFTE per CSLLPP  | giugno-21    | 154    | 5    | novembre-21  |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Verifica preventiva interesse archeologico   | giugno-21    | 364    | 12   | maggio-22    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Verifica preventiva di primo livello PFTE  | ottobre-21   | 15     | 1    | novembre-21  |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Trasmissione del PFTE da parte di RFI al CSLLPP  | novembre-21  | 0      | 0    | novembre-21  |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Parere CSLLPP  | novembre-21  | 45     | 2    | dicembre-21  |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Valutazione di Impatto Ambientale  | gennaio-22   | 205    | 7    | luglio-22    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Redazione Progetto Definitivo  | dicembre-21  | 213    | 7    | luglio-22    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Iter autorizzativo con Commissario   | luglio-22    | 65     | 2    | settembre-22 |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio | luglio-22    | 30     | 1    | agosto-22    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Ordinanza del Commissario per approvazione PD  | settembre-22 | 15     | 1    | ottobre-22   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Adeguamento PD a prescrizioni iter e documenti di gara                                       | settembre-22 | 30     | 1    | ottobre-22   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Verifica e Validazione   | ottobre-22   | 60     | 2    | dicembre-22  |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Attività Negoziali   | dicembre-22  | 180    | 6    | giugno-23    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |
| Progettazione esecutiva, Verifica PE e realizzazione   | giugno-23    | 1107   | 37   | giugno-26    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |  |  |

| Criticità   | Azioni   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto del cronoprogramma</li> </ul> | <p>Si sta valutando la possibilità di attivare gli interventi per fasi funzionali anche con la definizione di un piano di committenza specifico da adottare all'atto dell'affidamento dei lavori. Saranno, pertanto, valutate possibili ottimizzazioni sul cronoprogramma al fine di garantire le tempistiche previste</p> |
