


SISTEMI URBANI
Roma: linee D e C metropolitana, GRA
Completamento G.R.A. di Roma

SCHEDA N. 104



LOCALIZZAZIONE

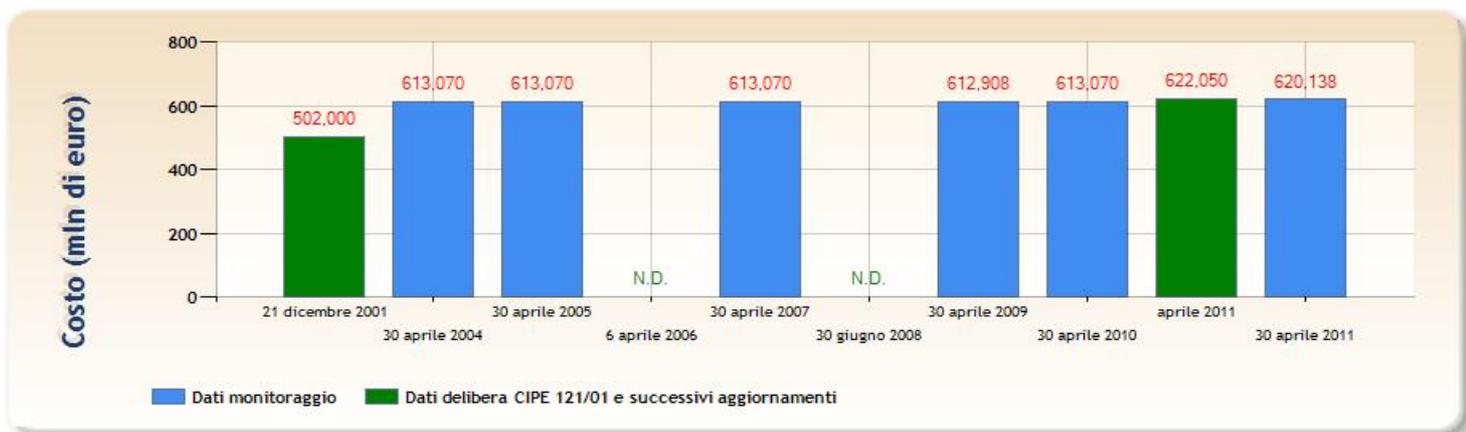

CUP:

F81B07000260001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete stradale

SOGGETTO TITOLARE:

ANAS Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

107/2002
73/2008

ULTIMAZIONE LAVORI

2011

DESCRIZIONE

Il progetto "Completamento Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma" consiste nella realizzazione della terza corsia nel Quadrante Nord-Ovest del GRA di Roma, tratto della lunghezza complessiva di 18,350 Km, compreso tra le uscite Aurelia e Flaminia. Il progetto dell'ANAS prevede l'allargamento della piattaforma stradale a 33,5 metri, con tre corsie da 3,75 metri per senso di marcia, corsie di emergenza da 3,5 metri e spartitraffico da 4 metri. Dopo l'ultimazione dei lavori, tutto il GRA sarà a 3 corsie, e i benefici si potranno apprezzare nell'ambito della fluidità di traffico, dell'inquinamento atmosferico e della sicurezza stradale. In molti tratti verrà corretto il tracciato ed elevati gli attuali standard di sicurezza (in conformità al D.Lgs 494/96) mentre per 3 chilometri l'ammodernamento sarà in variante, anche con nuovi viadotti e gallerie. Nello specifico il progetto si articola in 9 interventi:

- Boccea - 2° lotto - 1° stralcio: dal Km 0+450 al km 3+700
- Casal del Marmo - 2° lotto - 2° stralcio: dal Km 3+700 al km 6+000
- Selva Candida - 3° lotto - 1° stralcio: dal Km 6+000 al km 9+900
- Trionfale - 3° lotto - 2° stralcio: dal Km 9+900 al km 11+250
- Cassia- 3° lotto - 3° stralcio: dal Km 11+250 al km 12+650
- Cassia - 3° lotto – 3° stralcio (dal Km 11+250 al km 12+650)-Progetto di completamento
- Parco Vejo - 4° lotto: dal Km 12+650 al km 13+900
- Sant'Andrea - 5° lotto: dal Km 13+900 al km 17+400
- Flaminia - 6° lotto - 1° stralcio: dal Km 17+400 al km 18+800

DATI STORICI

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra i "sistemi urbani" insieme alla metropolitana di Roma–linee C e B1, per un costo totale di 2,9 Meuro.

2002

L'ANAS pubblica i bandi di gara degli 8 sottointerventi.

Il MIT trasmette la relazione istruttoria proponendo un primo finanziamento.

Il CIPE, con delibera n. 107, prende atto che l'intervento dispone di progettazione esecutiva, di VIA ed è stato sottoposto con esito positivo alla CdS e che è in corso la procedura di affidamento. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in 613,07 Meuro e al progetto "Autostrada del GRA di Roma" viene destinato l'importo complessivo di 392,2 Meuro in termini di volume di investimenti. L'onere relativo a ciascuna annualità del triennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dalla legge n. 166/2002 per la stessa annualità: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 5,09 Meuro per il limite relativo al 2002, 14,5 Meuro per il limite relativo al 2003 e 17,97 Meuro per il limite relativo al 2004. I restanti 220,8 Meuro sono indicati come disponibilità.

Vengono aggiudicati i lavori relativi a sei degli otto sottointerventi.

2003

Nel mese di dicembre vengono aggiudicati i rimanenti due sottointerventi.

2006

Il 9 febbraio vengono inaugurati i seguenti lotti:

- Boccea - 2° lotto - 1° stralcio: dal Km 0+450 al km 3+700
- Casal del Marmo - 2° lotto - 2° stralcio: dal Km 3+700 al km 6+000
- Selva Candida - 3° lotto - 1° stralcio: dal Km 6+000 al km 9+900
- Sant'Andrea - 5° lotto: dal Km 13+900 al km 17+400

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS

2007

Al 30 aprile risultano in fase di completamento gli ultimi due lotti: 6 e 3 lotto 2 stralcio.

L'ANAS, in data 18 dicembre, pubblica il bando di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di adeguamento a 3 corsie per ogni senso di marcia Quadrante Nord Ovest - Lotto 3° - 3° Stralcio dal km 11 + 250 al km 12 + 650 – Progetto di completamento.

2008

Il CIPE, con delibera n. 73, autorizza l'ANAS ad integrare, mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, il contratto di mutuo intercorso il 16 gennaio 2004 con Banca Intesa Spa al fine di conseguire – tramite l'integrale utilizzo della quota di limite d'impegno assegnata alla Società, da ultimo, con delibera n. 63/2003 per la realizzazione della terza corsia del GRA – un incremento del volume di investimento, stimato al tasso attualmente praticato in circa 43 Meuro. Tale importo verrà utilizzato per la parziale copertura economica dell'onere connesso alle perizie di variante.

L'ANAS, in data 30 ottobre, affida l'appalto dei lavori di adeguamento a 3 corsie per ogni senso di marcia Quadrante Nord Ovest - Lotto 3° - 3° Stralcio dal km 11 + 250 al km 12 + 650 – Progetto di completamento, all'impresa Oberosler Cav. Pietro Spa.

L'ANAS, in data 27 novembre, comunica l'apertura al traffico dell'ultimo tratto ammodernato di 1,4 km (3°Lotto/3° Stralcio) del GRA, in carreggiata esterna, nell'ambito del quale è compresa anche la nuova Galleria Cassia (lunga 700 metri), e consegna i lavori per il completamento della nuova galleria "Cassia" sulla carreggiata interna.

2009

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

Nel DPEF 2010-2013 viene riportato l'intervento "GRA Adeguamento a tre corsie: lotti in completamento" con un costo di 613,07 Meuro, interamente finanziato, ed uno stato dell'arte "ultimati/finanziati in corso"

2010

Il 17 giugno vengono sequestrati 3 cantieri relativi allo svincolo della Cassia, per danni alle vicine abitazioni.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Grande Raccordo Anulare di Roma Quadrante Nord - Ovest" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010", articolata in 8 interventi.

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

A gennaio, a seguito dell'autorizzazione della Procura della Repubblica di Roma, le attività sullo svincolo della Cassia sono parzialmente riprese.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera " Grande Raccordo Anulare di Roma Quadrante Nord - Ovest" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)", articolata in 8 interventi; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori". Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risultano conclusi e collaudati i lavori relativi al lotto 2-stralcio 2; lotto 3-stralci 1,2,3; lotto 4; lotto 5; lotto 6. Inoltre, la percentuale di avanzamento lavori per il lotto 2- stralcio 1 è del 99,19%, mentre il lotto 3 stralcio 1 è in attesa di collaudo. Infine risulta del 91,31% l'avanzamento dei lavori di completamento del lotto 3 lotto che, dopo essere stati sospesi dal Tribunale di Roma in data 17 giugno 2010, sono stati ripresi parzialmente il 31 gennaio 2011.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001

502,000 **Fonte:** Delibera CIPE 121/2001

Previsione di costo al 30 aprile 2004	613,070 Fonte: Delibera CIPE 107/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2005	613,070 Fonte: Delibera CIPE 107/2002
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	613,070 Fonte: Delibera CIPE 107/2002
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	612,908 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	613,070 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	622,050 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	620,138 Fonte: ANAS Spa

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	624,560 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	624,560
Fondi Legge Obiettivo	392,230 Fonte: Delibera CIPE 107/2002
Fondi Pubblici	232,330 Fonte: DEF 2012-2014

Fondi residui: **-4,422**

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Bandi di gara ANAS Spa del Gennaio 2002
 Delibera CIPE 107/2002 del 29 Novembre 2002
 Avvisi di aggiudicazione ANAS Spa del Febbraio 2003
 Bando di gara ANAS Spa (3° lotto, 3° stralcio, progetto completamento) del Dicembre 2007
 Delibera CIPE 73/2008 del 1 Agosto 2008
 Avviso di aggiudicazione ANAS Spa (3° lotto, 3° stralcio, progetto completamento) del Novembre 2008

Boccea - 2° lotto - 1° stralcio: dal Km 0+450 al km 3+700

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	47.049.223,51
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	361.932,99
Nome aggiudicatario:	ATI PROGIN SPA - ITALPROGETTI SRL

Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 06/07/2000
Data fine: 03/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 800 giorni
Data bando: 23/01/2002
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 13/12/2002
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: SEAS SPA - BOCOGE SPA
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 02/10/2003

Quadro economico:

Importo a base gara: 45.964.664,02
Importo oneri per la sicurezza: 1.084.559,49
Importo complessivo a base di gara: 47.049.223,51
Importo aggiudicazione: 38.080.598,27
Somme a disposizione: 22.476.204,25
Totale: 60.556.802,52
% Ribasso di aggiudicazione: 19,51
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 31/03/2003
Data presunta fine lavori: 30/12/2005
Stato avanzamento importo: 45.662.523,98
Stato avanzamento percentuale: 99,19
Data effettiva inizio lavori: 31/03/2003
Data effettiva fine lavori: 19/08/2008
Data presunta fine lavori varianti: 07/02/2006
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Con nota CDG-000182-P del 18.01.2010 la Direzione Generale dell'ANAS comunicava al Compartimento il fallimento dell'Impresa esecutrice SEAS S.p.A e contestuale affitto ramo d'azienda all'Impresa SEAS S.r.l. A tal riguardo è stato più volte sollecitato il Curatore fallimentare ad attivare le iniziative di competenza necessarie per la chiusura tecnico - contabile dei lavori."

Contenzioso:

Totale riserve definite:	25
Importo totale riserve definite:	25.524.815,37
Totale riserve da definire:	2
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	1
Totale giorni sospensione:	40
Note:	

Varianti:

Numero totale:	4
Giorni proroga totali:	245
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	44.687.170,25
Importo oneri sicurezza:	1.349.799,25
Somme a disposizione:	17.756.830,14
Totale:	63.793.799,64
Note:	

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	2005
Previsione al 30/04/2005	2005
Previsione al 30/04/2007	2006
Previsione al 30/04/2009	2006
Previsione al 30/04/2010	2008
Previsione al 30/04/2011	2008

Casal del Marmo - 2° lotto - 2° stralcio: dal Km 3+700 al km 6+000

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	44.231.395,50
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	382.178,11
Nome aggiudicatario:	ATI PROGER SPA - STE SPA

Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 06/07/2000
Data fine: 03/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 800 giorni
Data bando: 23/01/2002
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 27/01/2003
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ATI OBEROSLER CAV. PIETRO SPA - SAISEB SPA
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 02/10/2003

Quadro economico:
Importo a base gara: 42.203.785,71
Importo oneri per la sicurezza: 2.027.609,79
Importo complessivo a base di gara: 44.231.395,50
Importo aggiudicazione: 36.647.417,74
Somme a disposizione: 21.296.801,93
Totale: 57.944.219,67
% Ribasso di aggiudicazione: 17,97
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 31/03/2003
Data presunta fine lavori: 01/12/2005
Stato avanzamento importo: 39.371.866,08
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 31/03/2003
Data effettiva fine lavori: 01/12/2005
Data presunta fine lavori varianti: 01/12/2005
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 07/02/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo: 13/02/2009
Note: L'approvazione del Collaudo è avvenuta con nota della Direzione Generale ANAS n. 21555 del 13.02.2009

Contenzioso:

Totale riserve definite: 19
Importo totale riserve definite: 7.414.419,16
Totale riserve da definire:

Note: Le riserve sono state defibnite con 2 componenti bonari Art. 31 bis - Legge 109/94 per un importo complessivo di € 7.414.419,19. La riserva n. 7 relativa alla richiesta di compensazione revisionale dell'acciaio è stata definita e liquidata mediante un apposito finanziamento.

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione: 922
Note:

Varianti:

Numero totale: 4
Giorni proroga totali: 245
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 37.273.087,25
Importo oneri sicurezza: 2.086.814,55
Somme a disposizione: 16.810.292,75
Totale: 56.170.194,55
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	2005
Previsione al 30/04/2005	2005
Previsione al 30/04/2007	2006
Previsione al 30/04/2009	2006
Previsione al 30/04/2010	2006
Previsione al 30/04/2011	2005

Selva Candida - 3° lotto - 1° stralcio: dal Km 6+000 al km 9+900

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE: No
Importo lavori: 55.643.066,31
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 459.646,64
Nome aggiudicatario: SELPRO (ora SILEC SPA) - SOTECNI SPA
Codice fiscale aggiudicatario:

Data inizio: 06/07/2000
Data fine: 04/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori: 800 giorni
Data bando: 23/01/2002

CIG/CUI:

Data aggiudicazione: 27/01/2003
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: GHELLA S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 00898971007
Data contratto: 14/10/2003

Quadro economico:

Importo a base gara: 52.616.628,88
Importo oneri per la sicurezza: 3.026.437,43
Importo complessivo a base di gara: 55.643.066,31
Importo aggiudicazione: 44.919.271,26
Somme a disposizione: 24.152.606,55
Totale: 69.071.877,81
% Ribasso di aggiudicazione: 20,38
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 31/03/2003
Data presunta fine lavori: 07/06/2005
Stato avanzamento importo: 68.355.130,99
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 31/03/2003
Data effettiva fine lavori: 30/03/2006
Data presunta fine lavori varianti: 02/04/2006
Tempi realizzazione: Secondo previsione

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:

Note: Il Collaudo Statico è stato emesso in data 16.01.2006. Con Comunicazione Interna della Direzione Generale ANAS in data 05.11.2009 sono stati riconsegnati gli Atti di Contabilità Finale debitamente revisionati. Per l'approvazione del Certificato di Collaudo si è in attesa del completamento delle procedure espropriative da parte dell'Appaltatore.

Contenzioso:

Totale riserve definite: 118
Importo totale riserve definite: 12.951.427,57

Totale riserve da definire: 52
Note: Si è concluso il primo componimento bonario ai sensi dell'Art. 31 bis, per le riserve dalla n. 1 alla 17, con il riconoscimento all'Impresa di € 5.852.397,57. Si è concluso il secondo componimento bonario ai sensi dell'Art. 31 bis per le riserve dalla n. 18 alla 118, con il riconoscimento all'Impresa di € 7.098.490,00.

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 5
Giorni proroga totali: 300
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 62.938.754,95
Importo oneri sicurezza: 5.416.376,04
Somme a disposizione: 27.337.564,21
Totale: 95.692.695,20
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	2005
Previsione al 30/04/2005	2005
Previsione al 30/04/2007	2006
Previsione al 30/04/2009	2006
Previsione al 30/04/2010	2006
Previsione al 30/04/2011	2006

Trionfale - 3° lotto - 2° stralcio: dal Km 9+900 al km 11+250

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE: No
Importo lavori: 61.977.698,86
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 519.882,04

Nome aggiudicatario: IN.CO. Ingegneri Consulenti S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 00736780156
Data inizio: 06/07/2000
Data fine: 04/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 900 giorni
Data bando: 23/01/2002
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: C.M.B. - CONSORZIO COOP. COSTRUTTORI - COLLINI - SO.CO.STRA.MO

Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 15/09/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 59.643.313,68
Importo oneri per la sicurezza: 2.334.385,18
Importo complessivo a base di gara: 61.977.698,86
Importo aggiudicazione: 48.502.485,00
Somme a disposizione: 20.713.423,92
Totale: 69.215.908,92
% Ribasso di aggiudicazione: 22,59
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 09/02/2004
Data presunta fine lavori: 28/06/2006
Stato avanzamento importo: 63.952.833,10
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 16/02/2004
Data effettiva fine lavori: 19/12/2008
Data presunta fine lavori varianti: 19/12/2008
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 19/03/2010
Data collaudo tecnico-amministrativo: 11/11/2011
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite: 31
Importo totale riserve definite: 18.028.221,20

Totale riserve da definire: 6
Note: L'importo complessivo delle riserve definite di € 18.028.221,20 si riferisce alla somma degli importi riconosciuti all'appaltatore a seguito della conclusione di due componenti bonari ai sensi dell'art. 31 bis l. 109/94

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione: 144
Note: Trattasi di sospensione parziale

Varianti:

Numero totale: 4
Giorni proroga totali: 610
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 60.869.329,06
Importo oneri sicurezza: 3.182.067,06
Somme a disposizione: 17.678.203,21
Totale: 81.729.599,33
Note: Nell'ambito delle citate Perizie c'è stata una diminuzione delle Somme a Disposizione per € 6.588.479,97

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	2006
Previsione al 30/04/2005	2006
Previsione al 30/04/2007	2007
Previsione al 30/04/2009	2007
Previsione al 30/04/2010	2009
Previsione al 30/04/2011	2008

Cassia- 3° lotto - 3° stralcio: dal Km 11+250 al km 12+650

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 82.634.848,18
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 464.935,16
Nome aggiudicatario: BONIFICA SPA

Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 07/07/2000
Data fine: 04/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 900 giorni
Data bando: 23/01/2002
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 22/12/2003
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: VIANINI LAVORI SPA
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 26/02/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 79.494.790,23
Importo oneri per la sicurezza: 3.140.057,95
Importo complessivo a base di gara: 82.634.848,18
Importo aggiudicazione: 65.052.084,34
Somme a disposizione: 23.835.354,04
Totale: 88.887.438,38
% Ribasso di aggiudicazione: 22,12
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: Finanziamento con L. 295/98 Dec. 773 e 314 per € 40.885.829,23 e con Fondi ANAS per € 46.000.000,00

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 22/01/2004
Data presunta fine lavori: 10/07/2006
Stato avanzamento importo: 64.028.109,55
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 09/02/2004
Data effettiva fine lavori: 27/11/2008
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite: 284
Importo totale riserve definite: 109.054.427,49
Totale riserve da definire:

Note: Per la definizione delle citate n. 284 Riserve con Verbale di Accordo Bonario in data 18.02.2011 è stato riconosciuto all'Appaltatore un importo di € 19.835.431,62.

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	872
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	61.103.813,55
Importo oneri sicurezza:	5.953.718,09
Somme a disposizione:	21.811.006,60
Totale:	88.868.538,24
Note:	

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	2006
Previsione al 30/04/2005	2006
Previsione al 30/04/2007	2007
Previsione al 30/04/2009	2008
Previsione al 30/04/2010	2008
Previsione al 30/04/2011	2008

Cassia - 3° lotto – 3° stralcio (dal Km 11+250 al km 12+650)-Progetto di completamento

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Progetto prot. CRM-0026329-P del 11.10.2007 approvato con Disposizione della Direzione Generale CDG-0149592 del 11.12.2007.

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 34.797.064,00
Servizio: Interno
Costo progettazione interno:
Data inizio:
Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	400 giorni
Data bando:	21/12/2007
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ATI OBEROSLER CAV. PIETRO SPA - TRAVI SPA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	12/02/2009
Quadro economico:	
Importo a base gara:	32.643.645,29
Importo oneri per la sicurezza:	2.153.418,71
Importo complessivo a base di gara:	34.797.064,00
Importo aggiudicazione:	27.609.788,83
Somme a disposizione:	2.210.000,00
Totale:	29.819.788,83
% Ribasso di aggiudicazione:	22,02
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	27/11/2008
Data presunta fine lavori:	31/12/2009
Stato avanzamento importo:	34.049.598,20
Stato avanzamento percentuale:	91,34
Data effettiva inizio lavori:	27/11/2008
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	31/05/2010
Tempi realizzazione:	In ritardo - In data 17.06.2010 il Tribunale di Roma ha emesso un Decreto di Sequestro Preventivo delle aree oggetto dei Lavori. In data 31.01.2011 i lavori sono stati ripresi parzialmente.
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	17
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali: 150
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 34.370.228,08
Importo oneri sicurezza: 2.907.728,08
Somme a disposizione: 618.854,01
Totale: 37.896.810,17
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009 2009
Previsione al 30/04/2010 2010
Previsione al 30/04/2011 2011

Parco Vejo - 4° lotto: dal Km 12+650 al km 13+900

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 28.663.357,90
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 233.438,52
Nome aggiudicatario: GESIN S.r.l. - Studio di Ingegneria civile Proff. Ingg. Pietro Matildi e Giuseppe Matildi – Matildi Engineering S.r.l. - VIA Servizi di Francesco Nicchiarelli & C. S.n.c.
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 07/07/2000

Data fine: 04/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 900 giorni
Data bando: 23/01/2002
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 27/01/2003
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ATI:S.A.C.A.I.M. SPA - CASAL SPA
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 10/12/2003

Quadro economico:

Importo a base gara: 27.098.493,49
Importo oneri per la sicurezza: 1.564.864,40
Importo complessivo a base di gara: 28.663.357,90
Importo aggiudicazione: 22.717.943,01
Somme a disposizione: 9.216.106,39
Totale: 31.934.049,40
% Ribasso di aggiudicazione: 21,94
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 31/03/2003
Data presunta fine lavori: 15/09/2005
Stato avanzamento importo: 25.784.682,79
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 14/04/2003
Data effettiva fine lavori: 31/10/2007
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 24/01/2011
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite: 75
Importo totale riserve definite: 21.510.164,07
Totale riserve da definire: 26
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 4
Totale giorni sospensione: 229
Note:

Varianti:

Numero totale: 3
Giorni proroga totali: 547
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 25.311.414,14
Importo oneri sicurezza: 1.872.490,12
Somme a disposizione: 7.700.145,14
Totale: 34.884.049,40
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	2005
Previsione al 30/04/2005	2005
Previsione al 30/04/2007	2006
Previsione al 30/04/2009	2006
Previsione al 30/04/2010	2007
Previsione al 30/04/2011	2007

Sant'Andrea - 5° lotto: dal Km 13+900 al km 17+400

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE: No
Importo lavori: 51.552.223,83
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 318.504,47
Nome aggiudicatario: ATI VALLE PROGETTAZIONE - RPA SPA
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 07/07/2000
Data fine: 04/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	840 giorni
Data bando:	23/01/2002
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	10/12/2002
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	TECNIS SPA - SIPA SPA - Ing. Pavese - SIGENCO SPA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	24/11/2003
Quadro economico:	
Importo a base gara:	50.103.690,56
Importo oneri per la sicurezza:	1.448.533,27
Importo complessivo a base di gara:	51.552.223,83
Importo aggiudicazione:	42.364.209,06
Somme a disposizione:	16.751.480,83
Totale:	59.115.689,89
% Ribasso di aggiudicazione:	18,39
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	Finanziamento Legge obiettivo - delibera Cipe 107/02 per € 63,90 M€

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	31/03/2003
Data presunta fine lavori:	24/01/2006
Stato avanzamento importo:	49.481.667,07
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	14/04/2003
Data effettiva fine lavori:	19/05/2006
Data presunta fine lavori varianti:	19/05/2006
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	15/11/2010
Note:	Il Certificato del Collaudo Statico è stato emesso in data 04.02.2006

Contenzioso:

Totale riserve definite:	15
Importo totale riserve definite:	12.423.004,68
Totale riserve da definire:	
Note:	N. 13 riserve sono state definite con due componenti bonari art. 31/bis - Legge 109/94 per un importo complessivo di € 12.423.004,68. Per n. 2 riserve relative alla richiesta di compensazione reviosionale acciaio è in fase di redazione la relativa liquidazione.

Sospensione lavori:

Numero totale: 3
Totale giorni sospensione: 115
Note:

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali: 273
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 47.881.087,02
Importo oneri sicurezza: 1.600.585,64
Somme a disposizione: 14.442.339,18
Totale: 63.924.011,84
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	2005
Previsione al 30/04/2005	2005
Previsione al 30/04/2007	2006
Previsione al 30/04/2009	2006
Previsione al 30/04/2010	2006
Previsione al 30/04/2011	2006

Flaminia - 6° lotto - 1° stralcio: dal Km 17+400 al km 18+800

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 66.035.064,89
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 479.081,95
Nome aggiudicatario: TECNOPROJECT SRL - ERREGI SRL - ING. DOMINICHINI LORENZO
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 07/07/2000
Data fine: 04/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	1000 giorni
Data bando:	23/01/2002
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	08/01/2003
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	A.T.I. Giovanni e Micheli Strade per il Lazio S.r.L. - CONSCOOP
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	14/07/2004
Quadro economico:	
Importo a base gara:	62.297.231,03
Importo oneri per la sicurezza:	3.737.833,86
Importo complessivo a base di gara:	66.035.064,89
Importo aggiudicazione:	54.636.540,53
Somme a disposizione:	27.295.128,17
Totale:	81.931.668,70
% Ribasso di aggiudicazione:	18,30
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	04/03/2004
Data presunta fine lavori:	22/03/2007
Stato avanzamento importo:	73.457.233,71
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	19/03/2004
Data effettiva fine lavori:	15/09/2008
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	18/05/2011
Note:	Il Certificato Collaudo Statico è stato emesso in data 26.03.2008

Contenzioso:

Totale riserve definite:	10
Importo totale riserve definite:	10.025.669,25
Totale riserve da definire:	15
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	1
Totale giorni sospensione:	113
Note:	

Varianti:

Numero totale:	4
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	68.020.200,28
Importo oneri sicurezza:	5.473.605,92
Somme a disposizione:	23.682.677,43
Totale:	97.176.483,63
Note:	

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	2005
Previsione al 30/04/2007	2007
Previsione al 30/04/2009	2007
Previsione al 30/04/2010	2008
Previsione al 30/04/2011	2008
