


## HUB INTERPORTUALI

Hub interportuali di Nola, Battipaglia, Marcianise/Maddaloni

Interporto di Nola: adeguamento infrastrutturale del complesso interportuale di Nola - potenziamento delle infrastrutture esterne - Viabilità di accesso

### SCHEMA N. 136

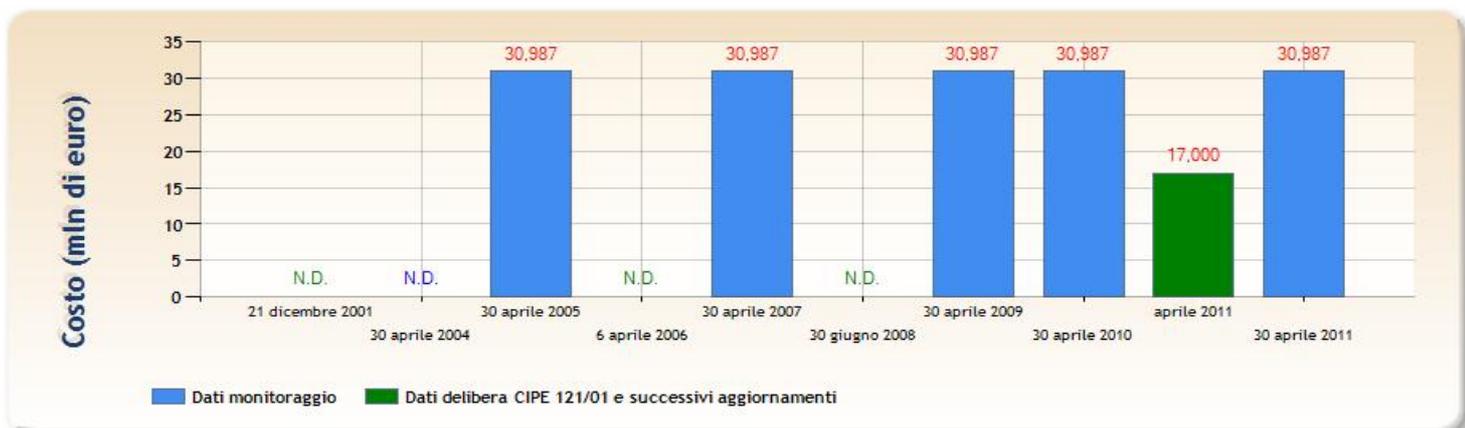

### LOCALIZZAZIONE



### CUP:

B51B03000180001

### TIPOLOGIA OPERA:

Interporti

### SOGGETTO TITOLARE:

Interporto Campano Spa

### STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

### DELIBERE CIPE

17/2005

### ULTIMAZIONE LAVORI

2011

---

## DESCRIZIONE

L'intervento riguarda le opere di adeguamento e potenziamento della viabilità di accesso al complesso Interporto – CIS di Nola che impegna gran parte dell'agglomerato industriale Nola-Marigliano, ricompreso nell'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Napoli e che è situato nelle immediate vicinanze dell'interconnessione tra l'A16 (Napoli – Bari) e l'A30 (Caserta – Salerno), uno dei principali nodi della rete stradale regionale. Il progetto è volto a migliorare gli accessi al complesso CIS-Interporto-Centro Servizi, dal lato Nord e dal lato Sud, e a regolamentare i flussi di traffico con la realizzazione di nuovi tronchi viari e di rotatorie di snodo, nonché ad adeguare le connessioni con la viabilità locale con la realizzazione di una variante planimetrica di un tratto della strada provinciale Boscofangone, di una bretella di collegamento fra la provinciale ed una delle rotatorie di ingresso e, infine, di alcune varianti di strade interpoderali.

---

## DATI STORICI

### 1984

Ai sensi della legge n. 80 la società Interporto Campano Spa è concessionaria della Regione Campania per la costruzione e gestione dell'interporto di Nola fino al 31 dicembre 2080. La concessione è stata disciplinata con la convenzione n. 27 Rep. stipulata il 25.5.1989.

### 1986

L'interporto è inserito nel Piano Generale dei Trasporti, approvato con DPCM del 10 aprile.

### 1990

La legge n. 240 classifica l'interporto di Nola tra quelli di 1° livello.

### 2001

L'IGQ Governo-Regione Campania del 18 dicembre individua l'interporto tra gli interventi prioritari.

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 nell'ambito degli hub portuali.

### 2002

La Giunta campana approva il "piano degli interventi del sistema" tra i quali è compreso il potenziamento dello svincolo di collegamento con l'asse di scorrimento a servizio delle aree ASI dell'interporto di Nola.

L'opera è inclusa nel "piano della variante al piano regolatore per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli-Agglomerato di Nola-Marigliano" adottato dal Consorzio ASI.

L'ANAS condivide il progetto preliminare ed formula una prescrizione di dettaglio, rinviando alla presentazione del progetto esecutivo la stipula della convenzione autorizzativa dei lavori previsti.

### 2003

L'Amministrazione Provinciale di Napoli esprime parere tecnico favorevole sul progetto preliminare.

La società Interporto Campano Spa trasmette il progetto preliminare corredato dal SIA alla Regione Campania.

La Commissione VIA, con decreto 10 dicembre, ritiene di escludere il progetto dalla procedura di VIA.

### 2004

Il Presidente della Regione Campania approva il progetto preliminare del "Potenziamento infrastrutture esterne. Viabilità di accesso".

Il Ministero per i beni culturali conferma che "le aree interessate dagli interventi non sono sottoposte a vincolo di interesse archeologico".

Il Presidente della Regione Campania viene individuato quale soggetto aggiudicatore.

La Regione Campania esprime parere favorevole per quanto attiene alla localizzazione urbanistica.

Il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria sull' "Interporto di Nola: Potenziamento delle infrastrutture esterne - Viabilità di accesso", proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare.

### 2005

Il CIPE, con delibera n. 17, approva con prescrizioni il progetto preliminare rinviando il finanziamento dell'opera del costo presunto pari a circa 31 Meuro all'approvazione del progetto definitivo.

Con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1118, viene approvato in linea tecnica il progetto definitivo. L'opera risulta così suddivisa: 1°lotto (1° e 2° stralcio) , 2° e 3° lotto.

#### **2006**

Nell'aprile 2006, nell'ambito delle procedure previste dall'art. 4 D. Lgs 190/02, si sono tenuti presso la sede del MIT a Roma, i lavori della Conferenza di Servizi relativi al progetto definitivo dell'intervento. La Conferenza si è chiusa dopo circa 45 giorni.

Con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1129 viene approvato il progetto esecutivo del "Potenziamento infrastrutture esterne - Viabilità di accesso. I Lotto I Stralcio" dell'Interporto di Nola, e il concessionario (Interporto di Nola Spa) è autorizzato ad eseguire i lavori previsti in progetto, che potranno avere inizio previa comunicazione al Concedente ed all'Amministrazione Comunale di Nola.

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Il 20 dicembre viene sottoscritto con il MIT un protocollo aggiuntivo dell'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la Viabilità, in cui l'opera è inserita.

#### **2007**

Il progetto del "Potenziamento della Viabilità esterna - Infrastrutture di accesso" è inserito nel protocollo aggiuntivo dell'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la Viabilità, sottoscritto con l'ANAS.

Interporto Campano Spa trasmette alla Regione il progetto esecutivo di Completamento del potenziamento infrastrutture esterne. Viabilità di accesso. II e III Lotto e richiede l'approvazione dello stesso e l'autorizzazione ad eseguire i lavori.

Con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1174., viene approvato il progetto esecutivo del II e III Lotto dell'Interporto di Nola per un importo di 14,3 Meuro e viene stabilito che, essendo stati i lavori del I° Lotto eseguiti in proprio dall'Interporto Campano Spa, in base a quanto previsto nell'art. 6 della convenzione rep 27, "il concessionario debba eseguire i lavori relativi al Completamento Potenziamento infrastrutture esterne. Viabilità di accesso. II e III lotto - che ammontano a circa il 46% dell'intero intervento di cui all'unico progetto definitivo generale - mediante gara comunitaria con soggetti terzi".

#### **2008**

Il 25 aprile Interporto Campano Spa pubblica il bando di gara per il II e III Lotto, per un importo complessivo dell'appalto di 11,1 Meuro, oltre IVA.

Il 1° agosto viene sottoscritto il 1° Atto Integrativo della Intesa Generale Quadro del 18 dicembre 2001 tra Governo e Regione Campania. Il documento riferisce che in Campania la fase attuativa degli interventi inseriti nell'Intesa Generale Quadro registra nel periodo 2002-2007 la realizzazione e la cantierazione di opere per complessivi 7.125,11 Meuro, dei quali 6.212,43 Meuro da fondi regionali di provenienza comunitaria e/o statale, 439,16 da fondi diversi e 481,14 (6,75% del totale) da fondi legge-obiettivo. Tra queste sono comprese le infrastrutture interportuali per un costo di 200,8 Meuro, finanziati per 69,9 da fondi regionali di provenienza comunitaria e statale, per 31,6 da fondi statali e da 99,3 in autofinanziamento dai gestori.

Interporto Campano Spa affida i lavori per la realizzazione del II e III lotto.

#### **2009**

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n.10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

#### **2010**

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera " Hub Interportuali Nola – Potenziamento infrastrutture esterne viabilità d'accesso" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

Per permettere la definizione di pratiche burocratiche da parte di alcuni proprietari delle aree interessate, il presidente della Giunta della Regione Campania, con ordinanza n. 1242 del 17.12.2010, su richiesta del Concessionario,

dispone la proroga al 20.12.2011 dei termini previsti per gli espropri nelle aree destinate alla realizzazione del progetto "Potenziamento infrastrutture esterne. Viabilità di accesso. I e II Lotto" dell'Interporto di Nola.

## 2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Hub Interportuali Nola – Potenziamento infrastrutture esterne viabilità d'accesso" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)" (stato attuativo in esercizio); "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risultano ultimati i lavori reattivi al 1° lotto, mentre l'ultimazione dei lotti 2 e 3 è prevista entro il 31 dicembre 2011.

---

## COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. <b>Fonte:</b>
Previsione di costo al 30 aprile 2005	30,987 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 17/2005
Costo al 6 aprile 2006	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	30,987 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 17/2005
Costo al 30 giugno 2008	N.D. <b>Fonte:</b> DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	30,987 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	30,987 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 10/2009
Costo ad aprile 2011	17,000 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	30,987 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 10/2009; Delibera CIPE 17/2005

---

## QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

### Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	16,630 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014

---

<b>Disponibilità al 30 aprile 2011:</b>	<b>30,987</b>
Regione Campania	30,987 <b>Fonte:</b> Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1174.

---

<b>Fabbisogno residuo:</b>	<b>0,000</b>
----------------------------	--------------

---

## NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Legge n. 80/1984 del 18 Aprile 1984

Piano Generale dei Trasporti del 10 Aprile 1986

Legge n. 240/1990 del 4 Agosto 1990

IGQ tra Governo e Regione Campania del 18 Dicembre 2001

Delibera CIPE 17/2005

del 18 Marzo 2005

Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1129

del 7 Gennaio 2006

Protocollo aggiuntivo dell'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la Viabilità del 20 Dicembre 2006  
Protocollo aggiuntivo dell'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la Viabilità del 27 Marzo 2007  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1174 del 25 Luglio 2007  
Bando di gara Interporto Campano Spa del Aprile 2008  
Aggiudicazione Interporto Campano Spa del Ottobre 2008  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1242 del 17 Dicembre 2010

## I lotto

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:**  
**Progettazione esecutiva**  
**CIPE:** No  
**Importo lavori:**

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Interporto Campano Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento diretto  
**Procedura:**  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:**  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:**  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:** 26967547CB  
**Data aggiudicazione:**  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** ATI PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - S.I.A.C.C. s.r.l. - COSTRADE S.p.A.  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 23/01/2006  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:** 12.376.239,44  
**Importo oneri per la sicurezza:** 317.339,47  
**Importo complessivo a base di gara:** 12.693.578,91  
**Importo aggiudicazione:** 11.424.271,79  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 11.424.271,79  
**% Ribasso di aggiudicazione:**  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	12.043.404,69
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	26/01/2006
Data effettiva fine lavori:	31/12/2010
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	Collaudo tecnico amministrativo in corso

## Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

## Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

## Varianti:

Numero totale:	
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	2008
Previsione al 30/04/2010	2008
Previsione al 30/04/2011	2010

## II e III lotto

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	No
Importo lavori:	

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Interporto Campano Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	12 mesi
Data bando:	11/04/2008
CIG/CUI:	01433632E3
Data aggiudicazione:	30/09/2008
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ATI COSTRUIRE S.p.A.(Mandataria) PA.CO Pacifico Costruzioni S.p.A- Impresa Carola S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	03516700634
Data contratto:	15/09/2009
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	10.733.985,83
Importo oneri per la sicurezza:	359.339,00
Importo complessivo a base di gara:	11.093.324,83
Importo aggiudicazione:	9.839.595,29
Somme a disposizione:	
Totale:	9.839.595,29
% Ribasso di aggiudicazione:	11,68
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

#### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	31/12/2011
Stato avanzamento importo:	6.304.323,37

**Stato avanzamento percentuale:** 64,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 24/09/2009  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:**  
**Tempi realizzazione:**  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**  
**Note:** Collaudo statico in corso

**Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

**Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

**Varianti:**

**Numero totale:**  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:**  
**Importo oneri sicurezza:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**Note:**

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

**Previsione al 30/04/2004**  
**Previsione al 30/04/2005**  
**Previsione al 30/04/2007**  
**Previsione al 30/04/2009** 2010  
**Previsione al 30/04/2010** 2010  
**Previsione al 30/04/2011** 2011
