


SCHEMI IDRICI

BAS - Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni

SCHEMA N. 161

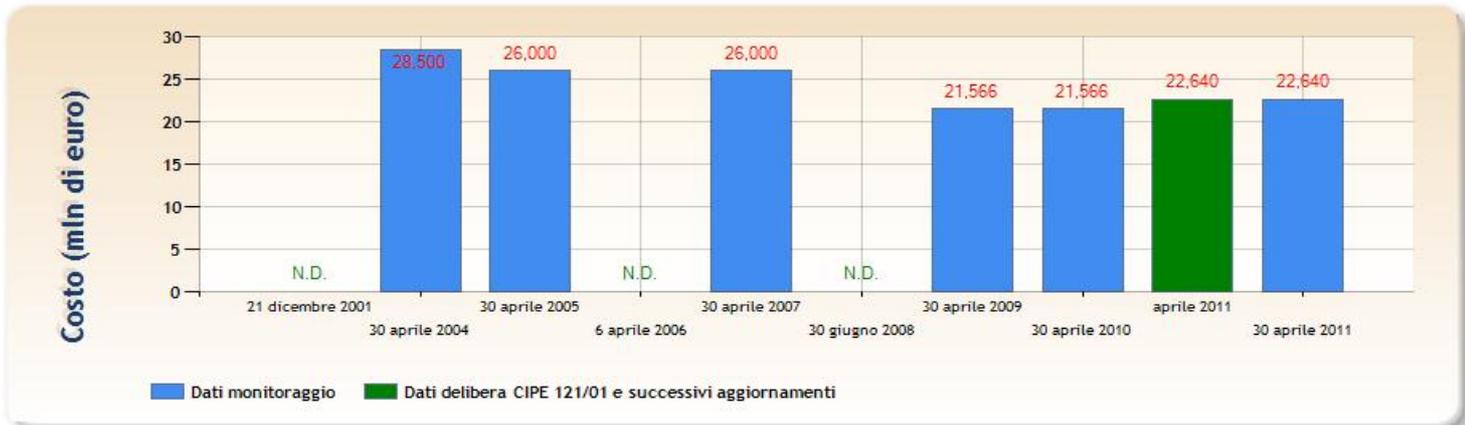

LOCALIZZAZIONE



CUP:

G87H04000020001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

52/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

DESCRIZIONE

Le "Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni" consistono in: 44 Km circa di condotte in acciaio di vari diametri; 6 serbatoi di accumulo per complessivi 8.000 mc; ripristino del serbatoio di Lauria; 2 impianti di sollevamento; 2 bottini; 3 attraversamenti: due del Sinni ed uno del fosso Monaco; 2 fiancheggiamenti su ponti stradali; una galleria di m 200; reti idriche di 6 paesi. L'acquedotto serve circa 50.000 abitanti residenti e 40.000 fluttuanti turistici.

DATI STORICI

2000

Tra il 2000 e il 2001 l'opera viene sottoposta alla valutazione del Dipartimento Ambiente e Territorio della regione Basilicata che esprime parere favorevole e rilascia i relativi nulla osta.

2001

L'intervento è compreso nella delibera n. 121 nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Basilicata.

2002

L'opera viene inclusa nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Basilicata sottoscritta il 20 dicembre. Il soggetto aggiudicatore è individuato nella Regione Basilicata.

2003

Il 17 luglio la Regione Basilicata esprime parere, con prescrizioni, in merito alla non assoggettabilità dell'intervento alla VIA.

La Regione Basilicata, con nota del 21 novembre, esprime parere favorevole, senza prescrizioni, conformemente ai nulla osta già rilasciati per le stesse opere.

Il MIT convoca la CdS che si conclude positivamente in data 24 novembre.

La Regione Basilicata, con nota del 2 dicembre, esprime parere di conformità in relazione alla localizzazione.

2004

Il RUP, in data 28 gennaio, dichiara concluso senza osservazioni ed opposizioni il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità.

Il MIT, con nota del 23 febbraio, trasmette la relazione istruttoria sulle "Opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni", proponendo l'approvazione del progetto definitivo con prescrizioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico della legge n. 166/2002, come rifinanziata dalla legge 350/2003. Il CIPE, nella delibera n. 52, prende atto delle risultanze dell'istruttoria e dei pareri espressi e approva, con prescrizioni, il progetto definitivo. Il costo complessivo dell'intervento è di 26 Meuro di cui 3,9 per IVA. Il contributo che viene assegnato, a valere sulla legge n. 166/2002, è a copertura totale del costo. L'anno di imputazione è il 2005 per 20 Meuro e il 2006 per i restanti 6.

L'Acquedotto Lucano Spa, in data 18 novembre, pubblica il bando di gara per l'affidamento dell'"Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni" per un importo complessivo di 15,1 Meuro.

2006

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

In data 20 luglio Acquedotto Lucano Spa aggiudica l'appalto all'ATI composta da Marottoli Costruzioni e Servizi Srl -

Ing. Ram Srl - Ro.Mal.Cos Spa.

Il rapporto "Infrastrutture Prioritarie" del MIT conferma il costo e il quadro finanziario e indica che, per la copertura del finanziamento, è stato contratto il mutuo con la Cassa Depositi e prestiti.

2009

L'opera compare nella delibera CIPE n.10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Adeguamento opere di captazione, riefficientamento ed opere connesse valli Noce e Sinni" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Adeguamento opere di captazione, riefficientamento ed opere connesse valli Noce e Sinni" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 49%).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta un avanzamento lavori del 75,73%. La conclusione è prevista per il 16 dicembre 2011.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	28,500 Fonte: IGQ tra Governo e Regione Basilicata
Previsione di costo al 30 aprile 2005	26,000 Fonte: Delibera CIPE 52/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	26,000 Fonte: Delibera CIPE 52/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	21,566 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	21,566 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	22,640 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	22,640 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	21,570 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	21,566
Fondi Legge Obiettivo	21,566 Fonte: Delibera CIPE 10/2009

Fabbisogno residuo:	1,074
----------------------------	--------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: I progettisti sono stati incaricati con Convenzione n. 23993 del 18/05/1991 dall'Acquedotto pugliese. Successivamente l'Autorità d'Ambito Ottimale della Basilicata ha assunto la titolarità del Progetto con convenzione del 24/04/2002 stipulata con l'EAAP, e i medesimi professionisti

Progettazione definitiva

CIPE: Sì
Importo lavori: 14.920.000,00
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: Arch. E. Masella, Ing. F. Di Giorgio
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 03/11/2002
Data fine: 05/05/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Acquedotto Lucano Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 10 mesi
Lavori: 269 giorni
Data bando: 10/08/2005
CIG/CUI: 1853583912
Data aggiudicazione: 20/07/2006
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Marottoli Costruzioni e Servizi - Ing. Ram. S.r.l. - RO.MAL.COS. S.p.A.,
Codice fiscale aggiudicatario: 01468210768
Data contratto: 22/11/2006

Quadro economico:

Importo a base gara: 14.920.000,00
Importo oneri per la sicurezza: 298.400,00
Importo complessivo a base di gara: 15.218.400,00
Importo aggiudicazione: 10.709.068,72
Somme a disposizione: 10.063.833,60
Totale: 20.772.902,32
% Ribasso di aggiudicazione: 30,33
% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

il progetto esecutivo redatto dall'impresa aggiudicataria, approvato dal CDA di Acquedotto Lucano S.p.A. nella seduta del 28.02.2008, ha rideterminando l'importo contrattuale e pertanto con il seguente quadro economico:

LAVORI +sicurezza+ progettazione esecutiva	€ 11.881.929,44;
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 9.684.070,56
TOTALE	€ 21.566.000,00

A seguito di ciò, è stato stipulato il relativo contratto aggiuntivo in data 10.06.2008, registrato a Potenza il 26.06.2008 al n° 2332 per l'importo aggiuntivo netto di € 1.172.860,72

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	16/12/2011
Stato avanzamento importo:	16.331.979,99
Stato avanzamento percentuale:	75,73
Data effettiva inizio lavori:	23/04/2008
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	16/12/2011
Tempi realizzazione:	In ritardo - Realizzazione di perizia di variante per interferenze intervenute con l'autostrada Salerno Reggio Calabria e tempi necessari per acquisizione pareri ed autorizzazioni

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
Note:	

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

IGQ tra Governo e Regione Basilicata del 20 Dicembre 2002

Determinazione dirigenziale Regione Basilicata n. 75F2003D797 del 17 Luglio 2003

Delibera CIPE 52/2004

del 29 Settembre 2004

Bando di gara Acquedotto Lucano Spa del Agosto 2005

Avviso di aggiudicazione Acquedotto Lucano Spa del Settembre 2006
