



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

Prot. N. 33.251 /FDA/DF/df



Roma 10/12/2018

Al Parlamento Italiano:

Presidenza della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
Piazza Montecitorio
00186 – R O M A

Presidenza del Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 – R O M A

AlP.A.N.A.C.
Via Marco Minghetti, 1
00187 – R O M A

Al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
Piazzale di Porta Pia, 1
00162 – R O M A

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Incentivi alle Imprese
S E D E

Oggetto: Commissario ad Acta ex L. 289 del 27.12.2002 art. 86 e L. 205 del 27.12.2017.

Rapporto n. 12 al 31.12.2018: Relazione sull'attività svolta, sull'entità delle attività in corso e da effettuare, sulla situazione economico-finanziaria generale e di dettaglio.

E, p.c.

Senato della Repubblica
8^ Commissione LL.PP., Comunicazione e
13^ Commissione Territorio e Ambiente
Piazza Madama
00186 – R O M A

Camera dei Deputati
8^ Commissione Ambiente, Territorio e LL.PP.
Palazzo Montecitorio
Piazza Montecitorio
001868 – R O M A

Al Ministro dello Sviluppo Economico
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
S E D E



La presente Relazione fa seguito al Rapporto semestrale n. 11 al 30.9.18 di cui alla Commissariale n. 32.340 del 4.10 u.s.

Come chiaramente segnalato in detto Rapporto, occorre fare riferimento allo stesso per avere un quadro più completo dell'intera attività di competenza di questo Ufficio e del suo progredire.

Con la presente Relazione si intende infatti solo integrare gli elementi già forniti, aggiornandoli in relazione al periodo 1.10.18 – 31.12.18, pur riportandoli ovviamente in schede, tabelle e sintesi complessive per un confronto più agevole.

Purtroppo l'affiancamento da parte del/dei Soggetti subentranti più volte sollecitato da questo Ufficio per consentire un produttivo e completo passaggio di consegne non è intervenuto, con la conseguenza certa di perdita di conoscenze e di riferimenti che non possono essere proficuamente tradotti in relazioni ed informative non seguite dall'azione diretta sul campo.

Ma soprattutto a tutt'oggi non risultano individuati i Soggetti destinatari delle variegate competenze Commissariali, non essendo possibile, a giudizio di chi scrive, conferire le diverse materie ad una unica Amministrazione.

D'altra parte in precedenti Relazioni si è data ragione della nomina di un Commissario, basata tra le altre motivazioni sulla volontà di riunire compiti diversi pur se tutti (o quasi) concernenti la materia specifica dei LL.PP., ma soprattutto sulla opportunità di unificare responsabilità di diversa natura e di diversa portata¹.

In precedenza si è anche rappresentata la logica su cui è stata fondata l'organizzazione di questa Struttura, costituita da pochi elementi dipendenti dal MiSE supportata da funzionari dei Provveditorati competenti per territorio, avvalsi ai sensi di legge.

Incarichi esterni sono stati affidati solo per attività specialistiche o indiscutibilmente non rintracciabili negli organismi ministeriali.

Tale scelta preferenziale, se si è dimostrata vincente con riferimento al supporto diretto del sottoscritto (personale, si ripete, del MiSE) ed al personale di alcune sedi Provveditoriali, non sempre è risultata del tutto positiva con quella di Napoli, per ragioni diverse rilevabili comunque dagli atti e dalla corrispondenza.

Circa il personale MiSE (sette elementi part-time più uno solo a tempo pieno) il sottoscritto ritiene di poter vantare il merito di aver portato alla luce potenzialità non del tutto emerse precedentemente in funzionari che oggi possono tranquillamente confrontarsi con professionalità esterne spesso specialistiche ed affrontare il libero mercato senza incertezza alcuna.

Tale patrimonio andrà certamente disperso con la cessazione di questo Ufficio ove non si trovino soluzioni alternative adeguate.

Al di là di numeri e di dati, sembra importante sottolineare gli aspetti umani e professionali, l'impegno, la correttezza, la disponibilità, la capacità, lo spirito di sacrificio, la disciplina di alcuni funzionari pubblici (come quelli citati e di cui si riportano in allegato nominativi e compiti principali) per i quali il sottoscritto ha più volte sollecitato un mai pervenuto encomio da parte della Superiorità, ma di cui va preso atto anche con la presente Relazione.

¹ Si consideri che al Commissario oltre alle incombenze di natura tecnica, amministrativa ed economica ed al completamento funzionale della Viabilità Lioni - Grottaferrata è stata data immediatamente la titolarità e la responsabilità personale su opere pubbliche rimaste incompiute ex art. 32 L. 219/81, oggetto di utilizzazione impropria, di discariche di rifiuti tossici, di danneggiamenti e furti, di occupazione abusiva.



L'affezione indiscutibile da parte dei territori interessati²⁾ per questo Ufficio discende infatti solo dalla presenza, dalla tempestività d'azione, dalla competenza e dalla cortesia nei rapporti – anche i più difficili – sempre mantenuti con gli interlocutori di diritto da detto personale, al quale, si ripete, va pertanto riconosciuto ogni relativo merito.

Delle essenziali difficoltà operative nella gestione dell'attività intervenuta dall'anno 2012 per una sconsiderata limitazione della reale possibilità di funzionamento dell'Ufficio mediante riduzione delle risorse annue da 300.000 € a 100.000 €³⁾ con perdita gravissima ad esempio della consulenza giuridica diretta, si è detto inutilmente in ogni occasione, fin dall'anno 2013.

Si ribadisce quindi quanto più volte rappresentato, e cioè che contro l'Ufficio sostanzialmente non sono stati attivati contenziosi, che le riserve iscritte dalle Imprese (a parte il caso della Viabilità Lioni – Grottaminarda, tuttora presso l'ADS di Napoli)⁴⁾ sono minime, che nessuna somma è stata pagata per interessi per ritardato pagamento, che con numerose transazioni sono stati risparmiati milioni di Euro (vedi allegati), che nessun incidente si è verificato sui lavori, che nessun rilievo è stato mosso dalla Corte dei Conti, che nessuna risorsa in più è stata richiesta rispetto alle disponibilità trasferite ovvero alle previsioni progettuali, che tutte le opere realizzate sono state consegnate o sono in fase di consegna ai gestori finali ecc. ecc.

Chiunque muova critiche all'attività dell'Ufficio dovrebbe essere chiamato almeno ad un contraddittorio.

Chi invece avesse obiezioni di principio sulla opportunità dell'esistenza di un commissariato dovrebbe quanto meno produrre alternative concrete (che esistano) e non inconsistenti quali la proposta di trasferimento delle competenze al Prefetto (confondendo l'emergenza nei terremoti con la ricostruzione), per tacere di altre ancor più fantasiose.

Altra riflessione importante va fatta in relazione alla successione di proroghe dell'Ufficio, che oltre a non consentire programmi di ampio respiro comporta un superlavoro di fine anno inconciliabile con le esigenze operative di regime.

Peraltro tali proroghe non discendono da ritardi o inadempienze Commissariali, come ampiamente dimostrabile, ma evidentemente dalla difficoltà di spacchettare competenze ed attività complesse per riaffidarle in maniera costruttiva e funzionale a Soggetti istituzionali diversi.

Si rammenta che i progetti ex art. 32 L. 219/81 sono oltre 70 e che la Lioni – Grottaminarda è una strada nuova non ancora del tutto finanziata.

Negli allegati sono fornite tutte le notizie fondamentali utili.

Le documentazioni sono conservate con cura e con criteri di facile reperibilità.

Tuttavia il mancato affiancamento comporterà, una volta individuati i Soggetti trasferitari, operazioni non immediate di separazione della corrispondenza (oltre 33000 unità) e dei decreti Commissariali (oltre 2000).

² A titolo esemplificativo si allegano Delibera di Giunta del Comune di S. Angelo dei Lombardi (AV) per tutte le analoghe Delibere Comunali Campane, ed istanza del Comune di Pescopagano (PZ) sottoscritta da tutti i Comuni Lucani aventi causa.

³ a) Si rammenta che l'Ufficio dell'appannaggio di € 300.000 giusta Finanziaria 2003, restituiva ogni anno circa 100.000€ (per un totale di oltre un milione).

b) Si rammenta che i 100.000€ devono ora provenire da apodittiche economie operate dal sottoscritto sui lavori.

c) Si rammenta che l'Ufficio è autonomo nella propria gestione cui dovrebbe provvedere in tutto e per tutto (con meno di 1€ ogni 5000€ gestiti).

⁴ Per tale intervento sussistono riserve milionarie che tuttavia con transazione in corso verrebbero totalmente rinunciate a fronte di una proroga (dovuta).



Pur se segnalati, per alcuni aspetti ed impegni dovrà pertanto essere presa immediata conoscenza da parte dei subentranti, una volta individuati, ad evitare scadenze, ritardi in pagamenti, inadempimenti vari ecc.

Nell'ambito della presente premessa generale vengono quindi opportunamente segnalate alcune criticità e raccomandazioni nei confronti del/dei Soggetti subentranti e per le quali si rimanda agli specifici allegati, ribadendo in questa sede solo l'annosa esiguità delle risorse per funzionamento dell'attuale Ufficio e la mancanza di un indispensabile supporto giuridico (e fiscale) diretto, circostanze e scelte del tutto miopi ed ingiustificabili, che comportano il serio rischio di disfunzioni cui si fa fronte solo con faticosi approfondimenti ed esperienza nel settore.

D'altra parte la stessa mancata individuazione a tutt'oggi del/dei Soggetto/i subentranti non potrà che creare disfunzioni e ritardi che nel campo dei LL.PP., come noto a chiunque in tale campo operi, non sono generalmente privi di conseguenze programmatiche ed economiche.

Di particolare importanza ed urgenza sono l'attribuzione della firma sulla contabilità speciale di competenza Commissariale, la conservazione dell'esenzione IVA e delle agevolazioni ex L. 219/81, la redazione entro il 31.3.19 della Relazione alla Corte dei Conti sull'esercizio finanziario 2018.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Filippo D'Ambrosio)

Allegati:

- 1) Elenco nominativi Struttura Commissariale
- 2) Istanze dei Comuni
- 3) Quadro generale progetti
- 4) C.S. 3250: situazione annuale entrate – uscite – rientri
- 5) “ “ : tabella versamenti
- 6) Relazione Contabilità ordinaria 2244
- 7) Convenzioni con Provveditorati OO.PP.
 - a. N. 1 Potenza
 - b. N. 2 Napoli
- 8) Convenzione con Regione Campania
- 9) Allegati A: Lavori ex comma 1 – Viabilità Lioni – Grottaminarda
- 10) Allegati B: Lavori ex commi 1 e 2 (art. 32 L. 219/81)



ELENCO NOMINATIVI STRUTTURA COMMISSARIALE

Sede di Roma: Sig.ra Donatella Frascchetti

Sede di Salerno: Ing. Paolo Turi
Sig. Andrea Attianese
Sig. Francesco Amendola
Geom. Clemente Galdi
Rag. Angela Gambardella
Dr.ssa Loredana Ranallo
Sig. Giovanni Sica



COMUNE DI PESCOPAGANO

Provincia di Potenza
Medaglia d'oro al merito civile

Ufficio del Sindaco


Piazza della Vittoria - C.A.P. 85020 - C.F./P.I. 00222420762 - Tel. 0976/500201 - Fax 0976/5636

Sito Istituzionale: www.pescopagano.gov.it

E-mail: comunepescopagano@rete.basilicata.it



Prot. n. 7470 del 13 /12/2018



Al Presidente della Camera dei Deputati
camera_protcentrale@certcamera.it

Al Presidente del Senato
amministrazione@pec.senato.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

Al Ministero Infrastrutture e Trasporti
Ufficio Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Ministero Infrastrutture e Trasporti
Sottosegretario Dott. Armando Siri
segreteriaass.siri@mit.gov.it

Al Ministero Sviluppo Economico-DGIAI
segretariogenerale@pec.mise.gov.it

Al Ministero Sviluppo Economico
Capo Gabinetto del Ministro
Avv. Vito Cozzoli
segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

Al Presidente della Regione Basilicata
presidenza giunta@cert.regione.basilicata.it

e p.c Al Commissario ad Acta Ing. D'Ambrosio
commissarioadacta@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Proroga Commissario ad Acta - Ing. Filippo D'Ambrosio.

I sindaci dei comuni di Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Rapone e Baragiano (Provincia di Potenza), premesso che con l'art. 86 della Legge 289/02 (Finanziaria 2003) veniva istituita la figura del Commissario ad Acta per il completamento di tutti i lavori nel settore LLPP, disciplinati nell'ambito dell'art. 32 della Legge 219/81, rimasti abbandonati e delle procedure connesse alla chiusura delle concessioni, con la definizione espropriativa, amministrativa, contabile e la consegna all'Ente gestore delle

opere collaudate di ogni progetto non ancora concluso sotto tali aspetti e che il comma 1 del medesimo articolo dava al Commissario anche il compito di acquisire risorse per il completamento di schemi viari regionali prioritari;

Considerato che tale Legge non prevedeva alcun onere per lo Stato per il completamento dei progetti in essere, oltre alle disponibilità residue risalenti all'anno 1997 per i medesimi fini;

Visto che con D.M. del 21/02/2003 veniva nominato commissario ad Acta l'ing. Filippo D'Ambrosia e con D.M. 21/12/2005 veniva completata la definizione delle competenze per la riconosciuta alta professionalità nella materia del medesimo;

Evidenziato, in particolare, che i compiti del Commissario consistevano nel completamento di opere previste dall'art. 32 della Legge 219/81 rimaste incompiute ovvero di progetti e programmi rimasti non definiti sotto aspetti tecnici, contrattuali, contabili;

Constatato che le opere pubbliche che interessano, in particolare, i comuni di Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Rapone, Baragiano, comprese le attività di recupero costruttivo, adeguamento normativo procedono, grazie all'attività dell'Ufficio Commissariale, verso il sostanziale completamento;

Visto, invece, che la chiusura dei progetti di completamento infrastrutturale, compresa la parte amministrativa (collaudi, consegne, espropri) non è ancora completata data, soprattutto, la varietà e la complessità della materia espropriativa, in considerazione dell'enorme quantità di particelle interessate dai lavori, la problematica dei subli demaniali che risulta di particolare importanza e sulla quale l'Ufficio Commissariale ha predisposto soluzioni anche tramite la collaborazione degli uffici demaniali con cui sono in corso contatti per la definizione di importanti rapporti istituzionali;

Considerato che è stata fissata la scadenza dell'Ufficio Commissariale alla data del 31/12/2018;

Ritenuto che la mancata proroga dell'ufficio commissariale, composta da funzionari pubblici di grandi qualità professionali ed umane, coglie di sorpresa e preoccupa tutte le Amministrazioni locali e l'intero territorio che si ritiene privato di una attività trasparente e concreta, che ha portato indubbi benefici al sistema socio economico regionale e prodotto risultati indiscutibili che resteranno tangibili nel tempo.

Ritenuto che ogni soluzione di continuità nell'attività in corso produrrebbe danni gravissimi e vanificherebbe l'azione dell'ufficio commissariale che ha invece riparato tante ferite del terremoto rimaste aperte per decenni.

Visto il verbale della riunione dei Sindaci dell'Area del Marmo Platano e dell'Assessore alle Infrastrutture e mobilità della regione Basilicata tentasi in data 27/11/2018 dove si sottolinea la necessità della continuità dell'Ufficio Commissariale per la definizione delle opere complementari della strada Nerico-Baragiano;

Apprezzata la competenza, correttezza e scrupolosità con cui sono state condotte le complesse attività dall'Ufficio Commissariale con il proficuo coinvolgimento delle Comunità interessate .


CHIEDONO

un intervento urgente e responsabile ai massimi livelli di proroga dell'Ufficio Commissariale nella persona dell'ing. Filippo D'Ambrosio affinché possa essere assicurato il completamento definitivo dei lavori e delle procedure connesse evitando una ulteriore offesa ad un territorio onesto ed operoso che finora ha subito in silenzio.


Il Sindaco del Comune di Pescopagano



Il Sindaco del Comune di Castelgrande




Il Sindaco del Comune di Muro Lucano



Il Sindaco del Comune di Rapone



Il Sindaco del Comune di Baragiano.





**COMUNE DI
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
(PROVINCIA DI AVELLINO)**

COPIA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 123 Del 22-11-2018**

Oggetto: ODG - LIONI - GROTAMINARDA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 09:30, nella sala delle adunanze della sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MARANDINO MARCO	SINDACO	P
GARGANO VINCENZO	VICE SINDACO	P
BRACCIA VALERIA	ASSESSORE	P
ANTONIELLO GIANLUCA PASQUALINO	ASSESSORE	P
PETITO ANTONIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor **MARANDINO MARCO** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO** Signor **MORANO DONATO**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato ed invita a deliberare.

La Giunta a voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare in ogni sua parte l'unità proposta di cui all'oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare ai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione amministrativo-contabile.

Con successiva e separata unanime votazione, all'unanimità, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 289/02 (Finanziaria 2003) art. 86 che istituiva la figura di un Commissario ad Acta per il completamento di tutti i lavori nel settore LL.PP. disciplinati nell'ambito dell'art. 32 della L. 219/81, rimasti in abbandono alla data e delle procedure connesse con la chiusura delle concessioni con la definizione espropriativa, amministrativa, contabile e la consegna all'Ente gestore delle opere collaudate, di ogni progetto non ancora concluso sotto tali aspetti, e che al c.1 del medesimo art. 86 dava al Commissario anche il compito di acquisire risorse per il completamento di schemi viari regionali prioritari;

CONSIDERATO che tale legge non prevedeva alcun onere per lo Stato per il completamento dei progetti in essere alla data oltre alle disponibilità residue risalenti all'anno 1997 per i medesimi fini, e consentiva la ricerca, la individuazione, la progettazione, la realizzazione previa comunicazione al CIPE dell'onere economico e della fonte finanziaria per la realizzazione della S. S. V. LIONI-GROTTAMINARDA;

VISTO che con D.M. 21.2.2003 veniva nominato Commissario ad Acta l'ing. Filippo D'Ambrosio e completata la definizione delle competenze con D.M. 21.12.2005 per la riconosciuta alta professionalità e competenza nella materia;

CONSIDERATO che a seguito di Conferenze dei Servizi con il coinvolgimento di tutto il territorio avente causa, Tavoli Tecnici, pareri, autorizzazioni, controlli (Consiglio Superiore LL.PP., VIA, Amministrazioni ed Enti competenti, UVER ecc.), veniva individuata opera prioritaria in Campania la tratta Lioni (S. Angelo) - Grottaminarda in prosecuzione della viabilità Contursi - Lioni già realizzata ex art. 32 L. 219/81 ed in esercizio da ANAS;

CONSIDERATO che tale completamento funzionale di schema individuato sin dagli anni '60 (Progetto Speciale 21 della Cassa per il Mezzogiorno) mai finanziato in precedenza comportava (da progetto esecutivo approvato dal Commissario nell'anno 2010) un corso di € 430 milioni, finanziato pro quota da Stato (€ 150 milioni) e da Regione Campania (€ 280 milioni) giusta Intesa Stato-Regione dell'8.8.2008;

CONSIDERATO che per legge (v. art. 86 c.1 L. 289/02) il progetto suddetto sarebbe dovuto comunque essere affidato e gestito in concessione di committenza sulla base della normativa ex L. 219/81;

CONSIDERATO che sono risultati affidatari dei lavori in conformità di detto art. 86 c.1 L. 289/02 i Consorzi INFR.AV. ed INFRASUD;

CONSIDERATO che all'attualità con Del. CIPE 62/11 e 27/12 sono stati stanziati rispettivamente € 220 milioni su fondi FSC gestiti dalla Regione Campania ed € 70 milioni su fondi MIT per i lavori di completamento funzionale in questione Lioni (S. Angelo) - Grottaminarda;

CONSIDERATO che attualmente, in base ai relativi finanziamenti, sono in corso i lavori di 1° lotto 1° stralcio funzionale da Frigento a Villamaina (su fondi MIT per € 70 milioni) ed i lavori

di 1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo (su fondi Regionali per € 60 milioni) il cui completamento è previsto per la fine del 2018;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 446 del 2.8.16 sono stati finanziati ulteriori € 101 milioni circa per la realizzazione di un terzo stralcio il cui completamento è previsto per il 2020;

CONSIDERATO che la viabilità in argomento rappresenta una storica esigenza per l'economia del territorio interessato e per le valenze economiche, sociali e di sicurezza stradale;

CONSIDERATO che con L. 97/12 è stata fissata la scadenza dell'Ufficio Commissariale;

CONSIDERATO che una soluzione di continuità nella gestione di complesse attività coinvolgenti tutti gli aspetti operativi connessi con la progettazione le procedure espropriative e l'esecuzione dei LL.PP. determinerebbe ritardi e disfunzioni, e che l'attuale gestione, sia in relazione alle attività concluse che a quelle in atto, risulta condotta nel rispetto di tutti i principi di trasparenza, di efficienza e di collaborazione istituzionale;

CONSIDERATO che la cessazione dell'ufficio commissariale potrebbe determinare oltre a inauspicabili soluzioni di continuità nell'azione, interferenze, gravi disfunzioni e seri danni anche in termini economici;

CONSIDERATO che tali rischi appaiono comunque certezze ove venisse mantenuta la cessazione del Commissario al 31.12.2018 non risultando nemmeno individuati i vari enti subentranti nelle variegate competenze;

CONSIDERATO per quanto detto che l'incarico commissariale è strettamente legato alla specificità della materia oltre che al completamento di attività comportanti altrimenti competenze di più soggetti pubblici con la dispersione delle responsabilità e la perdita dell'unità di azione;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI FARE VOTI di prorogare per la durata dei lavori l'Ufficio Commissariale unitamente al Commissario Ing. Filippo D'Ambrosio, stante la verificata competenza, correttezza e scrupolosità con cui sono stata condotte le complesse attività che hanno visto il proficuo coinvolgimento delle Comunità interessate con la conseguente concreta cantierizzazione di una infrastruttura lungamente attesa e decisiva per il rilancio delle aree interne della Campania altrimenti destinate alla emarginazione ed al sottosviluppo.

Il Presidente
F.to MARANDINO MARCO

Il Segretario Comunale
F.to MORANO DONATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

- ☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000)
- ☐ Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 22-11-018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- ☐ Che é stata trasmessa in elenco ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 D.Lgs. n. 267/2000 con lettera prot. n. 8875 del 22-11-2018

Sant'Angelo dei Lombardi, li 22-11-2018

F.to Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sant'Angelo dei Lombardi, li _____

Il Responsabile del Servizio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 289/02 (Finanziaria 2003) art. 86 che istituiva la figura di un Commissario ad Acta per il completamento di tutti i lavori nel settore LL.PP. disciplinati nell'ambito dell'art. 32 della L. 219/81, rimasti in abbandono alla data e delle procedure connesse con la chiusura delle concessioni con la definizione espropriativa, amministrativa, contabile e la consegna all'Ente gestore delle opere collaudate, di ogni progetto non ancora concluso sotto tali aspetti, e che al c.1 del medesimo art. 86 dava al Commissario anche il compito di acquisire risorse per il completamento di schemi viari regionali prioritari;

CONSIDERATO che tale legge non prevedeva alcun onere per lo Stato per il completamento dei progetti in essere alla data oltre alle disponibilità residue risalenti all'anno 1997 per i medesimi fini, e consentiva la ricerca, la individuazione, la progettazione, la realizzazione previa comunicazione al CIPE dell'onere economico e della fonte finanziaria per la realizzazione della S. S. V. LIONI-GROTTAMINARDA;

VISTO che con D.M. 21.2.2003 veniva nominato Commissario ad Acta l'ing. Filippo D'Ambrosio e completata la definizione delle competenze con D.M. 21.12.2005 per la riconosciuta alta professionalità e competenza nella materia;

CONSIDERATO che a seguito di Conferenze dei Servizi con il coinvolgimento di tutto il territorio avente causa, Tavoli Tecnici, pareri, n. o., autorizzazioni, controlli (Consiglio Superiore LL.PP., VIA, Amministrazioni ed Enti competenti, UVER ecc.), veniva individuata opera prioritaria in Campania la tratta Lioni (S. Angelo) - Grottaminarda in prosecuzione della viabilità Contursi - Lioni già realizzata ex art. 32 L. 219/81 ed in esercizio da ANAS;

CONSIDERATO che tale completamento funzionale di schema individuato sin dagli anni '60 (Progetto Speciale 21 della Cassa per il Mezzogiorno) mai finanziato in precedenza comportava (da progetto esecutivo approvato dal Commissario nell'anno 2010) un corso di € 430 milioni, finanziato pro quota da Stato (€ 150 milioni) e da Regione Campania (€ 280 milioni) giusta Intesa Stato-Regione dell'8.8.2008;

CONSIDERATO che per legge (v. art. 86 c.1 L. 289/02) il progetto suddetto sarebbe dovuto comunque essere affidato e gestito in concessione di committenza sulla base della normativa ex L. 219/81;

CONSIIDRATO che sono risultati affidatari dei lavori in conformità di detto art. 86 c.1 L. 289/02 i Consorzi INFR.AV. ed INFRASUD;

CONSIDERATO che all'attualità con Del. CIPE 62/11 e 27/12 sono stati stanziati rispettivamente € 220 milioni su fondi FSC gestiti dalla Regione Campania ed € 70 milioni su fondi MIT per i lavori di completamento funzionale in questione Lioni (S. Angelo) - Grottaminarda;

CONSIDERATO che attualmente, in base ai relativi finanziamenti, sono in corso i lavori di 1° lotto 1° stralcio funzionale da Frigento a Villamaina (su fondi MIT per € 70 milioni) ed i lavori di 1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo (su fondi Regionali per € 60 milioni) il cui completamento è previsto per la fine del 2018;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 446 del 2.8.16 sono stati finanziati ulteriori € 101 milioni circa per la realizzazione di un terzo stralcio il cui completamento è previsto per il 2020;

CONSIDERATO che la viabilità in argomento rappresenta una storica esigenza per l'economia del territorio interessato e per le valenze economiche, sociali e di sicurezza stradale;

CONSIDERATO che con L. 97/12 è stata fissata la scadenza dell'Ufficio Commissariale;

CONSIDERATO che una soluzione di continuità nella gestione di complesse attività coinvolgenti tutti gli aspetti operativi connessi con la progettazione le procedure espropriative e l'esecuzione dei LL.PP. determinerebbe ritardi e disfunzioni, e che l'attuale gestione, sia in relazione alle attività concluse che a quelle in atto, risulta condotta nel rispetto di tutti i principi di trasparenza, di efficienza e di collaborazione istituzionale;

CONSIDERATO che la cessazione dell'ufficio commissariale potrebbe determinare oltre a inauspicabili soluzioni di continuità nell'azione, interferenze, gravi disfunzioni e seri danni anche in termini economici;

CONSIDERATO che tali rischi appaiono comunque certezze ove venisse mantenuta la cessazione del Commissario al 31.12.2018 non risultando nemmeno individuati i vari enti subentranti nelle variegate competenze;

CONSIDERATO per quanto detto che l'incarico commissariale è strettamente legato alla specificità della materia oltre che al completamento di attività comportanti altrimenti competenze di

più soggetti pubblici con la dispersione delle responsabilità e la perdita dell'unità di azione;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI FARE VOTI di prorogare per la durata dei lavori l'Ufficio Commissariale unitamente al Commissario Ing. Filippo D'Ambrosio, stante la verificata competenza, correttezza e scrupolosità con cui sono stata condotte le complesse attività che hanno visto il proficuo coinvolgimento delle Comunità interessate con la conseguente concreta cantierizzazione di una infrastruttura lungamente attesa e decisiva per il rilancio delle aree interne della Campania altrimenti destinate alla emarginazione ed al sottosviluppo.

Suddivisione in lotti	Prog. Allegato B	Prog. Allegato A	num. progetto			PROV	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria				Chiusura concessione		
									Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 86	Importi di suddivisione in lotti	Importo versato sulla cs 3250	Erogazioni			
1		1	39	60	6001	PZ	Infrastrutture N.I. Balvano e Acquedotto	Consorzio per il Nucleo di Baltano			190.768,06	0,00	X	542	16/06/2009
2		2	39	60	6002	PZ	N.I. Baragiano	MALTAURO			5.437,31	0,00	X	1448	09/11/2015
3		3	39	40	6003	SA	Infrastrutture N.I. Buccino	Consorzio Infrastrutture Buccino S. Gregorio Magno		15.239.426,48	5.039.835,62 87.150,56 10.112.340,30	1.342.387,06	X	1635	11/05/2016
4		4	39	40	6003/2	SA	Approvvigionamento Idrico A.I. Buccino - Pozzi Buccino	Consorzio Infrastrutture Buccino S. Gregorio Magno			2.023.199,06	2.311.378,22	X	1000	22/12/2011
5		5	39	40	6004	AV	Infrastrutture N.I. Calabria	COINSUD			5.479,92		X	547	30/08/2009
6		6	39	40	6005	AV	Infrastrutture N.I. CALAGGIO	INCOMIR			0,00		X	1454	18/11/2015
7	1		39	40	6006	AV	Infrastrutture N.I. Calitri	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione			3.710.587,83	1.648.911,02			Revocato
8		7	39	40	6007	SA	N.I. Contursi	COINFRA			192.873,31	87.458,01			
9		8	39	40	6008	AV	Infrastr. Nucleo Conza della Campania	GI.IT.			3.549,53		X	833	19/01/2010
10		9	39	60	6009	PZ	N.I. ISCA PANTANELLE	PIZZAROTTI			0,00		X	324	20/12/2006
11		10	39	40	6010	AV	Infr. N.I. Lioni - Nusco - S. Angelo	INFR.AV.			38.008,86		X	307	01/12/2006
12		11	39	40	6011	AV	Infrastr. N.I. Motra de Sanctis	GI.IT.			99.952,44		X	833	19/01/2010
13	2		39	40	6012	AV	Infrastrutture N.I. di Nerico	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione			1.138.355,19	67.485,12	X		Revocato
14		12	39	40	6013	SA	Infrastrutture N.I. di Oliveto Citra	COINSUD			0,00		X	481	29/10/2008
15		13	39	40	6014	SA	Infrastr. N.I. PALOMONTE bretella di collegamento	COIMPA			0,00		X	377	18/09/2007
16		14	39	40	6015	AV	Infrastrutture N.I. di Porrara	INFRASUD			17.132,50		X	635	27/12/2010
17		15	39	40	6016	AV	Infrastrutture N.I. S. MANGO sul CALORE	INCOMIR			0,00				
18		16	39	60	6017	PZ	Infr. N.I. S. Nicola di Melfi + F.Z.	PIZZAROTTI			44.894,07		X	817	07/02/2011
19		17	39	60	6018	PZ	Infrastrutture N.I. di Tito	MELANDRO - VIGGIANO			0,00		X	1482	18/12/2015
20		18	39	60	6019	PZ	Infrastrutture N.I. Valle Vialba	PIZZAROTTI			20.141,82		X	1326	22/12/2014
21		19	39	60	6020	PZ	Infrastrutture N.I. di Viggiano	MELANDRO - VIGGIANO			0,00				Concessionario decaduto - D.M. 233 del 3.11.1985

M. 21.12.2005) + nuova opera "Viabilità Lioni - Grottaminarda"

Chiusura progetto			Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Concluso - Aperto		Attività residue (e Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto	
							Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna		
X	580	07/10/2009	199.769,06	C	1			Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99		
X	1457	30/11/2015	5.437,31	C	1			Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 + 102/01		
X	1543	09/06/2016	764.698,52	C	1		strada di accesso al serbatoio idrico	Comune di Buccino	Consegna provvisoria con verbale in data 19/03/1997		1
							Infrastrutture A.I.	Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99		
							Campo Pozzi	Regione Campania	Consegna definitiva in data 12/07/08 con approvazione collaudo finale-Approvato con Decreto Commissariale n.254 del 12/07/06		
							Condotta adduttrice, serbatoio, Condotta a gravità	Regione Campania	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n. 1357 del 20.4.2015 - GURI n.176 del 31.7.2015		
X	1503	13/04/2012	91.654,65	C	1		Completamento approvvigionamento idrico+tratto condotta a gravità	Regione Campania	Consegna definitiva in data 08/01/10 con approvazione collaudo finale-Approvato con Decreto Commissariale n.632 dell'8/1/2010		
X	583	09/10/2009	5.479,92	C	1			Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
X	1461	15/12/2015	0,00	C	1			Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
				A	1	In corso completamento espropri		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99	31	2
				A	1	Contenzioso per esproprio (Ditta Di Menza)		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99		
X	638	16/02/2010	3.649,53	C	1		(progetto unificato al 6011)	Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
	(unico decreto)		0,00	C	1			Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99		
X	479	16/10/2008	38.008,86	C	1			Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
X	639	16/02/2010	99.952,44	C	1		(progetto unificato al 6008)	Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
				A	1	In corso completamento espropri		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99	2	1
X	D.M. 38 del 7.4.2003		0,00	C	1			Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99		
X	D.M. 20 del 24.2.2004		0,00	C	1		Infrastrutture N.I. di Palomonte	Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99		
							Bretella di collegamento A.I. Palomonte e svincolo Scigliano degli Alburni	Provincia di Salerno	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.3 del 16/9/03 - Guri n.229 dell'1/10/03		
							Svincolo sul raccordo autostradale di Scigliano-Potenza e impianto illuminazione	ANAS	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.5 del 3/11/03 - GURI n.289 del 19/11/03		
X	640	18/02/2010	17.132,50	C	1			Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
				A	1	In corso completamento espropri	Infrastrutture N.I. S. Mango sul Calore	Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
							Strada di collegamento tra la SP 39 e la strada di accesso tra l'area PIP e l'A.I. di S.Mango sul Calore (loc. Piani)	Comune di S. Mango sul Calore (AV)	Consegna definitiva con verbale 5/8/09 approvato con Decreto Commissariale n.568 del 08/09/09 - GURI n.230 del 3/10/09		
X	842	28/02/2011	44.994,07	C	1			Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99		
X	1496	19/01/2016		C	1			Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99		
X	1332	26/01/2015	20.141,82	C	1			Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 - Decreto Commissariale n. 589 del 16.10.2009 (Integraz.)		
X	1463	18/12/2015	0,00	C	1			Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 - Decreto Commissariale n. 589 del 16.10.2009 (Integraz.)		

Ufficio del Commissario ad Acta/DF/AG - Pag. 2 di 5

Chiusura progetto			Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Concluso - Aperto		Attività residua (e Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto		
							Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	Per espropri	Altra natura	
X	657	28/04/2010	32.078,41	C		1			Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
X	1078	04/07/2012	55.073,96	C		1			ANAS	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.43 dell'11/3/04 - GURI n.77 dell'1/4/04		
X	1172	18/08/2013	473.847,37	C		1			Provincia di Salerno	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.1 dell'1/8/03 - GURI n. 211 dell'11/9/03		
				A		1						
X	(unico decreto)		1.546.751,82	C		1		Strada Fondo Valle Sele II' Lotto	ANAS	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.45 del 14.5.04 - G.U.R.I. n.126 del 31/5/04		1
								Controstrade a valenza comunale	Comune di Calabritto	Consegna definitiva il 4/12/01		
				A		1	Contenzioso con Comune di Caposele (AV)	Strada 'Fondo Valle Sele III' Lotto + svincolo Materdomini	ANAS	Consegna definitiva con verbale 24/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.157 del 03/02/06 - GURI n.46 del 24/02/06		3
			Viabilità connessa all'asse principale					Comune di Teora	Consegna definitiva con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.158 del 07/02/06 - GURI n.60 del 13/03/06			
			Viabilità connessa all'asse principale					Comune di Caposele	Consegna definitiva con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.159 del 07/02/06 - GURI n.60 del 13/03/06			
			Viabilità connessa all'asse principale					Comune di Lioni	Consegna definitiva con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.160 del 07/02/06 - GURI n.60 del 13/03/06			
			Viabilità connessa all'asse principale					Comune di Calabritto	Consegna definitiva con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.161 del 07/02/06 - GURI n.60 del 13/03/06			
			Viabilità ampliamento della ex S.S. 165					Regione Campania	Consegna definitiva con verbale del 12/09/06 approvato con Decreto Commissariale n.267 del 15/09/06 - GURI n.243 del 18/10/06			
X	839	25/02/2011	514.618,79	C		1			Provincia di Potenza	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.13 del 2/12/03 - GURI n.296 del 22/12/03		
X	1047	21/03/2012	25.073,54	C		1						1
				A		1	Attività varie amministrative	Tratta da progr. 0+00 a progr. 1+750	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1276 del 16.7.14	60	
			Tratta da progr. 1+750 a progr. 5+800					Provincia di Avellino	Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1276 del 16.7.14			
			Rotatoria per Pescopagano					ANAS	Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1276 del 16.7.14			
			Bretella per Pescopagano					Comune di Pescopagano	Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1276 del 16.7.14			
				A		1	*	Tratta da progr. 5+800 Svincolo Pescopagano a progr. 9+450 Svincolo Rapone	Comune di Muro Lucano e Comune di Castelgrande	Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1784 del 4.12.17	309	
				A		1	*	Impianto di illuminazione in galleria artificiale alla progr. km. 9+100 circa	Comune di Muro Lucano e Comune di Castelgrande	Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1807 del 15.12.18	87	1
				A		1	Lavori in corso					
				A		1	Lavori in corso					
								Bretella N.I. Lioni Porrara (Nusco S. Angelo)	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.33 del 29/12/03 - GURI n.17 del 22/1/04		

	Suddivisione in lotti	Prog. Allegato B	Prog. Allegato A	num. progetto			PROV	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria				Chiusura concessione		
										Costo totale progetti revocati ex art. 89	Importi di suddivisione in lotti	Importo versato sulla cs 3250	Erogazioni			
26			26	39	40	6058	AV	Bretella N.I. Lioni Portara (Nusco - S. Angelo)	INFRAUD			1.349.855,01		X	1500	28/02/2010
36			27	39	60	6059	PZ	Melfi - Area Industriale	PIZZAROTTI			1.197.829,85		X	859	28/04/2010
37			28	39	60	6062	PZ	Viabilità Muro Lucano - Baragiano Scalo	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione	Versamento iniziale 5.269.928,00 + 8.793,79 residuo professionisti	5.267.107,00	5.278.721,79	4.482.152,32	Revocata		
38	6			39	60	6062/2	PZ				472.951,98		368.634,34			
														Revocata		
39			29	39	40	6063	AV	Calitri Ofantina	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione	Versamento iniziale 2.571.728,59 + 52.557,65 professionisti	2.861.984,38	2.824.286,24	1.093.164,40	Revocata		
40			30	39	40	6084	AV	Calitri Ofantina (svincolo)	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione	Versamento iniziale 792.471,33 + 50.000,00 residuo professionisti	1.336.634,70	752.471,33	956.715,11	Revocata		
														Revocata		
41			31	39	40	6086	AV	Strada Ofantina S. Menga	INCOMIR			287.449,90		X	808	10/01/2011

Chiusura progetto			Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Concluso - Aperto		Attività residue (e Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto		
							Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	Per espropri	Altra natura	
X	1087	03/09/2012	1.349.056,01	C		1	Svincolo per S. Angelo del Lombardi	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con verbale del 15/12/03 approvato con Decreto Commissariale n.32 del 18/12/03 - GURI n.8 del 9/1/04			
							Area in località "Salvalico" (part. lle 579/a - 41/a-42/a-684)	Comune di S.Angelo del Lombardi	Consegna definitiva con verbale del 12/1/04 approvato con Decreto Commissariale n.39 del 14/1/04 - GURI n.18 del 23/1/04			
X	677	13/07/2010	377.390,17	C		1	Strada N.I. Melfi - Abitato Melfi - Superstrada Candela/Potenza	Provincia di Potenza	Consegna definitiva il 15/11/2000			
							Controstrade a valenza comunale	Comune di Melfi	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.40 del 20/1/04 - GURI n.28 del 4/2/04			
							Viabilità secondarie Cavalavia in loc. Ponte Giacola	Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collaudo Decreto Commissariale n. 895 del 6.6.2011	72	1	
							Viabilità secondaria	Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con verbale in data 20.7.2009 approvato con Decreto Commissariale n. 564 del 4.8.2009 - GURI n. 201 del 31.8.2009			
X	1048	22/03/2012	8.793,79	C		1	Opere completamento strada Basigliano-Muro Lucano e Opere ampliamento bretella provvisoria di svincolo su SS 7 Appia	Provincia di Potenza e Comune di Muro Lucano	Consegna provvisoria con verbale in data 20.7.2009 approvato con Decreto Commissariale n. 562 del 4.8.2009			
							Rotatoria di Innesito al Km. 420+800 sulla SS. 7	ANAS	Consegna definitiva con approvazione collaudo Decreto Commissariale n. 893 del 18.7.2011			
							Viabilità secondarie relative alla Rotatoria d'Innesito al Km. 420+800 sulla SS. 7	Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collaudo Decreto Commissariale n. 893 del 18.7.2011			
X	2011	03/12/2016	104.317,65	C		1	Attività varie amministrative	Collegamento viario tra la strada Muro Lucano-Baragliano e la S.S. 94/Dir.	ANAS	Consegna definitiva con approvazione collaudo Decreto Commissariale n. 1016 del 23.1.2012		
X	1412	27/07/2015		C		1	Strada Calitri-Ofantina	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con approvazione collaudi Decreti Commissariati n. 638 del 18.10.2011 e n. 1077 del 2.7.2012	78	1	
							Viabilità secondaria	Comune di Calitri	Consegna definitiva con verbale in data 25.9.2010 approvato con Decreto Commissariale n. 728 del 13.9.2010 - GURI n. 233 del 5.10.2010			
X	1051	03/04/2012	24.432,65	C		1	Svincolo strada collegamento abitato di Calitri con la SS. 401 Ofantina - Asse principale	ANAS	Consegna definitiva con approvazione collaudi Decreti Commissariati n. 823 del 2.9.2011 - GURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 1059 del 14.5.2012	9	1	
							Rampe di accesso opere relative allo svincolo	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con approvazione collaudi Decreti Commissariati n. 823 del 2.9.2011 - GURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 1059 del 14.5.2012			
							Viabilità secondaria	Comune di Calitri	Consegna definitiva con approvazione collaudi Decreti Commissariati n. 823 del 2.9.2011 - GURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 1059 del 14.5.2012			
							Viabilità della bretella di collegamento tra lo svincolo per Calitri e l'Area Industriale di Nerio	Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n. 1258 del 15.1.2014 - GURI n. 181 del 6.8.2014			
							Strada Ofantina S. Mango	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.49 del 15/7/04 - GURI n.186 del 10/9/04		1	
							Sovrappassi progr. 2181 - 2552 - 512 + sottopassi e viabilità secondaria	Comune di San Mango sul Calore	Consegna definitiva con verbale del 9/2/05 approvato con Decreto Commissariale n.89 del 15/2/05 - GURI n.62 del 4/3/05			
X	824	11/02/2011	48.396,22	C		1	Sovrappassi progr. 3830 e 4148	Comune di Castelvetere sul Calore	Consegna definitiva con verbale del 15/02/05 approvato con Decreto Commissariale n.87 del 8/4/05 - GURI n.108 del 09/05/05			
							Viabilità secondaria progr. 0,00 + 113,40	Comune di Chiusano San Domenico	Consegna definitiva con verbale del 7/2/05 approvato con Decreto Commissariale n.89 del 15/2/05 - GURI n.51 del 3/3/05			

Suddivisione in lotti	Prog. Allegate B	Prog. Allegate A	num. progetto			PROV	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria				Chiusura concessione		
									Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 86	Importi di suddivisione in lotti	Importo versato sulla cs 3250	Erogazioni			
42		32	39	60	6067	PZ	Valle di Vitalba - Ofantina	PIZZAROTTI			2.790.718,05		X	880	24/05/2011
43		33	39	40	6068	SA	F.V.S. - Oliveto Citra	COINFRA			480.247,22				
44		34	39	60	6069	PZ	Rapone - Ofantina - Muro Lucano	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione			4.959.481,14				Revocato
45		35	39	60	6070	PZ	Rapone - Ofantina - Vitalba	PIZZAROTTI			56.550,12		X	1333	26/01/2015
46		36	39	40	6071	AV	Svincolo ferroviario S. Mango sul Calore	INCOMIR			101.011,85				
47		37	39	40	6075	SA	F.V.S. Ospedale Oliveto Citra	COINFRA			1.132.241,72				
48		38	39	60	6076	PZ	Balvano Basentana Baragiano	MALTAURO			583.587,86		X	652	31/03/2010
49		39	39	60	6076/2	PZ	Balvano Basentana Baragiano II lotto (L. 266/06)	MALTAURO			25.914,78		X	1353	13/03/2015
50		40	39	60	6077	PZ	Isca - Polla	PIZZAROTTI			1.035.047,59		X	648	22/03/2010
51	5		39	60	6077/2	PZ	Isca-Polla II lotto	PIZZAROTTI			5.951.922,02				
52		41	39	40	6080	SA	Svincolo ferroviario N.I. di Buccino	Consorzio Infrastrutture Buccino S. Gregorio Magno			636.401,58		x	1771	24/11/2017
53		42	39	40	6091	AV	Acq. principale Alta Irpinia	SNAM PROGETTI			1.916.417,63		X	681	10/05/2010
54		43	39	40	6094	SA	Acq. Area Industriale di Buccino	COINSUD			460.488,56		X	491	01/12/2008
55		44	39	40	6095	AV	Acq. Irpinia II Vallata/Montelesone	SNAM PROGETTI			208.589,07		X	655	28/04/2010
56		45	39	40	6096	SA	Condotta Reflui Palomonte - Buccino	SNAM PROGETTI			0,00				Decreto Ministeriale
57		46	39	40	6097	SA	Condotta Reflui Calabritto Battipaglia	SNAM PROGETTI			0,00				Decreto Ministeriale
58		47	39	60	6101	SA	Impianto depurazione N.I. Balvano	Consorzio per il Nucleo di Balvano			2.042,61		X	552	10/07/2009
59		48	39	40	6102	AV	Impianto depurazione N.I. Calabritto	COINSUD			0,00		X	541	15/06/2009
60		49	39	40	6103	SA	Impianto depurazione N.I. Contursi	COINFRA			0,00				Delibera ex Agensud n. 2350 del 17.3.1993
61		50	39	40	6104	AV	Impianto depurazione N.I. Conza	GI.IT.			6.832,39				
62		51	39	40	6105	AV	Impianto depurazione N.I. Lioni (FI)	SNAM PROGETTI			7.101,32		X	809	10/01/2012
63		52	39	40	6106	AV	Impianto depurazione N.I. Morra	GI.IT.			8.664,38		X	1117	14/11/2012
64		53	39	40	6107	SA	Impianto depurazione N.I. Palomonte	COIMPA			0,00		X	378	18/08/2007
65		54	39	40	6108	AV	Impianto depurazione N.I. Portofino	INFRAUD			12.130,35		X	631	08/01/2010

Chiusura progetto			Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Concluso - Aperto		Attività residue (e Lavori in Corso)	Consegna opera			N. Transazioni sul progetto	
							Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna		
							Sovrappassi alla progr. 3830,31 e 512 + Bratella A.I. S. Mango sul Calore	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con verbale del 9/4/05 approvato con Decreto Commissariale n.69 dell'11/4/05 - GURI n.107 del 10/05/05		
							Strada di collegamento tra la S.P. 39 e l'A.I. di S. Mango sul Calore	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con verbale del 16/10/08 approvato con Decreto Commissariale n.600 del 30/10/08 - GURI n.282 del 31/12/09		
X	896	19/07/2011	713.360,99	C		1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.44 del 16/4/04 - GURI n.101 del 30/4/04		
				A		1	Contenzioso COINFRA	Comune di Oliveto Citra (SA)	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.2 dell'1/8/03 - GURI n.215 del 18/9/03		
				A		1	In corso completamento espropri	Provincia di Potenza	Consegna definitiva l'11/10/99	53	1
X	1349	20/02/2015	50.550,12	C		1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva l'11.10.99		
				A		1	In corso ultimazione espropri	Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con DM 157 del 2/7/99		
				A		1	Contenzioso COINFRA - Saldo a debito del Concessionario non corrisposto	Comune di Oliveto Citra (SA)	Consegna definitiva il 27/9/00		
X	658	28/04/2010	583.567,86	C		1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva il 24/1/96		
X	1385	04/05/2015	25.914,78	C		1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.46 del 24/5/04 - GURI n.148 del 28/6/04		
X	654	12/04/2010	965.479,89	C		1	Strada Isca - Pola tratto Km.0+000 / Km.1+500	Provincia Potenza	Consegna definitiva con verbale del 13/8/04 approvato con Decreto Commissariale n.59 del 27/9/04 - GURI n. 236 del 9/10/04		
							Tratto Km.1+500 / Km.5+715	Provincia Potenza	Consegna definitiva con verbale del 27/9/04 approvato con Decreto Commissariale n. 62 del 15/10/04 - GURI n.259 del 4/11/04		
							Tratto Km.5+715 / Km.6+199,50	Provincia Salerno	Consegna definitiva con verbale del 20/9/04 approvato con Decreto Commissariale n. 63 del 15/10/04 - GURI n.259 del 4/11/04		
							Controstrade a valenza comunale	Comune S. Angelo Le Fratte (PZ)	Consegna definitiva con verbale del 23/3/05 approvato con Decreto Commissariale n. 84 del 31/3/05 - GURI n.90 del 19/4/05		
				A		1	Saldo lavori sospeso per inadempienze contributive	Provincia di Salerno Comune di Caggiano	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.348 del 16/04/07 - GURI n.117 del 22/5/07		
x	1809	19/12/2017	634.476,27	C		1	Pagamento saldo lavori sospeso per inadempienza contributiva	Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99		
X	1075	21/08/2012	1.869.817,53	C		1		Regione Basilicata Regione Puglia Regione Campania	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.041 del 20/2/04 - GURI n.54 del 5.3.04		
X	500	14/01/2009	460.468,56	C		1		Consorzio Acquedotto Valle del Sele	Consegna definitiva il 29/10/97		
X	685	31/05/2010	208.588,07	C		1		Regione Campania Regione Puglia	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.042 del 20/2/04 - GURI n.54 del 5.3.04		
e n. 36 del 7.4.2003			0,00	C		1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva il 24/1/01		1
e n. 40 del 7.4.2003			0,00	C		1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva il 24/1/01		1
X	581	07/10/2009	2.042,61	C		1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99		
X	553	10/07/2009	0,00	C		1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
Decreto Ministeriale n. 39 del 7.4.2003			0,00	C		1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99		
				A		1	In corso verifica trasferimento suoli	Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
X	840	25/02/2011	7.101,32	C		1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. n.157 del 2/7/99 - Integrazione D.M. n.157 a cura MAP (part. Catastali)		
X	1128	31/12/2012	6.684,38	C		1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
Decreto Ministeriale n. 31 del 20.3.2003			0,00	C		1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99		
X	637	16/02/2010	12.130,35	C		1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		

Suddivisione in lotti	Prog. Allegato B	Prog. Allegato A	num. progetto			PROV	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria				Chiusura concessione		
									Costo totale progetti revocati ex c. 2 art. 86	Importi di suddivisione in lotti	Importo versato sulla c.s. 3250	Erogazioni			
66		56	39	60	6109	PZ	Impianto depurazione N.I. Viggiano	MELANDRO - VIGGIANO			64.468,79		X	Concessionario decaduto - D.M. 233 del 3.11.1995	
67		56	39	69	6150		Opere di elettrificazione	ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI			97.260,85		X	308	01/12/2006
68		57	39	98	6151		Eliminazione interferenze	ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI			1.320.541,08		X	309	01/12/2006
69		58	39	60	6202	PZ	INVASO PIGNOLA	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA			0,00		X	679	13/07/2010
70		59	39	40	6203	SA	Condotta forzata Battipaglia	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO			66.154,59		X	361	09/05/2007
71		60	39	40	6205	SA	Adeguamento depuratore di Battipaglia	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO			0,00		X	340	26/03/2007
72		61	39	40	6207	SA	Collet. Refil acque alte SELE/TUSC.	CONSORZIO DESTRA SELE			761,97		X	341	26/03/2007
73		62	39	40	6208	SA	By pass Ponte Canale	EAAP-ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE			12.453,85		X	664	28/05/2010
74		63	39	60	6209	PZ	Lavori Idrici Melfi	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA			0,00		X	817	07/02/2011
75	7	1° lotto	39	40	310001	AV	Viabilità Lioni - Grottaminarda 1° lotto 1° stralcio	Concessionario INFR.AV.		Regione Campania	45.043.599,00				
76			39	40	410001	AV	Viabilità Lioni - Grottaminarda 1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo			Ministero Infrastrutture	65.079.858,00				
77			39	40	510001	AV	Viabilità Lioni - Grottaminarda 1° lotto 3° stralcio								
78	8	2° lotto	39	40	320001	AV	Viabilità Lioni - Grottaminarda 2° lotto 1° stralcio	Concessionario INFRAUD							
TOT	8	6	63				TOTALI		70.448.229,37	44.298.051,97	219.311.897,29	57.801.100,18	Totale I		
							Sommano:		arrotondamento effettuato dal MAP sull'importo totale versato progetti revocati		76,02				
									Recuperi effettuati dall'Ufficio Commissariale per totali		24.092,71				
							TOTALE COMPLESSIVO				219.336.066,02				
											MISE	109.212.609,02			
											MIT e Regione	110.123.457,00			

Chiusura progetto			Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Concluso - Aperto			Consegna opere			N. Transazioni sul progetto	
							Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	Per espropri	Altra natura
X	1458	07/12/2015	84.488,79	C		1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 27/99		
X	374	18/09/2007	97.280,85	C		1					
X	375	18/09/2007	1.320.541,88	C		1					
X	(unico decreto)		0,00	C		1		Consorzio ASI di Potenza	Opera già trasferita all'attuale gestore (v. comunicazione commissariale n.870 del 27/2/04)		
X	(unico decreto)		66.154,59	C		1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. n.26 del 15/2/2000		
X	(unico decreto)		0,00	C		1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. n.107 del 27/6/95		1
X	(unico decreto)		761,97	C		1		Consorzio Desira Sele	Consegna D. Comitato Gestione "Agenzia" n.880 del 19/12/92		
X	(unico decreto)		12.453,85	C		1		Ente Acquedotto Pugliese	Opera già trasferita all'attuale gestore (v. comunicazione commissariale n.866 del 26/2/04)		
X	680	13/07/2010	0,00	C		1		Consorzio ASI di Potenza	Opera già trasferita all'attuale gestore (v. comunicazione commissariale n.871 del 27/2/04)		
				A			Lavori in corso				
					1		Lavori in corso				
				A		1					
Economie			12.962.053,52							701	18


Percentuali di completamento delle attività	57		
	75,06	%	
	19		
	25,04	%	

COMMISSARIO AD ACTA LEGGE 289/02 ART. 86

CONTABILITA' SPECIALE N. 3250 - VERSAMENTI E SPESE DAL 2004 AL 31.3.2018

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
giacenza ad inizio anno	44.125.693,80	43.652.172,50	43.652.172,50	86.849.980,13	80.374.319,79	74.763.190,66	83.035.204,86	77.512.028,17	72.264.095,83	84.267.322,33	75.886.017,65	70.863.665,57	59.767.321,32	55.482.270,94	64.083.306,07	TOTALE FINANZIAMENTI
entrate	44.298.128,00	0,00	47.264.861,82	662.469,86	1.000.000,00	13.153.866,14	12.566,87	620.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.548.000,00	31.337.080,00	50.576.293,41	219.473.266,10
uscite	172.434,20	473.521,30	4.067.054,19	7.167.514,02	6.641.550,47	4.901.145,57	5.535.743,56	5.890.030,96	3.009.602,59	8.388.181,77	5.022.352,08	11.096.344,25	19.841.125,95	22.758.134,50	36.721.172,74	141.685.908,15
rientri di somme a vario titolo	0,00	0,00	0,00	29.383,82	30.421,34	19.293,63	0,00	22.098,62	12.829,09	6.877,09	0,00	0,00	8.075,57	22.089,63	14.291,12	165.359,91
Saldo disponibile a fine anno	44.125.693,80	43.652.172,50	86.849.980,13	80.374.319,79	74.763.190,66	83.035.204,86	77.512.028,17	72.264.095,83	84.267.322,33	75.886.017,65	70.863.665,57	59.767.321,32	55.482.270,94	64.083.306,07	77.938.426,74	TOTALE DISPONIBILE al 28/12/18 (fonte GEOCOS)

Quadro entrate - uscite - rientri

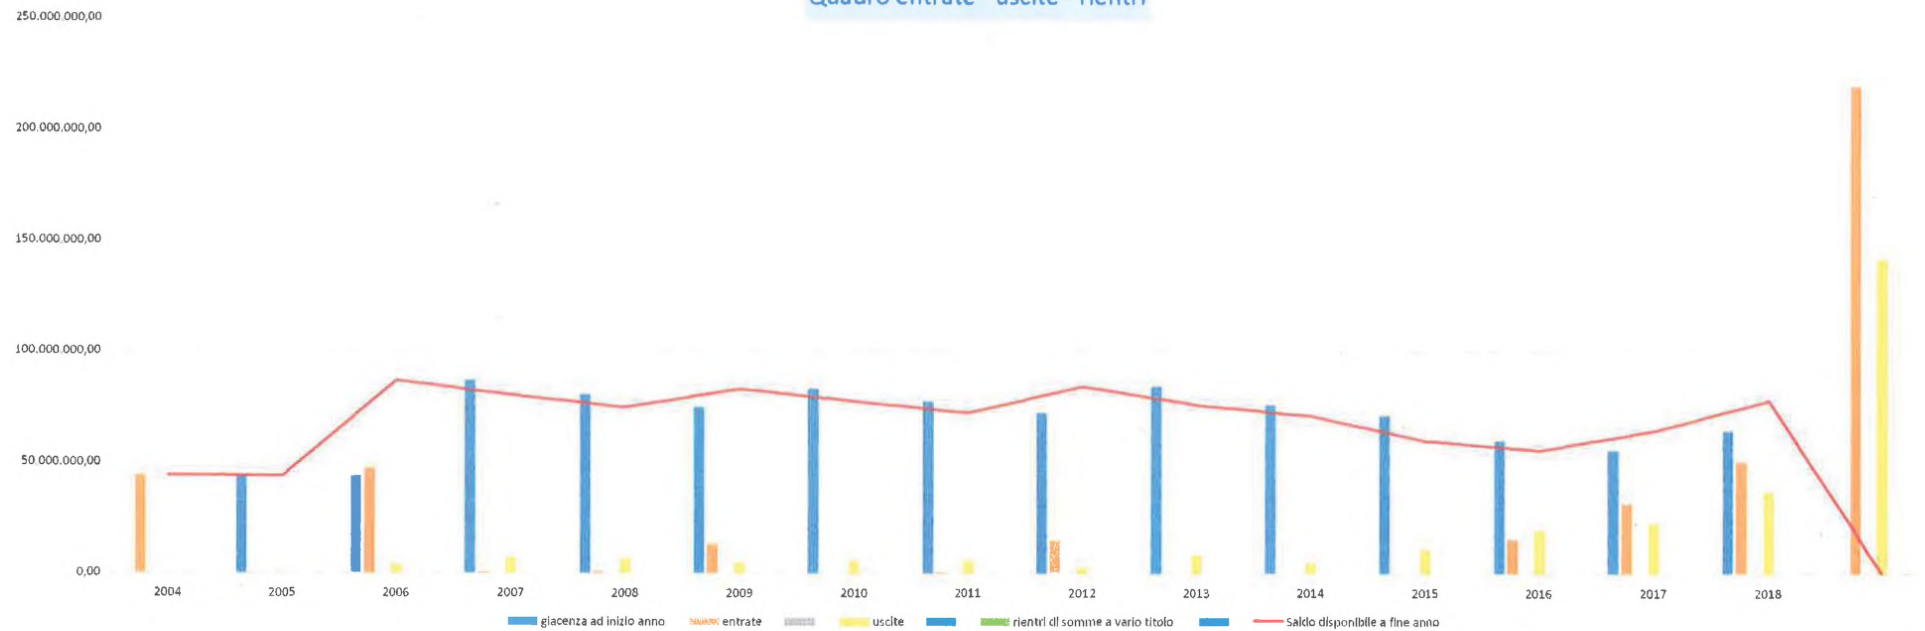

COMMISSARIO AD ACTA - LEGGE N. 289/02 ART. 86
Versamenti contabilita' speciale n. 3250

SEZIONE	348
CONTO	3250
DATA_DA	17/03/2004
DATA_A	31/12/2018

DATA MOVIMENTO	CAUSALE	VERSANTE	IMPORTO	MISE	REGIONE	MIT	ALTRE	RIENTRI
17/03/2004	Versamento iniziale per lavori revocati ex comma 2 art. 86	MiSE	44.298.128,00	44.298.128,00				
13/03/2006	Versamento ex D.M. 21.12.2005	MiSE	7.698.577,67	7.698.577,67				
14/07/2006	Versamento ex D.M. 21.12.2005	MiSE	10.084.365,75	10.084.365,75				
11/12/2006	Versamento ex D.M. 21.12.2005	MiSE	8.148.834,58	8.148.834,58				
27/12/2006	Versamento ex D.M. 21.12.2005	MiSE	21.330.121,28	21.330.121,28				
27/07/2007	O.P. PER PROGETTAZIONE A FAV. : CMM. AD ACTA EX ART. 86 L. 289/02	REGIONE CAMPANIA	250.000,00		250.000,00			
02/11/2007	Restituzione somma rinnovo parti impianti in Campo Pozzi A.I. Buccino	Soc. ICAB	19.946,42					19.946,42
21/12/2007	Versamento ex D.M. 21.12.2005	MiSE	25.073,54	25.073,54				
24/12/2007	Versamento ex D.M. 21.12.2005	MiSE	267.449,90	267.449,90				
28/02/2008	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SU S.A.L. N. 4	IMPRESA EDILE CALABRIA PASQUALE SRL VIA V.ZO VALINATI LATORRACA, 6 85047MOLITERNO	20.000,00					20.000,00
20/10/2008	O.P. 120538 A FAV. : CMM. AD ACTA EX ART. 86 L. 289/02	REGIONE CAMPANIA	1.000.000,00		1.000.000,00			
06/05/2009	SENT. 3575/2007 DEL 06.10.2007 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI CAUSA 558/05 R.G. - CAUSA DI SALVO TERESA +2 - PROG. 39/40/6006 PAGAMENTO SPESEPROCESSUALI VALORI PRODOTTI IN VERSAMENTO IL 05.05.2006	ICLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)	11.525,84				11.525,84	
15/12/2009	VERSAMENTO BONIFICO 8800803541001010 DEL 15/12/2009 PER SETTECO.PP.-REVOCA D.D. 20 DEL 03 03 2008-INTE &&SETTORE OO.PP.-REVOCA D.D.20 DEL 0	REGIONE CAMPANIA VIA SANTA LUCIA, 81 80132 NAPOLI NA P/CONTO DI 1932SETTORE OO.PP.-REVOCA	2.500.000,00		2.500.000,00			
17/12/2009	OP 30882 - ACCORDO QUADRO 3, PROT AGGIUNTIVO MOD 61 BIS TP DEL 17.12.09	REGIONE CAMPANIA	530.000,00		530.000,00			
21/12/2009	VERSAMENTO COMMISSARIO AD ACTA	DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA C- DGLAI - IX - CONTRATTI DIPROGRAMMSVILUPPO ECONOMICO	10.112.340,30	10.112.340,30				
28/04/2010	ART. 86 LEGGE 289/02 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 3575/07 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 588/05 R.G.	ANAS SPA	11.525,84				11.525,84	
21/09/2010	VERSAMENTO BONIFICO 82633162805 &TRANSAZIONE DEL 23.06.2010 &&PROGG.6096-6097- VERSAM SOMMA ATTO	SOCIETA CONSORTILE MISTA P.A. PER EBOLI-SA VIA MATTEO RIPA	1.041,03				1.041,03	
01/12/2011	VERSAMENTO BONIFICO 8801331760001010 DEL 01/12/2011 PER INTESAISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOL &&INTESA ISTITUZIONALE DIPROGRAMMA.	REGIONE CAMPANIA VIA SANTA LUCIA, 81 80132 NAPOLI NA P/CONTO DI 993INTESA ISTITUZIONALE	620.000,00		620.000,00			
20/03/2012	VERSAMENTO BONIFICO 98111855703 &&RESTITUZIONE CREDITO CONTRIBUTIVO	INFRATERR S.R.L. BARI VIA GIOVANNI AMENDOLA , 105	1.125,92					1.125,92
17/07/2012	COMMITT. RINNOVAMENTO DELL'ANNOVAMENTO DELLA CURETANEA MOD.121T N.26023 DIPARI IMPORTO EMESSA IL 16.02.2012 AVENTE LA SEGUENTE CAUSALE: VERS. SPESEGIUD.SENT.CORTE APPELLO NAPOLI 3575/2007 DEP. 19.11.07 CAUSA 558/05 R.G.DI SALVO TERESA + 2 PROG. 39/40/6006	AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO NAPOLI	8.540,00					8.540,00

DATA MOVIMENTO	CAUSALE	VERSANTE	IMPORTO	MISE	REGIONE	MIT	ALTRE	RIENTRI
17/12/2012	ESE: 2012 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00001 - DM impegno ederogazione primo acconto	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	15.000.000,00			15.000.000,00		
08/04/2013	VERSAMENTO BONIFICO 00102855003 &VERSAM. RITENUTA D'ACC./NRF/0101077516331706481510015100IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED	D AGOSTINO GIANCARLO	2.343,10					2.343,10
12/11/2013	VERSAMENTO BONIFICO 43136670200 DEL 09/11/2013 PER RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA &&	CERONE LAURA REMOLLINO MARIA ROSA MURO LUCANO C.DA COSTA GRANDE P/CONTODI REMOLLINO MARIA ROSA	2.729,43					2.729,43
28/04/2016	VERSAMENTO BONIFICO 00572911010 &restituzione somma indebitamente percepita su fatture n.1 PA e n.2 PA del 9 12 2015/NRF/1604271647033320480420304200IT25035 /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED	D ANISI LORENZO NICOLA VACCARO 0066 85100 POTENZA PZ	1.022,00					1.022,00
25/07/2016	ESE: 2016 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00002 - ASSE STRADALELIONI GROTAMINARDA CUP D3	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	8.540.485,00			8.540.485,00		
25/07/2016	ESE: 2016 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00001 - LIONI GROTAMINARDA CUP D31B12000310001	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	1.007.515,00			1.007.515,00		
16/11/2016	CUP@B61B0 30002 70005 * CIG@26043 086F1 APQ SISTEMI DI MOBILITA' - DELIB	REGIONE CAMPANIA	6.000.000,00		6.000.000,00			
13/02/2017	VERSAMENTO BONIFICO 00879477502 &PERCEPITA SU FATTURA N. PAM 03 DEL21.12.2016 /NRF/A100383837601030484193041930IT /SEPASCT/EBAS&&RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE	BOLOGNA PASQUALE LUCIO ANTONIO, PIAZZA DANTE ALIGHIERI 29	342					342
05/07/2017	ESE: 2017 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00002 - ASSE STRADALELIONI GROTAMINARDA CUP D3	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	4.721.485,00			4.721.485,00		
05/07/2017	ESE: 2017 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00001 - ASSE STRADALELIONI GROTAMINARDA CUP D3	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	15.278.515,00			15.278.515,00		
20/12/2017	CAMOV-09 ASSE NORD-SUD TIRRENICO ADRIATICO TRATTA LIONI GROTAMINARDA 1 LOTTO	REGIONE CAMPANIA	11.337.080,00		11.337.080,00			
04/05/2018	L. 219-81 - Chiusura definitiva opera pubblica COINFRA prog. n.39-40-6053	DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIV DGAJ - DIVISIONE V - PROGRAMMAZIOSVILUPPO ECONOMICO	1.717.903,20	1.717.903,20				
04/05/2018	L. 219-81 - Chiusura definitiva opera pubblica COINFRA prog. n.39-40-6053	DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIV DGAJ - DIVISIONE V - PROGRAMMAZIOSVILUPPO ECONOMICO	5.505.722,09	5.505.722,09				
21/06/2018	ESE: 2018 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00003 - ASSE STRADALELIONI GROTAMINARDA CUP D3	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	105.030,00			105.030,00		
21/06/2018	ESE: 2018 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00002 - asse stradaleLioni Grotaminarda CUP D3	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	15.705.343,00			15.705.343,00		
21/06/2018	ESE: 2018 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00001 - ASSE STRADALELIONI GROTAMINARDA CUP D3	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	4.721.485,00			4.721.485,00		
11/07/2018	CIG26043086F1 CUPB61B03000270005 APQ DELIBERA CIPE N. 62-11 - COD.CAMOV-09 ASSE	REGIONE CAMPANIA	9.422.099,00		9.422.099,00			
14/08/2018	ASSE NORD-SUD TIRRENO ADRIATICO LAORIA - CONTORSI - GROTAMINARDA	REGIONE CAMPANIA	12.662.920,00		12.662.920,00			
19/09/2018	VERSAMENTO BONIFICO 01515935011 &M. DI CASTELGRANDE FG31 PART 28 MQ195TRX 207 DEL 15 06 10CRISTIANO MARIO /NRF/A102592630601030484193041930IT/SEPASCT/EBAS &&REST, MAGG SOMMA IND. DI ESPROP. CO	CRISTIANO MARIO, CERONE ANNA CORSO GASPARRINI	23,05					23,05
15/10/2018	VERSAMENTO BONIFICO 01548132603 &CRISTIANO MARIA REST.MAG.SOMMA PERCEPITA PER INDEN.ESPROPRIAZI.COM.CASTELGRANDE F.31 PILA 438 MQ 260TRANS.247 28.4.11 PROG.39-60-COM-6057-	BOCCHINO MONICA VIA P.C.LUIGI SEQUINO 61 I.2	34,39					34,39
21/11/2018	CUP B61B03000270005 - I STRALCIO 10 INTERVENTO@ REALIZZ. COLLEGAMENTO VELOCE FR	REGIONE CAMPANIA	721.500,00		721.500,00			

DATA MOVIMENTO	CAUSALE	VERSANTE	IMPORTO	MISE	REGIONE	MIT	ALTRE	RIENTRI
04/12/2018	VERSAMENTO BONIFICO 01605767611 & RESTIT. MAGGIORE SOMMA PERCEPITA PER INDENNITA DI ESPROPRIO-COM. PESCO PAGANO-FOGLIO 34 PART. 136(EX52) TRAN. 260 DEL 28/4/11 PR. 39/60/COM. 5067/2/NRF/5034001555678337484216042160 IT /SEPASCT/EBAS & NOT PROVIDED	PACE DONATA, GONNELLA PIETRO VIA SANTISSIMA INCORONATA	887,88					887,88
17/12/2018	? RIFERIMENTO PRATICA NR. 400728-TAR ? CONTRIBUTO ANNO 2018 CON DECORRENZA DAL 01-	REGIONE CAMPANIA	216,67					
TOTALE			219.393.276,88	109.188.516,31	45.043.599,00	65.079.858,00	24.092,71	56.994,19

Detratti rientri ecc. 219.312.189,98

Totale versamenti MISE	109.188.516,31	110.123.457,00
Totale versamenti Regione Campania	45.043.599,00	
Totale versamenti MIT	65.079.858,00	
Totale versamenti di altra provenienza	24.092,71	
Totale rientri a vario titolo	56.994,19	

* : suddivisione importo per progetti c.2	
prog. n. 39/60/6057	35.753.924,05
prog. n. 39/60/6062	5.269.928,00
prog. n. 39/40/6063	2.571.728,59
prog. n. 39/40/6064	702.471,33
	44.298.051,97
arrotondamento operato dal MAP	76,03
	44.298.128,00



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 86

6) LA CONTABILITA' ORDINARIA 2244 E LA DELEGA DAL DG

Il comma 3 dell'art. 86 della L. 289/02 (Finanziaria 2003) stabiliva in € 300.000,00/anno a carico del Mise il costo di gestione su apposita contabilità Commissariale ordinaria n. 2244 intestata "*Spese per il funzionamento compreso il compenso, l'indennità ed il rimborso e spese di missione...*", prevedendo la totale autonomia dell'Ufficio, e includendo a carico della stessa ogni onere per acquisto apparecchiature informatiche, per manutenzioni, per materiali d'uso e di ricambio ecc., oltre che per compenso commissariale (€ 65.000/anno) e sue missioni (autorizzate fino a circa 15.000€/anno ma limitate al massimo e rendicontate per una media di circa 5000€/anno).

Della suddetta disponibilità finanziaria di € 300.000, ogni anno, fino al 2011 incluso, il Commissario, antesignano della spending review, ha restituito una media di oltre 100.000€ al Ministero per un totale di oltre un milione di €.

Diversa è la situazione dal 2012: a giugno di tale anno, con d.l. 83 convertito nella L. 134 dell'8.8.2012, venivano ridotte ad € 100.000,00/anno le risorse per funzionamento.

Il provvedimento veniva per giunta interpretato dal MEF come retroattivo all'1.1.2012 e soprattutto il carico del finanziamento veniva spostato dal MiSE ad apodittiche economie sui lavori di competenza Commissariale.

Come già detto, la riduzione del 66% delle spese di funzionamento annuale (da € 300.000 a € 100.000) risultava tale da impedire non solo la prosecuzione di progetto finalizzato concordato con i sindacati, ma anche la consulenza giuridica, essenziale per incombenze complesse e variegate come quelle Commissariali e già oggetto di gara pubblica conclusa, ma anche di escludere la possibilità di effettuare la manutenzione delle numerose apparecchiature informatiche, con conseguenze gravi sulla inefficienza attuale di alcune di esse e sulla perdita di migliaia di dati per uno specifico incidente.

Si aggiungano infatti i ritardi inaccettabili nell'assegnazione delle risorse finché queste hanno fatto capo al MiSE, e si considerino i gravi contraccolpi di cui appresso sulla corretta funzionalità dell'Ufficio anche quando le risorse provengono dalla contabilità speciale dello stesso Commissario, a partire quindi dal 2012:

- Anno 2012 - assegnazione per cassa a novembre
- Anno 2013 - " " a settembre (con riduzione di € 5.000)
- Anno 2014 - " " a fine novembre
- Anno 2015 - " " a dicembre (oltre il 5.12 e quindi con impossibilità di erogazioni per tutto il 2015)
- Anno 2016 - " " a luglio
- Anno 2017 - " " a marzo (con riduzione di € 4000)
- Anno 2018 - " " a febbraio



A far data dall'esercizio 2016 è stata poi richiesta da parte dell'UCB una Determina del Direttore Generale I.I. di "delega delle funzioni necessarie per la gestione del capitolo 2244 - piano di gestione 1 – *“Spese per il funzionamento compreso il compenso, l'indennità ed il rimborso e spese di missione....”* - in favore del Commissario ad Acta, adottata quindi negli ultimi 3 esercizi finanziari.

CAPITOLO DI CONTABILITA' ORDINATIA N. 2244 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

ESERCIZIO FINANZIARIO	A	B	C	D	E	F
	CAP 2244		SOMME SPESE			ECONOMIE
	SOMME PROVENIENTI DA RISORSE DGIAI/MISE	SOMME PROVENIENTI DA ECONOMIE COMMISSARIO AD ACTA	c/competenza c/cassa (somme erogate nell'anno)	c/competenza (somme impegnate erogate successivamente)	TOTALE C+D	TOTALE (A+B)-E
2003	300.000,00		5.400,00	65.198,43	70.598,43	229.401,57
2004	300.000,00		79.427,85	101.724,31	181.152,16	118.847,84
2005	300.000,00		97.384,82	45.991,35	143.376,17	156.623,83
2006	300.000,00		172.591,30	16.569,58	189.160,88	110.839,12
2007	300.000,00		133.025,60	9.227,83	142.253,43	157.746,57
2008	300.000,00		154.160,99	27.963,80	182.124,79	117.875,21
2009	300.000,00		157.770,31	40.875,64	198.645,95	101.354,05
2010	300.000,00		172.505,18	33.495,89	206.001,07	93.998,93
2011	300.000,00		148.334,71	40.236,81	188.571,52	111.428,48
2012 (1)		100.000,00	99.987,20	0,00	99.987,20	12,80
2013 (2)		100.000,00	87.481,50	6.761,36	94.242,86	5.757,14
2014		100.000,00	98.054,39	1.070,03	99.124,42	875,58
2015		100.000,00	0,00	99.904,80	99.904,80	95,20
2016		100.000,00	99.979,91	0,00	99.979,91	20,09
2017 (3)		100.000,00	95.723,44	0,00	95.723,44	161,56
2018		100.000,00	91.669,16	89,00	91.758,16	8.241,84
TOTALI	2.700.000,00	700.000,00	1.693.496,36	489.108,83	2.182.605,19	1.213.279,81

nota (1)

In data 22.6.2012 è intervenuto il d.l.83, convertito nella L.134/2012, che ha ridotto la dotazione annua ad €. 100.000,00 e ne ha imposto il finanziamento a carico delle risorse per lavori dello stesso Commissario.

Alla data del 22/6/12 era tuttavia già maturata quota parte della precedente assegnazione (v. finanziaria 289/02) di €.300.000,00/anno (per €. 142.000,00 che il Commissario ha richiesto senza esiti a copertura degli impegni già presi).

L'impossibilità di gestire progetti ed attività per 550 milioni di €/anno è evidente e ripetutamente segnalata dal Commissario medesimo.

nota (2)

dall'importo assegnato sono state accantonate €. 5.757,00 dall'Ispettorato Generale del Bilancio del Ministero dell'Economia in previsione di future variazioni negative di bilancio e pertanto l'importo disponibile è stato ridotto a €.94.243,00 -

nota (3)

dall'importo assegnato sono state accantonate €. 4.115,00 dall'Ispettorato Generale del Bilancio del Ministero dell'Economia in previsione di future variazioni negative di bilancio e pertanto l'importo disponibile è stato ridotto a €.95.723,44 -

N.B.: tutte le economie di cui alla tabella sono state annualmente restituite al MISE dal Commissario.

DISCIPLINARE

Nell'anno 2004, il giorno Giugno del mese di Marzo, nella sede del Provveditorato OO PP sita in Potenza alla via Corso Garibaldi n. 149

l'Ufficio del Commissario ad acta ex art.86 L.289/02 (di seguito denominato Commissario) con sede in Roma alla Via Molise n 2 presso il Ministero delle Attività Produttive in persona del Commissario ing. D'AMBROSIO FILIPPO (C.F.: DMBFPP46A08H501T), nato a Roma, il 08/01/1946, per la carica ivi domiciliato

E

il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Basilicata (C.F. 80004150761) (di seguito denominato Provveditorato) con sede in Potenza al Corso Garibaldi, 149 - in persona del Provveditore p.t. dott. ing. Francesco Saverio Campanale, nato a Ruvo di Puglia il 17.2.1943, per la carica ivi domiciliato

PREMESSO

CHE il Commissario deve realizzare i lavori di completamento dei progetti revocati 6057 e 6062 per un importo presunto di complessivi € 27.086.613,86 per il progetto 6057 già realizzato dal Concessionario per circa l'85% e di complessivi € 3.090.000,00 per il progetto 6062 realizzato dal Concessionario per circa l'81% già previsti tra gli interventi ex art.32 L.219/81 ed oggetto di revoca delle Concessioni rispettivamente con D.M. nn. 94 e 93 del 3.10.03.



CHE gli importi residui da realizzare di cui sopra sono presunti poiché prescindono dalle esatte valutazioni conseguenti agli stati di consistenza.

CHE la attuale struttura tecnica del Ministero Attività Produttive della quale il Commissario è autorizzato dalle norme sui LL.PP. a richiedere supporto non è adeguata e sufficiente a realizzare in tempi contenuti tale opera per la sua importanza e complessità, come risulta da nota della D G C.I.I. n.1.052.753 del 25.7.03 ribadita con nota n.1.053.306 del 22.10.03, per cui si rende necessario il ricorso ad un organismo pubblico dotato di specifica e consolidata esperienza e professionalità in materia di lavori pubblici, individuato nel caso in specie conformemente alle leggi in materia (vedi in particolare l'art.19 L.109/94 e s.m. e l..) nel Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Basilicata, giusta Decreto Commissariale n. 006 dell'11.11.2003

CHE in materia si richiamano i pareri del C.S., Sez. V 29.9.99 n.120, del C.S. Sez. I 5.11.97 n° 1624/97, l'atto di regolazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n° 6/99, i pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato con particolare riferimento al parere n.9417 del 29.1.03 ed al parere n.21425 dell'11.2.04, richiesto per il caso in specie, nonché i pareri dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Attività Produttive n° 22651 del 12.9.03 e n° 2886 del 13.10.2003.

CHE nella fattispecie in argomento l'Ufficio del Commissario corrisponde all'Amministrazione aggiudicatrice, il Provveditorato Regionale alle OO.PP. alla stazione appaltante

STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

ART. 2

Il Commissario ad Acta affida al Provveditorato la realizzazione degli interventi di seguito specificati per la parte non eseguita di cui in premessa e l'aspletamento di tutte le attività e procedure indicate al successivo articolo 4:

Handwritten signature and initials in the right margin.

• Prog. 6057 completamento lavori della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 - "Ofantina", in località Nerico -

Prog. 6062 completamento lavori della strada di collegamento tra l'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano -".

La documentazione progettuale già agli atti del M.A.P., nonché la documentazione relativa agli stati di consistenza dei lavori, è stata già consegnata dall'Ufficio Commissariale

ART. 3

Il Provveditorato si impegna a svolgere le attività per conto del Commissario attraverso la propria struttura operativa, per l'espletamento di tutte le procedure, fatta eccezione per quelle espressamente escluse, al fine di consentire la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte e nei tempi più contenuti possibili.

ART. 4

Il Provveditorato curerà le attività suddette e specificamente quelle di progettazione, di affidamento in appalto, di direzione dei lavori e di collaudo e quelle connesse. L'Ufficio Commissariale svolgerà le funzioni di supervisione.

Ove poi se ne verifichi la opportunità e la possibilità potrà essere concordata l'eventuale collaborazione di funzionari dell'Ufficio commissariale alle varie fasi di realizzazione dell'opera.

Il Provveditorato assumerà pertanto le funzioni di Stazione appaltante ex art.19 - comma 3 della Legge n.109/94 ed in tale veste svolgerà tutte le attività affidate, (ivi incluso l'aggiornamento progettuale, l'espletamento delle procedure di gara per l'appalto dei lavori, per intero o per stralci, la stipula dei relativi contratti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici), di seguito indicate, impegnandosi a comunicare tempestivamente i nominativi del personale ad esse assegnato:

- a) provvederà alla designazione dei soggetti interessati alle funzioni di cui sopra e specificamente alla costituzione del gruppo di progettazione che effettuerà le necessarie verifiche sulle opere da completare e prenderà



parte anche alle verifiche di consistenza – nomina del responsabile della sicurezza in fase di progettazione e nomina del responsabile unico del procedimento. A tal fine il Provveditorato procederà ad eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D. Lgs. n.494/96, nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche, ove non reperibili presso il Provveditorato stesso o non reperiti presso il M.A.P. da parte del Commissario;

- b) convocazione e gestione di "Conferenze dei Servizi" presieduta dal Commissario o da suo delegato finalizzate ad ottenere tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art.81 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. n.383/94 ove non già acquisiti sui progetti in argomento ed in generale ai sensi della L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento di cui al prog.6062, aggiornato ai sensi dell'art.16, comma 5) della legge 109/94, entro e non oltre tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, da trasmettere al Commissario per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento degli atti;
- d) redazione del definitivo relativo ai lavori di completamento di cui al prog.6057, aggiornato ai sensi dell'art.16, comma 4) della legge 109/94, entro e non oltre tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, da trasmettere al Commissario per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara (appalto integrato di cui al comma 1 lettera b dell'art.19 della legge 109/94), da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento degli atti;
- e) designazione incaricati ex D.L.vo 494/96 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- f) trasmissione degli atti negoziali, riferiti alle opere da realizzare e completi della prescritta documentazione, al Commissario per l'approvazione e conseguente assunzione dell'impegno di spesa. Dell'adozione del provvedimento il Commissario darà immediata comunicazione al Provveditorato per il seguito di competenza;



- g) designazione delle commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, anche in corso d'opera, con onere da inserire nelle previsioni di spesa del quadro economico dell'intervento;
- h) assistenza per la definizione di tutte le controversie con le imprese esecutrici, anche con proposte in via transattiva, in sede amministrativa ed assistenza in sede giurisdizionale.

ART. 5

Il Commissario provvederà alle necessarie approvazioni di competenza, al finanziamento e all'erogazione dei fondi per la copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere di cui si tratta. L'importo complessivo delle opere sarà esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato

Il Commissario si riserva altresì di far fronte agli oneri derivanti dall'attività iniziale di collaborazione e supporto al proprio Ufficio anche, ove possibile, mediante le spese di funzionamento dell'Ufficio stesso di cui al c.3 dell'art.86 L.289/02.

ART. 6

Il Provveditorato curerà la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa necessari all'erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari incaricati, liquidati dal Responsabile del Procedimento, da inoltrare al Commissario od altri Uffici previsti dalla vigente normativa, per il relativo pagamento, da disporre in favore degli aventi diritto.

Il Commissario comunicherà, di volta in volta, al Provveditorato l'avvenuta disposizione di pagamento.

A conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di collaudo o regolare esecuzione, verranno trasmessi al Commissario per il formale provvedimento di approvazione e pagamento delle rate di saldo.

Il Commissario si avvarrà della propria struttura per le attività di controllo e supervisione e, come accennato, potrà concordare con il Provveditorato tempi e modi di partecipazione eventuale di funzionari del proprio Ufficio alle varie fasi di realizzazione dell'opera.

Handwritten signature and initials in the right margin, possibly reading '10' and 'Paul'.

ART. 7

Lo svolgimento delle attività esercitate dal Provveditorato per la Basilicata, derivanti dal presente atto, è da intendersi a titolo oneroso per il Commissario, con imputazione delle relative spese al finanziamento disponibile.

Nel quadro economico dell'intervento ed in particolare fra le "somme a disposizione della Stazione appaltante", saranno previsti gli importi adeguati per la totalità delle voci e prestazioni di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 554/99.

Nel citato quadro economico sarà anche prevista la percentuale commisurata a quella stabilita dall'art. 18 della legge 109/94 e succ., sull'importo a base di gara, da erogarsi, quale incentivo e per le quote che verranno fissate dal Provveditorato in favore dei funzionari che direttamente avranno partecipato all'espletamento dell'incarico.


Per le attività relative ai sopralluoghi si concorda che saranno corrisposte dal Commissario le spese di missione, previa liquidazione delle stesse da parte del responsabile del procedimento, per un importo complessivo massimo di €.25.000,00 (Euro venticinquemila/00) per anno. Il Provveditorato si impegna comunque a formulare previsione in bilancio delle somme necessarie a tale titolo negli anni successivi. Per gli affidamenti relativi ad incarichi professionali per integrazioni specialistiche citate all'art. 4 è fissato un importo massimo complessivo di €.100.000,00 (Euro centomila/00).

Le prestazioni professionali rese ai sensi dell'art. 74 c.2 del T.U. n.76/90 sono esenti da I.V.A..

Saranno altresì erogate dal Commissario direttamente al beneficiario tutte le spese effettivamente sostenute per la redazione dei progetti, riproduzioni, spese di gara ed altre spese connesse, liquidate dal Provveditorato o dal Responsabile del procedimento nel limite massimo di €.100.000,00 (Euro centomila/00), da inserirsi, al pari delle precedenti, nel quadro economico del progetto.

Ove tali importi risultassero non sufficienti, per le maggiori spese, il Provveditorato avanzerà motivata richiesta di integrazione al Commissario.

Il Commissario provvederà, pertanto, al pagamento di tutte le spese effettivamente sostenute, nei limiti, nei termini e nei modi di cui sopra,

Handwritten signature and initials in the right margin, possibly indicating approval or signature of the official.

direttamente a favore dei creditori, su presentazione di documentazione contabile, liquidate dal Provveditorato ovvero dal Responsabile del Procedimento secondo rispettiva competenza.

ART. 8

Il Provveditorato svolgerà l'incarico connesso all'espletamento delle attività formanti oggetto del presente Disciplinare nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di lavori pubblici in quanto applicabili, ai sensi dell'art.86 c.2 L.289/02 e delle norme Comunitarie

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Disciplinare le parti convengono di far riferimento in generale alla normativa in materia di lavori pubblici, alle norme dell'ordinamento amministrativo ed in quanto applicabili a quelle di diritto comune:

ART. 10

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Disciplinare, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 della legge n.241/90.

ART. 11

Il presente atto sarà registrato fiscalmente solo in caso d'uso ex art.5 – co.11 – del D.P.R. n.131/86. Restano valide le esenzioni e le agevolazioni fiscali, per quanto applicabili di cui al T.U. n.76/90 artt. 70 e 74.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Provveditore alle OO PP
(Ing. Francesco Saverio Campanale)



Il Commissario ad Acta
(Ing. Filippo D'Ambrosio)





LA PRESENTE NOTA È
CONFORME ALL'ORIGINALE
AL PRINCIPALE
(dott. ing. F. MISTRI)



M. INF. PRRA
Prov. COOP per la Puglia
COOP-BA
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0009790-03/08/2010-USCITA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia - Basilicata

Via Dalmatina, 70/A - 70121 BARI Tel. 080.5552242 - Fax 080.5552222

www.provveditoratocooppuglia.it - coop.ba@mit.gov.it

Cod. Fisc. 93910920728

prot. n. 12687
5.8.2010

ATTO AGGIUNTIVO AL DISCIPLINARE IN DATA 5.3.2004

PREMESSO

- che tra il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Basilicata (oggi sede coordinata di Potenza del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Puglia e la Basilicata) e l'Ufficio del Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 è stato stipulato, in data 5 marzo 2004, un disciplinare per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'art. 19 - comma 1 - della L. 10/94;
- che si rende necessario definire in maniera più analitica quali siano i compiti della stazione appaltante e gli oneri finanziari che il Commissario rimborserà alla stessa stazione appaltante ai sensi dell'art. 33, comma 3, del DLgs 163/2006 e s.m. ed i;
- che con provvedimento n. 750 del 21/01/2010, in considerazione degli attuali carichi di lavoro è stato evidenziato, al Commissario ad acta, che non è possibile per questo Provveditorato dare corso a nuove ed ulteriori attività di progettazione, appalto e direzione lavori nell'ambito dei progetti n. 6057 e 6062;
- che con provvedimento n. 7383 del 16/02/2010 è stata confermata l'impossibilità di far fronte all'espletamento delle ulteriori attività richieste in quanto non prevedibili al momento della sottoscrizione della convenzione;
- che in data 3 marzo 2010 si è tenuto un incontro tra il Commissario ad acta ed il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Puglia e la Basilicata, presso la sede di Bari del Provveditorato atto a chiarire le attività possibili da svolgere in cura del Provveditorato;
- che, pertanto, gli artt. 5 e 7 del citato disciplinare vanno opportunamente sostituiti;
- che con provvedimento n. 4954 del 12/04/2010, è stato trasmesso al Commissario ad acta uno schema di atto aggiuntivo al disciplinare in data 05/03/2004;
- che con nota del Commissario ad acta n. 12.008 del 19/04/2010 sono stati segnalati alcuni aspetti da approfondire proponendo un incontro definitivo sull'argomento;
- che, a seguito degli approfondimenti del caso, l'incontro definitivo è stato concordato presso la Sede Coordinata di Potenza del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Puglia e la Basilicata, in data 11 maggio 2010;

[Handwritten signature]

- che sul presente atto aggiuntivo al disciplinare del 05/03/2010, sotto forma di schema, è stato acquisito il parere di legittimità dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza che, con nota n. 129/10 del 29/07/2010, ha approvato il predetto schema con alcune raccomandazioni;
- che quanto di seguito riportato è conforme alle raccomandazioni formulate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza con la citata nota n. 129/10 del 29/07/2010;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata – Sede Coordinata di Potenza ed il Commissario ad acta ex art. 86 della Legge 289/2002, si conviene quanto segue:

ART. 1

L'art. 2 del disciplinare stipulato in data 05/03/2004 tra il Provveditorato Regionale OO.PP. per la Basilicata ed il Commissario ad acta ex art. 86 della Legge 289/2002 deve intendersi integralmente sostituito come segue:

“Art. 2) Il Provveditorato interregionale, fermo restando gli interventi i cui lavori risultano ultimati ed in fase di collaudo alla data di sottoscrizione della presente convenzione, porterà a termine i procedimenti connessi alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) Prog. 39/60/6057 - 2° lotto, in fase di esecuzione;
- b) Prog. 39/60/6057 - 3° lotto 1° stralcio, in fase di aggiudicazione;
- c) Prog. 39/60/6062 - Visibilità secondaria Cavalcavia loc. Ponte Giacoia, in fase di esecuzione;
- d) Prog. 39/60/6062 - Rotatoria di immetto sulla S.S. 7, in fase di consegna dei lavori.

La Direzione dei lavori di gli interventi di cui ai punti a), b) e d), è affidata all'Ing. Paolo Turi. Alla determinazione e liquidazione delle competenze dovute all'Ing. Turi del Ministero dello Sviluppo Economico provvederà direttamente il Commissario ad Acta.

Il Commissario ad acta porterà a termine i procedimenti connessi alla realizzazione dei seguenti interventi, al momento individuati e di seguito riportati, nonché di eventuali altri interventi che si rendessero necessari per la completa funzionalità dell'opera oggetto della convenzione:

- e) Prog. 39/60/6057 - 1° lotto di completamento, da appaltare a cura del Provveditorato suddetto;
- f) Prog. 39/60/6062 - Ripristino viadotto "Platano" e raccordo con la S.S. 94 dir. da appaltare a cura del Provveditorato suddetto;
- g) Prog. 39/60/6057 - 3° lotto - 2° stralcio - svincolo di Muro Lucano, da eseguire la progettazione;
- h) Prog. 39/60/6057 - 1° lotto di completamento, lavori di ripristino strutturale del viadotto "Ficocchia", da eseguire la progettazione.

Paolo Turi

A tale riguardo, i rispettivi Responsabili del procedimento provvederanno alla formale consegna dei fascicoli inerenti i suddetti interventi al Commissario ad acta nel più breve tempo possibile al fine di evitare soluzioni di continuità.

ART. 2

L'art. 7 del disciplinare stipulato in data 05/03/2004 tra il Provveditorato Regionale OO.PP. per la Basilicata ed il Commissario ad acta ex art. 86 della Legge 289/2002 deve intendersi integralmente sostituito come segue:

"Art. 7) Lo svolgimento delle attività di competenza del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata, rivenienti dal disciplinare originario, è a titolo oneroso ai sensi del comma 3 dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici, con imputazione delle relative spese ai fondi gestiti dal Commissario ad acta ex art. 86 della Legge 289/2002 per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Pertanto, nei quadri economici dei singoli interventi in oggetto di competenza del citato Provveditorato, saranno previste fra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione", oltre alle voci di cui all'art. 17 del D.P.R. 554/1999 e ss. mm. e ll., il rimborso dei costi sostenuti dal Provveditorato suddetto e previsti dal comma 3 dell'art. 33 del DLgs 163/2006 e ss. mm. e ll., quantificati nella misura massima dell'1,5% dell'importo a base di gara di tutti quegli interventi per i quali, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, non sia intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e relativo collaudo.

Tali rimborsi riguarderanno le spese di carattere strumentale sostenute in relazione alle attività svolte o da svolgere per gli interventi di cui sopra, ai sensi dell'art. 92, comma 7bis del predetto DLgs, con esclusione delle spese di missione che saranno corrisposte direttamente dalla Struttura Commissariale ai dipendenti del Provveditorato su liquidazione dello stesso.

All'uopo, i predetti rimborsi dei costi, saranno versati dal Commissario, su richiesta del Provveditorato, sul conto di contabilità speciale infruttifera, codice 1214, acceso presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale di Bari, intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP. di Puglia e Basilicata.

A tal fine il Commissario si impegna ad accantonare tale fondo nei quadri economici relativi agli interventi in corso per i quali, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, non sono stati approvati i relativi atti unici di collaudo tecnico-amministrativo od i certificati di regolare esecuzione.

Si concorda che i rimborsi previsti nel presente articolo attengono ai costi sostenuti con decorrenza al 1.2010.

Non è oggetto di disciplina l'istituto del componso incentivante di cui all'art. 92, comma 5 del DLgs 163/2006 e s.m. e ll. da prevedere parimenti tra le "Somme a disposizione

dell'Amministrazione" dei quadri esondotici dei vari interventi, che sarà erogato secondo le norme di riferimento.


ART. 3

Resta fermo quant'altro stabilito nel disciplinare in data 05/03/2004 e non modificato dal presente atto, per quanto è in contrasto,

il 03 AGO, 2010

IL COMMISSARIO / D- ACTA

(Dott. Ing. Filippo D' Ambrosio)



IL PROVVEDITORE

(Dott. Ing. Francesco Musci)



DISCIPLINARE

Atto n. 6241 di Rep.

Nell'anno 2004, il giorno Sedici del mese di Mars, nella sede dell' Provveditorato alle OOPP sita in NAPOLI alla via Marchese di Campodisola n. 21

L'Ufficio del Commissario ad acta ex art.86 L.289/02 (di seguito denominato Commissario) con sede in Roma alla Via Molise n.2 presso il Ministero delle Attività Produttive in persona del Commissario ing. D'AMBROSIO FILIPPO (C.F.: DMBFPP46A08H501T), nato a Roma, il 08/01/1946, per la carica ivi domiciliato


E

il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania (C.F.80160980639) (di seguito denominato Provveditorato) con sede in Napoli alla Via Marchese Campodisola, 21 - in persona del Provveditore p.t. dott. ing. Mario Mautone, nato a Napoli il 20/10/1951, per la carica ivi domiciliato

PREMESSO

CHE il Commissario deve realizzare i lavori di completamento dei progetti revocati 6063 e 6064 per un importo presunto di complessivi Euro 1.381.607,00 per il progetto 6063 già realizzato dal Concessionario per circa il 95% e di complessivi Euro 265.441,86 per il progetto 6064 realizzato dal Concessionario per circa il 92 % già previsti tra gli interventi ex art.32 L.219/81 ed oggetto di revoca delle Concessioni con D.M. NN.91 e 92 del 3/10/03.

CHE gli importi residui da realizzare di cui sopra sono presunti poiché prescindono dagli stati di consistenza.



CHE la attuale struttura tecnica del Ministero Attività Produttive della quale il Commissario è autorizzato dalle norme sui LL.PP. a richiedere supporto non è adeguata e sufficiente a realizzare in tempi contenuti tale opera per la sua importanza e complessità, come risulta dalla nota della D.G.I.I. n. 1.052.753 del 25/7/03 ribadita con nota n. 1.053.306 del 22/10/03 per cui si rende necessario il ricorso ad un organismo pubblico dotato di specifica e consolidata esperienza e professionalità in materia di lavori pubblici, individuato nel caso in specie conformemente alle leggi in materia (vedi in particolare l'art.19 L.109/94 e s.m. e i..) nel Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Campania, giusta Decreto Commissariale n.006 dell'11/11/2003.

CHE in materia si richiamano i pareri del C.S., Sez. V 29.9.99 n.120, del C.S. Sez. I 5.11.97 n. l'atto di regolazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n.6/99 i pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato con particolare riferimento al parere n.9417 del 29/1/03 ed al parere n. 21425 dell'11.2.04, richiesto per il caso in specie, nonché i pareri dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Attività Produttive n. 22651 del 12.9.03 e n. 2886 del 13.10.2003.

CHE nella fattispecie in argomento l'Ufficio del Commissario corrisponde all'Amministrazione aggiudicatrice, il Provveditorato Regionale alle OO.PP. alla stazione appaltante .

STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

ART. 2

Il Commissario ad Acta affida al Provveditorato la realizzazione degli interventi di seguito specificati per la parte non eseguita di cui in premessa e l'espletamento di tutte le attività e procedure indicate al successivo articolo 4:

" ... Prog. 6063 completamento lavori della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 – Ofantina –



Prog. 6064 completamento lavori dello svincolo con la strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 – Ofantina –".

Vengono contestualmente formalmente consegnati gli elaborati progettuali, acquisiti presso il M. A. P. ed in precedenza resi disponibili per le vie brevi, di cui ai separati elenchi allegati al presente disciplinare nonché la documentazione connessa agli stati di consistenza ad oggi redatti, con riserva di integrazione ove successivamente intervenute.

ART. 3

Il Provveditorato s'impegna a svolgere le attività per conto del Commissario attraverso la propria struttura operativa, per l'espletamento di tutte le procedure fatta eccezione per quelle espressamente escluse, al fine di consentire la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte e nei tempi più contenuti possibili.

ART. 4

Il Provveditorato curerà le attività suddette e specificamente quelle di progettazione, di affidamento in appalto, di direzione dei lavori e di collaudo e quelle connesse. L'Ufficio Commissariale svolgerà le funzioni di supervisione.

Ove poi se ne verifichi l'opportunità e la possibilità potrà essere concordata l'eventuale collaborazione di funzionari dell'Ufficio commissariale alle varie fasi di realizzazione dell'opera.

Il Provveditorato assumerà pertanto le funzioni di Stazione appaltante ex art.19 – comma 3 della Legge n.109/94 ed in tale veste svolgerà tutte le attività affidate, (ivi incluso l'aggiornamento progettuale, l'espletamento delle procedure di gara per l'appalto dei lavori, per intero o per stralci, stipula dei relativi contratti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici), di seguito indicate, impegnandosi a comunicare tempestivamente i nominativi del personale ad esse assegnato:

a) provvederà alla designazione dei soggetti incaricati delle funzioni di cui sopra e specificatamente alla costituzione del gruppo di progettazione che effettuerà le necessarie verifiche sulle opere da completare e prenderà parte anche alle verifiche di consistenza- nomina del responsabile della sicurezza in fase di progettazione e nomina del responsabile unico del procedimento. A tal

fine il Provveditorato procederà al fine degli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D. Lgs. n.494/96 nonché degli eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche, ove non reperibili presso il Provveditorato stesso o non reperiti presso il M.A.P. da parte del Commissario;

b) convocazione e gestione di "Conferenze dei Servizi" comunque presieduta dal Commissario o da suo delegato finalizzate ad ottenere tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art.81 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. n.383/94 ove non già acquisiti sui progetti in argomento ed in generale ai sensi della legge 109/94 e succ;

c) redazione del progetto esecutivo aggiornato ai sensi dell'art.16, comma 5) della legge 109/94, per ciascuno degli interventi, entro e non oltre due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, da trasmettere al Commissario per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro g. 30 dal ricevimento degli atti;

d) designazione incaricati ex D.L.vo 494/96 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

e) trasmissione degli atti negoziali, riferiti alle opere da realizzare e completi della prescritta documentazione, al Commissario per l'approvazione e conseguente assunzione dell'impegno di spesa. Dell'adozione del provvedimento il Commissario darà immediata comunicazione al Provveditorato per il seguito di competenza;

f) designazione delle commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, anche in corso d'opera, con onere a carico del Commissario e da inserire nelle previsioni di spesa del quadro economico dell'intervento;

g) assistenza per la definizione di tutte le controversie con le imprese esecutrici, anche con proposte in via transattiva, in sede amministrativa ed assistenza in sede giurisdizionale.

ART. 5

Il Commissario provvederà alle necessarie approvazioni di competenza, al finanziamento e all'erogazione dei fondi per la copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere di cui si tratta. L'importo complessivo delle opere sarà esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato.

Il Commissario si riserva altresì di far fronte agli oneri derivanti dall'attività iniziale di collaborazione e supporto al proprio Ufficio anche, ove possibile, mediante le spese di funzionamento dell'Ufficio stesso di cui al c.3 dell'art.86 L.289/02.

ART. 6

Il Provveditorato curerà la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa necessari all'erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari incaricati, liquidati dal responsabile del Procedimento, da inoltrare al Commissario od altri Uffici previsti dalla vigente normativa, per il relativo pagamento da disporre, direttamente in favore degli aventi diritto.

Il Commissario comunicherà, di volta in volta, al Provveditorato l'avvenuta disposizione di pagamento.

A conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di collaudo o regolare esecuzione, verranno trasmessi al Commissario per il formale provvedimento di approvazione e pagamento delle rate di saldo.

Il Commissario si avvarrà della propria struttura per le attività di controllo e supervisione e potrà concordare con il Provveditorato tempi e modi di partecipazione eventuale di funzionari del proprio Ufficio alle varie fasi di realizzazione dell'opera.

ART. 7

Lo svolgimento delle attività esercitate dal Provveditorato, derivanti dal presente atto, è da intendersi a titolo oneroso per il Commissario, con imputazione delle relative spese al finanziamento disponibile.

Nel quadro economico dell'intervento ed in particolare fra le "somme a disposizione della Stazione appaltante", saranno previsti gli importi adeguati per la totalità delle voci e prestazioni di cui all'art.17 del D.P.R. n.554/99.

Nel citato quadro economico sarà anche prevista la percentuale commisurata a quella stabilita dall'art.18 della legge 109/94 e succ. sull'importo a base di gara da erogarsi, quale incentivo e per le quote che verranno fissate dal Provveditorato in favore dei funzionari che direttamente avranno partecipato all'espletamento dell'incarico.

Per le attività relative ai sopralluoghi si concorda che saranno corrisposte dal Commissario le spese di missione, previa liquidazione delle stesse da parte del responsabile del procedimento, per un importo complessivo massimo di euro 8.000,00 (euro ottomila/00). Per gli affidamenti relativi ad incarichi professionali per integrazioni specialistiche citate all'art.4 è fissato un importo massimo complessivo di euro 20.000/00 (euro ventimila/00).

Le prestazioni professionali rese ai sensi dell'art.74 c.2 del T.U. n.76/90 sono esenti da I.V.A.

Saranno altresì erogate dal Commissario al beneficiario tutte le spese effettivamente sostenute per la redazione dei progetti, riproduzioni, spese di gara ed altre spese connesse, liquidate dal Provveditorato e dal Responsabile del procedimento nel limite massimo di euro 40.000/00 (euro quarantamila), da inserirsi, al pari delle precedenti, nel quadro economico del progetto.

Ove tali importi risultassero non sufficienti, per le maggiori spese, il Provveditorato avanzerà motivata richiesta di integrazione al Commissario.

Il Commissario provvederà pertanto al pagamento di tutte le spese effettivamente sostenute, nei limiti, nei termini e nei modi di cui sopra, direttamente a favore dei creditori, su presentazione di documentazione contabile, liquidate dal Provveditorato.

ART. 8

Il Provveditorato svolgerà l'incarico connesso all'espletamento delle attività formanti oggetto del presente Disciplinare nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di lavori pubblici in quanto applicabili ai sensi dell'art.86 c.2 L.289/02 e delle norme Comunitarie.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Disciplinare le parti convengono di far riferimento in generale alla normativa in materia di lavori pubblici, alle norme dell'ordinamento amministrativo ed in quanto applicabili a quelle di diritto comune.

ART. 10

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 della legge n.241/90.

ART. 11

Il presente atto sarà registrato fiscalmente solo in caso d'uso ex art.5 – co.11 – del D.P.R. n.131/86. Restano valide le esenzioni e le agevolazioni fiscali, per quanto applicabili di cui al T.U. n.76/90 artt. 70 e 74.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Provveditore alle OO. PP.

(Ing. Mario MAUTONE)



Il Commissario ad Acta
(Ing. Filippo D'Ambrosio)



CONVENZIONE

Atto n. di Rep. 6883

Nell'anno 2009, il giorno 17 del mese di SETTEMBRE nella sede del Provveditorato interregionale alle OOPP per la Campania e il Molise, sita Napoli alla Via Marchese Campodisola, 21

TRA

Il Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02 (di seguito denominato Commissario) con sede in Roma alla Via Molise n. 2 presso il Ministero dello Sviluppo Economico – C.F. 80230390587 - nominato con D.M. 21.2.2003 nella persona dell'Ing. FILIPPO D'AMBROSIO per la carica ivi domiciliato.

E

il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e il Molise (C.F.80160980639) (di seguito denominato Provveditorato) con sede in Napoli alla Via Marchese Campodisola, 21 — in persona del Provveditore p.t. dott. DONATO CARLEA, per la carica ivi domiciliato.

PREMESSO

che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 legge 27 dicembre 2002 n° 289, al fine di realizzare i completamenti delle opere di cui all'art. 32 legge 14 maggio 1981 n° 219, veniva nominato dal Ministro delle Attività Produttive un Commissario ad Acta nella persona dell'Ing. Filippo D'Ambrosio con il compito, tra gli altri, di procedere al completamento degli interventi "le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991";

che il Commissario ad acta, in ottemperanza a quanto sopra, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 2 D.M. 21 febbraio 2003 ha convocato le previste conferenze dei servizi d'intesa con le Regioni interessate;

che la Conferenza dei Servizi per la Regione Campania tenutasi nella sede dell'Ufficio Commissariale di Salerno in data 11.9.03, ha individuato quale prioritario intervento per la regione medesima il completamento della viabilità Lioni — Grottaminarda in quanto necessaria al collegamento dell'autostrada NA-BA con l'autostrada SA-RC nell'ambito del più esteso collegamento Tirreno (Agropoli) — Adriatico (Termoli);

che ai sensi e per gli effetti del c.1 art. 86 legge 27 dicembre 2002 n° 289 i progettisti ed esecutori degli interventi suddetti sono stati individuati nei Concessionari ex art. 32 legge 14 maggio 1981 n° 219;

che nella fattispecie i Concessionari titolari dei lavori sono risultati il Consorzio INFR.AV. per il 60% circa delle opere ed il Consorzio INFRA.SUD per il restante 40% circa, come da apposito Verbale sottoscritto con i Concessionari;

che, pertanto, la progettazione definitiva, quella esecutiva e l'esecuzione delle opere sono attribuite ai rispettivi Consorzi ferma restando l'omogeneità progettuale;

che per quanto applicabili restano ferme tutte le condizioni di cui alle rispettive Convenzioni di Concessione e successivi atti aggiuntivi ex art. 32 L. 14 maggio 1981 n° 219;

che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 86 legge 27 dicembre 2002 n° 289 giusta presa d'atto del CIPE in data 2 dicembre 2005 è stata stanziata in via preliminare, dalla Regione Campania la somma complessiva di € 2.500.000,00 per la redazione, nell'ambito delle concessioni in essere, della progettazione definitiva ed esecutiva del tratto di completamento della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda;

che il Commissario ad Acta ha provveduto a ripartire gli importi disponibili per la progettazione a favore dei due consorzi concessionari INFR.AV. e INFRA.SUD secondo le percentuali di competenza suddette;



che la progettazione coordinata in forma unitaria è stata trasmessa a tutti gli Enti aventi causa e in particolare al Consiglio Superiore dei LL.PP che ha reso parere favorevole con prescrizioni in data 13 marzo 2009 prot. N° 185 ed all'ufficio V.I.A. della Regione Campania che ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale in data 27 maggio 2009;

che il Commissario, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, provvederà a perfezionare apposito atto aggiuntivo;

che la attuale struttura tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, della quale il Commissario è autorizzato a richiedere supporto, non ha disponibili all'attualità tutti i profili professionali adeguati alla complessità dei lavori e delle attività, comunque previste nell'esecuzione dell'opera pubblica;

che è interesse del Commissario avvalersi, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 dicembre 2008 n°211 e coerentemente alle previsioni di cui all'art. 33 D.Lgs 12 Aprile 2006 n° 163, del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e Molise;

visto l'atto di regolazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n.6/99; nonché i pareri dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Attività Produttive n. 22651 del 12.9.03 e n. 2886 del 13.10.2003;

che nella fattispecie in argomento l'Ufficio del Commissario corrisponde all'Amministrazione aggiudicatrice,

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

- 1) Il Commissario ad Acta affida al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per

la Campania e Molise, in tal senso avvalendosene, le funzioni e le attività connesse con l'esecuzione dei lavori del tratto stradale Lioni Grottaminarda ed in particolare:

- l'attribuzione delle competenze della "Stazione Appaltante" ex art. 33 D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, residuali rispetto all'attività già svolta, da espletare d'intesa con il Commissario;
- l'individuazione del R.U.P (responsabile unico del Procedimento) ai sensi degli artt. 7 ed 8 D.p.r. 554/99;
- la designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81;
- la direzione dei lavori;
- la collaudazione;
- l'assistenza al Commissario nella definizione di tutte le controversie con i Consorzi concessionari;
- l'assistenza nella convocazione delle "Conferenze dei Servizi" che saranno comunque presiedute dal Commissario o da suo delegato finalizzate ad ottenere tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art.81 del DP.R. 616/77 e del DPR. n.383/94 ove non già acquisiti sui progetti ed in generale ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163;

Le nomine di cui ai precedenti commi con particolare riferimento ad eventuali condirettori, potranno essere in ogni caso effettuate dal Commissario ad Acta ove, in ragione delle professionalità esistenti se ne verifichi l'opportunità e la possibilità;

Il Provveditorato interregionale qualora non fossero reperite risorse all'interno dell'ufficio procederà, al fine degli eventuali affidamenti esterni, con le procedure di cui all'art. 90 e 91 D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m. ed i.. In tale ipotesi i corrispettivi per le attività esterne dovranno essere previamente concordati con il Commissario ad Acta.



Restano escluse dalla presente convenzione la designazione e la nomina del coordinatore per la progettazione esecutiva ai sensi del D.lgs. 81/08 che ai sensi dell'art. 8 dalla convenzione originaria compete al committente e per esso al consorzio concessionario di cui all'art. 32 Legge 14 maggio 1981 n° 219, nonché le attività connesse con l'acquisizione dei suoli.

ART. 3

Il Commissario provvederà alle necessarie approvazioni di competenza, al finanziamento e all'erogazione dei fondi per la copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere. L'importo complessivo delle opere sarà definito dal quadro economico del progetto approvato.

Il Commissario si riserva altresì di far fronte agli oneri derivanti dall'attività iniziale di collaborazione e supporto al proprio Ufficio anche, ove possibile, mediante le spese di funzionamento dell'Ufficio stesso di cui al comma 3 dell'art. 86 L. 27 dicembre 2002 n° 289.

Restano escluse comunque tutte le forniture di attrezzature e materiali di consumo.

ART. 4

Il Provveditorato opererà in modo da consentire la perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere nei tempi convenuti, ed in particolare curerà la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa necessari all'erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari incaricati, liquidati dal responsabile del Procedimento, da inoltrare al Commissario ed agli altri eventuali Uffici previsti dalla vigente normativa, per il relativo pagamento da disporre direttamente in favore degli aventi diritto.

A conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di collaudo o regolare esecuzione, verranno trasmessi al Commissario per il formale provvedimento di approvazione e pagamento delle rate di saldo.



Il Commissario si avvarrà della propria struttura per le attività di controllo ed alta sorveglianza e potrà concordare con il Provveditorato tempi e modi di partecipazione eventuale di funzionari del proprio Ufficio alle varie fasi di realizzazione dei lavori.

ART. 5

Lo svolgimento delle attività esercitate dal Provveditorato, derivanti dalla presente Convenzione è da intendersi a titolo oneroso, nei limiti previsti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, a carico del Commissario, con imputazione delle relative spese al finanziamento disponibile.

Nel quadro economico dell'intervento ed in particolare fra le "somme a disposizione della Stazione appaltante", saranno previsti gli importi adeguati per la totalità delle voci e prestazioni di cui all'art. 17 del D.P.R. n.554/99.

Nel citato quadro economico sarà anche prevista la percentuale commisurata a quella stabilita dall'art. 92 D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm. e ii. Sull'importo di convenzione per attività di funzionari che direttamente avranno partecipato all'espletamento degli incarichi.

Per le attività del Provveditorato relative ai sopralluoghi si concorda che saranno rimborsate dal Commissario le spese di missione, previa liquidazione delle stesse da parte del responsabile del procedimento.

Saranno altresì erogate dal Commissario, su liquidazione del Provveditorato le spese eventualmente non coperte da finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sostenute in esecuzione delle attività oggetto di avvalimento nel limite massimo annuo di euro 80.000/00 (euro ottantamila/00).

Ove tali importi risultassero non sufficienti, per le maggiori spese, il Provveditorato avanzerà motivata richiesta di integrazione al Commissario.

Il Commissario potrà provvedere al pagamento di tutte le spese effettivamente sostenute, nei limiti, nei termini e nei modi di cui sopra, direttamente a favore dei

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

creditori, su presentazione di documentazione contabile, liquidata dal Provveditorato.

ART. 6

Il Provveditorato svolgerà l'incarico connesso all'espletamento delle attività formanti oggetto della presente convenzione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di lavori pubblici in quanto applicabili ai sensi dell'art.86 c.2 L 27 dicembre 2002 n° 289 e delle norme Comunitarie.

ART.7

Gli interventi connessi con l'esecuzione delle opere ivi incluse le prestazioni professionali rese ai sensi dell'art.74 c2 del TU. n.76/90, sono esenti da I.V.A.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente Convenzione le parti rinviando, anche in riferimento agli incarichi affidati in esecuzione dell'attività convenzionata, alla seguente normativa:

- legge 14 maggio 1981 n° 219 art. 32;
- D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163
- norme dell'ordinamento amministrativo
- in quanto applicabili, norme di diritto comune.

ART. 9

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva TAR del Lazio, ai sensi degli art. 11 e 15 della legge n.241/90.

ART. 10

Il presente atto sarà registrato fiscalmente solo in caso d'uso ex art.5 — co.11 — del D.P.R. n.131/86. Restano valide le esenzioni e le agevolazioni fiscali, per quanto




applicabili di cui al T.U. n76/90 artt. 70 e 74.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Provveditore alle OO.PP.

(Dott. Donato Carlea)



Il Commissario ad Acta

(Ing. Filippo D'Ambrosio)





STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DELIBERA CIPE 54/2016

CONVENZIONE

TRA

la Regione Campania

nella persona del Responsabile della Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016,
Dott.ssa Maria Somma

E

Il Commissario di Governo ex art.86 Legge 289/02

nella persona dell'Ing. Filippo D'Ambrosio, soggetto beneficiario dell'intervento in epigrafe, con sede in
ROMA, Via Del Giorgione 2/b, di seguito denominato "Soggetto Attuatore"

REGOLANTE l'attuazione degli interventi volti al miglioramento delle rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale, in particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T (Asse Tematico A – Interventi Stradali - Linea d'azione "Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale"), nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n.190, art.1, comma 703 e della delibera CIPE del 10 agosto 2016, n.25, nonché della Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54 - Realizzazione di un collegamento veloce fra l'Autostrada A3 SA-RC (Svincolo Contursi)" e l'autostrada A16 (Svincolo Grottaminarda).



PREMESSO

che l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:

1. l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
2. il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
3. siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;

che l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;

che con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno - Centronord rispettivamente pari all'80% e al 20%;

che, come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture;

che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;

che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);

che all'ambito dell'Asse Tematico A – Interventi Stradali - Linea d'azione "Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale sono stati destinati 5.331,20 milioni di euro;

che con l'Asse Tematico A - Interventi Stradali - si persegue l'obiettivo di sostenere il miglioramento della rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale, in particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T;

che, secondo quanto disposto dal predetto Piano Operativo Infrastrutture, gli interventi finanziati rispondono ai seguenti obiettivi:

1. Siano completamenti di itinerari già programmati; 2. siano interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale, finalizzati a risolvere criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi



urbani, riducendo strozzature e colli di bottiglia; 3. siano interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità delle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio, contribuendo a ridurre l'isolamento di importanti strati della popolazione.

che con nota n. 6160 del 15.06.2017, il MIT, al fine di procedere alla pubblicazione del Piano Operativo in oggetto e dei relativi allegati sul sito web del Ministero, ha trasmesso alla Regione Campania le schede allegare al citato Piano Operativo relative agli interventi stradali ed ai porti a titolarità regionale contenenti fra l'altro l'indicazione del Soggetto Attuatore e l'importo di riferimento, per le verifiche di competenza;

che con note n. 474747 del 10.07.2017 e n. 656189 del 06.10.2017, la Regione Campania ha trasmesso al MIT gli esiti delle citate verifiche;

che, in particolare, relativamente all'Asse Tematico A – Interventi Stradali - Linea d'azione "Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale, risulta assentito, per la Regione Campania, l'intervento di seguito riportato: **Realizzazione di un collegamento veloce fra l'Autostrada A3 SA-RC (Svincolo Contursi)" e L'autostrada A16 (Svincolo Grottaminarda)", con Soggetto Attuatore il Commissario di Governo ex art.86 Legge 289/02, per un valore complessivo di euro 65.000.000,00;**

che l'art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d'intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;

che al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero e la Regione;

che la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione medesima;

che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25 del 14.02.2018 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016", con funzioni di coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azione di cui alla Delibera CIPE 54/2016, in raccordo con la Direzione Generale per la Mobilità;

che con il medesimo Decreto n. 25/2018 è stato individuato il Responsabile pro-tempore della Struttura nella dott.ssa Maria Somma, nonché i responsabili delle Unità dirigenziali tecnica e amministrativa rispettivamente nell'Ing. Maria Teresa Di Mattia e nella dott.ssa Roberta Cavalli;

che la Regione con delibera di Giunta n. 104 del 20.02.2018 ha approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere con il MIT, delegando per la Regione Campania la dott.ssa Maria Somma, in qualità di Responsabile pro tempore della Struttura Tecnica di Missione per "l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016" di cui al DPGRC n. 25 del 14.02.2018;

che in data 19 marzo 2018 si è proceduto alla sottoscrizione della Convenzione e che, come da comunicazione 6277 del 12 giugno della DG per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, la stessa risulta essere stata registrata alla Corte dei Conti;

CONSIDERATO

che il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PO FSC Infrastrutture e Reti 2014/2020 adottato a novembre 2016 definisce le modalità di gestione e le procedure da seguire per garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile nonché la regolarità delle spese sostenute e rendicontate;

che la Regione ha individuato quale Soggetto Attuatore il Commissario di Governo ex art.86 Legge 289/02 per l'intervento di seguito indicato:



"Realizzazione di un collegamento veloce fra l'Autostrada A3 SA-RC (Svincolo Contursi) e l'autostrada A16 (Svincolo Grottaminarda)" per un importo complessivo di euro 65.000.000,00;

che la Convenzione sottoscritta con il MIT disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione medesima;

che l'articolo 12 della citata Convenzione prevede che la Regione si impegni a regolare i rapporti con il Soggetto Attuatore attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento riserva, anche in linea con le disposizioni del Sistema di gestione e controllo che sarà assunto dal Ministero competente per la gestione delle risorse afferenti al FSC 2014/2020;

che si rende necessario dare avvio alle procedure realizzative dell'intervento e che, a tal fine, è necessario convenire le misure organizzative, le direttive e i principi cui dovrà attenersi il soggetto preposto all'attuazione dello stesso, nonché la regolamentazione dei flussi finanziari;

che il Referente del Procedimento della Regione per l'intero piano operativo di investimento è il Dirigente regionale dell'Unità Operativa Dirigenziale "Area Tecnica" della Struttura Tecnica per l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016;

VISTI

la deliberazione del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, recante "Sistema per l'attribuzione del Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP)";

l'art. 1, comma 6 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

l'art. 1, comma 703 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

la delibera CIPE n. 8/2015;

la delibera CIPE n. 54/2016;

la delibera di Giunta Regionale n. 104 del 20 Febbraio 2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1
(Premesse)**

Le Premesse, inclusi i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

**Articolo 2
(Oggetto)**

Oggetto della presente Convenzione è l'attuazione dell'intervento di seguito riportato, previsto nell'ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse Tematico A – Interventi Stradali - Linea d'azione "Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale"):

Intervento	Importo (M€)
"Realizzazione di un collegamento veloce fra l'Autostrada A3 SA-RC (Svincolo Contursi) e l'autostrada A16 (Svincolo Grottaminarda)"	65



Articolo 3 (Finalità)

La presente Convenzione è finalizzata alla definizione delle misure organizzative, delle direttive e dei principi cui dovrà attenersi il Soggetto Attuatore degli interventi, nonché alla regolamentazione dei flussi finanziari.

Articolo 4 (Soggetto Attuatore e suoi obblighi)

1. Il Soggetto Attuatore assume la diretta responsabilità dell'esecuzione dell'opera, che sarà realizzata in aderenza al progetto approvato ed alle eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché negli ulteriori limiti finanziari fissati con la presente Convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore, nello svolgimento dei propri compiti, si impegna a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori pubblici, servizi e/o forniture, le disposizioni normative inerenti ai finanziamenti pubblici, ivi comprese le disposizioni del codice civile, nonché le disposizioni del presente disciplinare.
3. Il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
4. Il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto del cronoprogramma dell'operazione che sarà inserito all'interno del decreto di ammissione a finanziamento, con particolare riferimento alla tempistica per l'aggiudicazione delle gare di appalto.
5. In occasione della richiesta di erogazione delle rate successive alla prima anticipazione, il Soggetto Attuatore trasmette al Referente del Procedimento della Regione la rendicontazione di spesa, corredata dalla documentazione giustificativa di ogni somma già liquidata (ad esempio, fatture quietanzate, SAL, ecc.).
6. Al fine di accedere all'erogazione delle risorse secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, fatta eccezione per la prima anticipazione, il Soggetto Attuatore si obbliga al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema informativo regionale alle scadenze bimestrali previste, nonché al rispetto delle norme sulla pubblicità, come di seguito riportate.
7. Il Soggetto Attuatore è tenuto a consentire l'accesso ai cantieri in qualsiasi momento alle strutture competenti della Regione e della Direzione Generale per Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.
8. Il Soggetto Attuatore è tenuto a informare il pubblico circa il finanziamento dell'intervento mediante risorse del Piano Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria - Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020. A tal fine, provvede all'esposizione di cartelloni fissi e targhe esplicative permanenti, conformi ai requisiti riportati all'articolo 15 della presente Convenzione. Le spese sostenute per dare attuazione al presente obbligo gravano sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto finanziato.

Articolo 5 (Nomina Responsabile dell'Intervento e avvio delle fasi progettuali)

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore trasmette, alla Struttura Tecnica per l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016, l'atto di nomina del Responsabile dell'Intervento, corrispondente con il soggetto già individuato come "Responsabile unico del procedimento" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



2. Il Responsabile dell'Intervento (indicato specificamente nella scheda d'intervento) assume tutti gli obblighi e gli impegni in capo al Soggetto Attuatore ai fini dell'attuazione dell'intervento e, ad integrazione delle funzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, svolge i seguenti compiti:
- pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei quadri economici e finanziari, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti segnalando tempestivamente al Referente del Procedimento della Regione gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico/ amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - dota ogni intervento di un CUP e ne fornisce comunicazione al Referente del Procedimento della Regione;
 - aggiorna, con cadenza bimestrale i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, mediante l'alimentazione del sistema informatizzato, assumendo la veridicità delle informazioni conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto attuatore. In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà corrispondere a ogni eventuale richiesta dell'Amministrazione regionale in materia di monitoraggio;
 - elabora, a richiesta del Referente del Procedimento della Regione, o nel corso di procedimenti di verifica, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
 - assicura, nelle procedure di affidamento e nell'attuazione dell'intervento, il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e pubblicità, pari opportunità, di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari e rispetto delle regole di concorrenza;
 - rispetta gli obblighi e gli adempimenti previsti nella presente convenzione e negli altri documenti regionali che disciplinano l'attuazione del FSC;
 - attesta le spese eleggibili, sostenute e liquidate nel periodo di riferimento;
 - istituisce e conserva il fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnico-amministrativo-contabile in originale afferente all'intervento finanziato, da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli disposti dall'Amministrazione regionale e dagli altri soggetti incaricati, da conservare fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma;
 - informa il pubblico circa il finanziamento a carico del FSC mediante l'esposizione di cartelloni e targhe esplicative permanenti.

Articolo 6 (Obblighi della Regione Campania)

1. La Regione Campania, nella persona del Referente del Procedimento della Regione, oltre a provvedere all'ammissione a finanziamento dell'intervento secondo i principi contenuti nella presente Convenzione e alla liquidazione delle somme occorrenti alla realizzazione dell'intervento secondo le modalità di cui al seguente articolo 10, provvede a:



- rideterminare, in sede di rendicontazione finale, l'importo del finanziamento riducendolo delle economie realizzatesi nelle varie fasi procedurali e/o dell'utilizzo solo parziale dell'accantonamento del 10%, nonché delle eventuali sanzioni e/o rettifiche finanziarie comminate al soggetto attuatore;
- determinare, nel caso di interventi cofinanziati con risorse a carico di soggetti terzi (soggetti attuatori e/o soggetti esecutori) o con risorse diverse dal FSC, la suddivisione delle economie conseguite tra Regione e i soggetti terzi o tra le diverse fonti di finanziamento, sulla base del rapporto percentuale del cofinanziamento stesso;
- accertare, nell'ambito delle procedure di competenza, eventuali irregolarità e ad attivare, se del caso, le dovute procedure per il recupero delle risorse indebitamente erogate.

Articolo 7

(Ammissione a finanziamento provvisoria)

1. Al fine di accedere all'ammissione provvisoria del finanziamento, il Soggetto Attuatore dovrà trasmettere al Referente del Procedimento della Regione la seguente documentazione:
 - provvedimento di approvazione del progetto esecutivo munito di apposita verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 o equivalente secondo le disposizioni applicabili in materia di opere pubbliche e servizi;
 - relazione tecnica contenente il quadro economico dell'intervento, la descrizione dell'intervento, l'individuazione dell'area su cui è localizzato l'intervento, cronoprogramma fisico e finanziario, nonché esaustive informazioni circa le modalità e i costi della gestione ed in ordine alla sostenibilità e alle fonti preventivate per la copertura dei relativi oneri finanziari;
 - comunicazione del CUP attribuito all'intervento;
 - dichiarazione resa dal progettista e sottoscritta dal RUP e dal legale rappresentante -del Soggetto Attuatore, attestante che il progetto esecutivo, o equivalente secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e servizi:
 - a. è stato redatto in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
 - b. è dotato di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche;
 - c. è immediatamente cantierabile;
 - comunicazione del codice IBAN del conto corrente dedicato, (anche in via non esclusiva) presso cui accreditare le somme liquidate al Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento;
 - in caso di cofinanziamento, copia del provvedimento con il quale il Soggetto Attuatore ha provveduto ad impegnare la quota parte di finanziamento a proprio carico;
2. Il Referente del Procedimento della Regione, acquisita la documentazione di cui al precedente comma 1 e verificato che il quadro economico dell'intervento sia conforme ai principi dettati nella presente Convenzione, procede all'assegnazione provvisoria del finanziamento, con contestuale impegno delle risorse. L'impegno contabile è assunto coerentemente alle previsioni del cronoprogramma finanziario dell'intervento.
3. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non disponga ancora di un progetto esecutivo già cantierabile o equivalente secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e servizi e non sia in grado di anticipare, con proprie risorse, le spese di progettazione all'uopo necessarie, l'ammissione a finanziamento dell'intervento può avvenire previa presentazione da parte del Soggetto Attuatore della seguente documentazione:



- dichiarazione, a firma del RUP e del legale rappresentante- attestante l'impossibilità da parte -del Soggetto Attuatore di far fronte in via anticipata, con risorse proprie, ai costi relativi all'intervento;
- quadro economico dell'intervento, redatto ai sensi della vigente normativa in materia e in linea con la disciplina del FSC, debitamente approvato dal Soggetto Attuatore;
- cronoprogramma procedurale di spesa, con evidenza delle singole fasi di attività previste (ad esempio: progettazione; avvio lavori/ servizi/ forniture, ecc.), da cui si evinca la coerenza con il termine previsto dalle delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016 per il conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante.

Decorso inutilmente tale termine, le risorse assegnate all'intervento saranno automaticamente revocate e le risorse già liquidate saranno oggetto di recupero;

4. Il Referente del Procedimento della Regione, acquisita la documentazione di cui al precedente comma 3 e verificato che il quadro economico dell'intervento sia conforme ai principi dettati nella presente Convenzione, procede all'assegnazione provvisoria del finanziamento, con contestuale impegno delle risorse assunto coerentemente alle previsioni del cronoprogramma finanziario dell'intervento e liquidazione di un'anticipazione nella misura massima del 10% dell'importo dell'intervento ammesso a finanziamento, modulata sulla base di espressa e comprovata richiesta da parte del Soggetto attuatore.
5. I pagamenti saranno effettuati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurate in costo realizzato) dal Soggetto attuatore sulla base dell'avanzamento dei lavori, sino al 95% dell'importo assegnato come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio.
6. Il saldo, pari al 5% dell'importo assegnato, ad avvenuta approvazione del collaudo finale e a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese secondo le modalità di cui all'art. 10 che segue.

Articolo 8

(Ammissione definitiva al finanziamento)

1. Al fine di accedere all'ammissione definitiva del finanziamento, il Soggetto Attuatore trasmette al Referente del Procedimento della Regione il provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori, che dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine del 31 dicembre 2021 stabilito dalla delibera CIPE n. 26/2018, contenente il quadro economico post gara rimodulato secondo le indicazioni fornite nella presente Convenzione.
2. Il Referente del Procedimento della Regione, acquisito il provvedimento di aggiudicazione dei lavori, e verificato che:
 - a. l'aggiudicazione sia stata assunta inderogabilmente entro il termine del 31.12.2021 stabilito dalla delibera CIPE n. 26/2018;
 - b. il quadro economico rimodulato a seguito della gara sia conforme alle indicazioni fornite nella presente Convenzione;

provvede, con apposito decreto dirigenziale, alla determinazione dell'importo necessario per la realizzazione dell'intervento ed all'assegnazione definitiva del finanziamento col contestuale eventuale disimpegno dell'economie realizzate.

Articolo 9

(Spese Ammissibili)

1. Ai sensi della lettera i) della delibera CIPE n. 25/2016, sono considerate ammissibili a valere sul FSC le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 e che:



- siano assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
 - siano temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
 - siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
 - siano pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
2. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali tipologie di spese ammissibili e i loro limiti di rendicontazione a valere sulle risorse del FSC:

- Lavori, forniture e servizi, ai sensi delle disposizioni di legge in materia;
 - Espropriazioni;
 - Spese generali. L'aliquota del finanziamento da destinarsi a spese generali (spese tecniche e di gara, consulenze, etc.) non potrà superare il 10% del costo dell'intervento medesimo, con esclusione dell'aliquota per IVA. Nelle spese è incluso l'eventuale onere per la gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento da parte del Soggetto attuatore.
 - IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge; il Responsabile dell'Intervento, a tal proposito, è tenuto a presentare apposita dichiarazione attestante che l'aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa vigente e non è recuperabile dal Soggetto Attuatore;
 - Imprevisti. La voce "imprevisti" inserita nel quadro economico di progetto può essere utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 o in alternativa delle disposizioni di legge applicabili all'intervento, previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al Referente del Procedimento della Regione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, dell'aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il q.e.;
 - Accantonamenti. Le economie realizzate in sede di gara possono essere accantonate in una percentuale non eccedente il 10% dell'importo di aggiudicazione. Tale quota va ad integrare il quadro economico del progetto post - gara e deve essere riportata in un'apposita voce del quadro economico rimodulato. La posta per accantonamento del quadro economico non può essere utilizzata per modifiche contrattuali nel caso in cui per le stesse il Soggetto Attuatore abbia già fatto ricorso alla voce "Imprevisti". La voce di spesa "Accantonamenti" può, invece, essere utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché per opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera principale e che vengano affidate attraverso nuova procedura di gara, previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al Referente del Procedimento della Regione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, dell'aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il q.e.
3. Ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo finanziato, per qualsiasi motivo determinata, resterà a carico del Soggetto Attuatore, che provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente il limite del finanziamento regionale determinato con il decreto di assegnazione definitiva, possa gravare sulla Regione.



Articolo 10 (Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Le risorse assegnate in via definitiva all'intervento saranno erogate in relazione all'avanzamento dello stesso sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, applicando la quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista, con le seguenti modalità:
 - Anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato all'intervento in parola a seguito dell'approvazione e sottoscrizione della presente Convenzione da parte del Soggetto Attuatore e della Regione;
 - Ogni qualvolta il Soggetto Attuatore avrà conseguito spese effettivamente sostenute comprovante un avanzamento pari al 5% dell'importo assegnato sarà possibile inoltrare al Referente del Procedimento della Regione la richiesta di liquidazione accompagnata dalle fatture quietanzate come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio e nel rispetto delle procedure previste nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n.1/2017;
 - I pagamenti intermedi verranno effettuati, per quote non inferiori al 5% dell'importo assegnato, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurate in costo realizzato) dal Soggetto Attuatore sulla base dell'avanzamento dei lavori, sino al 85% dell'importo assegnato come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio.
 - Il saldo del finanziamento, pari al 5%, è erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale e a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese.
 - A tal fine, il Soggetto Attuatore trasmette al Referente del Procedimento della Regione la certificazione finale delle spese sostenute e da sostenere, corredata dalla documentazione contabile inerente all'intero importo dell'intervento, con l'espresso impegno a rendicontare le residue spese sostenute entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento dell'ultima rata attraverso la presentazione delle quietanze di pagamento.

Articolo 11 (Rinuncia e rimodulazione)

1. Il Soggetto Attuatore può rinunciare, in tutto o in parte, al finanziamento o chiederne una rimodulazione. In tal caso, il Referente del Procedimento della Regione, espletata la propria istruttoria, informa il RUA che sottopone la proposta di rimodulazione all'Autorità di Gestione del FSC Campania per i successivi adempimenti secondo le procedure stabilite dal CIPE con la deliberazione n. 25/2016.
2. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, l'intervento finanziato non sia realizzabile così come comunicato in sede di istruttoria dal Soggetto Attuatore, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi contenute nella delibera CIPE n. 25/2016.

Articolo 12 (Verifiche e controlli)

1. La Regione Campania si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, secondo le modalità e le procedure da questa definite nell'apposita manualistica, verifiche e controlli sullo stato di attuazione degli interventi, sull'avanzamento fisico e finanziario, sul rispetto dei tempi di esecuzione e le eventuali modifiche apportate.
2. Il Referente del Procedimento della Regione effettua, attraverso il personale all'uopo preposto, i controlli di I livello (verifiche di avanzamento fisico e finanziario). Nell'ambito dei controlli di I livello



possono, inoltre, essere disposte verifiche in loco su operazioni individuate su base campionaria ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co.

3. Per gli interventi per i quali, all'esito delle verifiche e dell'eventuale follow up, si accerti l'impossibilità dell'avvio o della prosecuzione delle procedure di attuazione nei tempi definiti dal cronoprogramma, il Referente del Procedimento della Regione potrà attivare le procedure per la revoca, con il conseguente recupero delle eventuali risorse versate.

Articolo 13 (Revoca del finanziamento)

1. Il Referente del Procedimento della Regione, previa diffida, si riserva il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto Attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui alla presente Convenzione, a leggi, a regolamenti e a disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.
2. In presenza di elementi di fatto o di diritto che possono dar luogo alla revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Referente del Procedimento della Regione comunica al Soggetto Attuatore l'avvio del procedimento, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione, entro il quale il Soggetto Attuatore può presentare memorie scritte ed ogni altra eventuale documentazione.
3. Esaminate le risultanze istruttorie, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno dato origine al procedimento, il Referente del Procedimento della Regione adotta il provvedimento di archiviazione. In caso contrario, con provvedimento motivato, può disporre la revoca totale o parziale, a seconda della gravità del caso, del finanziamento, dandone comunicazione al Soggetto Attuatore e al RUA.
4. Il provvedimento di revoca contiene la definizione dei rapporti tra la Regione Campania ed il Soggetto Attuatore anche in relazione alle risorse già erogate. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Regione Campania all'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti dei soggetti a cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati.

Articolo 14 (Monitoraggio)

1. Il monitoraggio dell'intervento è svolto mediante il sistema di monitoraggio indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020.
2. L'aggiornamento delle informazioni avviene con cadenza bimestrale: 28/02, 30/04, 30/06, 31/08, 31/10 e 31/12 di ciascun anno.
3. Entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di monitoraggio, il Responsabile dell'Intervento si impegna ad aggiornare le informazioni presenti nel sistema di monitoraggio ed a trasmettere al Referente del Procedimento della Regione la scheda/ intervento scaricata dal menzionato sistema accompagnata da ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e da una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.
4. Il rispetto degli obblighi di monitoraggio è condizione necessaria per accedere alle rate di liquidazione esposte all'art. 10 della presente convenzione.

Articolo 15 (Modalità di informazione e pubblicità)

1. Nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione progetti di investimento infrastrutturali finanziati dal FSC devono essere installati cartelloni fissi comprendenti uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione finanziaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Regione Campania. Le



dimensioni dei cartelloni fissi in loco devono essere commisurate all'importanza della realizzazione e adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere. Lo spazio riservato alla partecipazione finanziaria della Regione Campania deve rispettare i seguenti criteri:

- recare lo stemma della Regione Campania e il testo sotto riportato, disposti come segue:



Figura "Esempio di spazio informativo"

- la dicitura rappresentata nella su esposta figura deve occupare almeno il 30% della superficie totale del cartellone;
- i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria della Regione Campania devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa;
- possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato l'intervento;
- eventuali altri loghi verranno collocati in successione;
- a seguire sarà riportato il testo legale previsto dalla cartellonistica di cantiere;
- i cartelloni dovranno essere rimossi alla fine dei lavori e sostituiti, entro e non oltre sei mesi, da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al seguente punto;
- le targhe esplicative permanenti devono contenere le stesse indicazioni di cui alla figura su esposta. Possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato l'intervento. In tale caso potranno essere riportati in successione eventuali altri loghi.
- le spese sostenute per dare attuazione al presente provvedimento graveranno sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto finanziato.

Articolo 16

(Clausola di sicurezza e legalità)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze dell'Ordine o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti e nei confronti degli eventuali componenti la compagine sociale e familiare e di dare comunicazione dell'avvenuta denuncia alla Prefettura per l'attivazione delle conseguenti iniziative.
2. Il Soggetto Attuatore dichiara di accettare la clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, nonché in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, sicurezza e tutela dei lavoratori.
3. Il Soggetto Attuatore si impegna, inoltre, ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, informando la Prefettura competente nel caso di inadempimento in merito da parte di eventuali subcontraenti.
4. Il Soggetto Attuatore si impegna a far sottoscrivere gli stessi suddetti impegni a tutti i subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto, inserendo tali clausole nei rispettivi subcontratti.



Articolo 17 (Durata)

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e cessa con il completamento dell'intervento.

Articolo 18 (Risoluzione della Convenzione)

In caso di mancato rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità di attuazione dell'intervento e/o degli obblighi previsti dalla presente Convenzione imputabili al Soggetto Attuatore, la Regione Campania si riserva la facoltà di risolvere la medesima Convenzione.

Articolo 19 (Controversie)

1. In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, è competente il foro di Napoli.

Articolo 20 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.
2. Le parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, di aver comunicato tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, ivi comprese quelle relative al nominativo del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali, ai diritti di cui all'art. 7 del decreto medesimo ed alle modalità di esercizio di detti diritti.

Articolo 21 (Conservazione documentale)

La presente Convenzione è redatta in duplice originale dei quali uno viene conservato dal Referente del Procedimento della Regione e uno conservato dal Soggetto Attuatore.

Articolo 22 (Altre disposizioni)

Per tutto ciò che non è regolato dalla presente Convenzione si fa riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia, nonché alla Convenzione sottoscritta in data 19 marzo 2018 tra il



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e il Commissario di Governo ex art. 86 L. 289/02.

Letto confermato e sottoscritto

Napoli, li _____

Rappresentante del Beneficiario

Ing. Filippo D'Ambrosio

Responsabile della Struttura Tecnica

Dott.ssa Maria Somma

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, Codice Civile, espressamente approvano e sottoscrivono gli articoli numeri 10, 11, 12, 13, 18 e 19 della presente Convenzione.

Napoli, li _____

Rappresentante del Beneficiario

Ing. Filippo D'Ambrosio

Responsabile della Struttura Tecnica

Dott.ssa Maria Somma

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2018-12-27 12:49:40 (UTC)****File verificato: C:\Users\donatella.fraschetti\Desktop\Commissario\Convenzione con firma digitale\convenzione Regione Campania-Commissario ad Acta.pdf.p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: D'AMBROSIO FILIPPO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 27/12/2018 12:00:19

Dati del certificato del firmatario D'AMBROSIO FILIPPO:

Nome, Cognome: FILIPPO D'AMBROSIO
Titolo: COMMISSARIO AD ACTA
Organizzazione: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO/80230390587
Numero identificativo: 15135995
Data di scadenza: 13/01/2019 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: SOMMA MARIA
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 27/12/2018 04:06:44

Dati del certificato del firmatario SOMMA MARIA:

Nome, Cognome: MARIA SOMMA
Titolo: Dirigente
Organizzazione: regione campania/03516070632
Numero identificativo: RC9834333
Data di scadenza: 17/04/2020 09:21:48
Autorita' di certificazione:

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale**

Qualified Certification Service Provider,

, IT

Documentazione del
certificato (CPS):https://portal.actalis.it/Info/CPS/Regione_Campania

Identificativo del CPS:

OID 1.3.159.6.4.1

Note di utilizzo del
certificato:la presente firma digitale ed il certificato ad essa collegato hanno validita
solo per gli atti della Regione Campania**Fine rapporto di verifica**

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta - art. 86 L. 289/02

MiSE - Viale America, 201 - 00144 R O M A

Tel. 0654927818 - fax 0654927828

filippo.dambrosio@mise.gov.it - commissarioadacta@pec.mise.gov.it

VIABILITA' LIONI-GROTTAMINARDA

Promemoria circa tipologia adempimenti più urgenti e informazioni di indirizzo

- Con riferimento alle autorizzazioni sismiche andrà comunicato ai rispettivi Geni Civili il nominativo del funzionario subentrato negli impegni di legge assunti dal sottoscritto.
- Con riferimento alle autorizzazioni idrauliche andrà comunicato l'avvenuto subentro al sottoscritto ai Geni Civili competenti. Si sottolinea che gli oneri relativi, di norma da pagare in soluzioni annuali, restano per contratto a carico dei Concessionari fino ad approvazione del collaudo in qualità di delegati al perfezionamento delle pratiche, ma l'Amministrazione Concedente deve in tal senso vigilare.
- Il soggetto fisico in rappresentanza dell'Amministrazione subentrata al cessato Commissariato dovrà perfezionare le Convenzioni in corso con i Comuni di Gesualdo e di Grottaminarda (v. All. 5), le cui bozze sono state da tempo predisposte e trasmesse dal sottoscritto sulla falsariga di quelle già definite per Frigento e Villamaina.
- Si riporta altresì l'elenco delle convenzioni sottoscritte con ENEL.
- Le modalità e le procedure per il tiraggio finanziario in relazione ai vari lotti e stralci sono ampiamente collaudate ed uniformate, ma occorre tempestività nelle richieste rispettivamente al MIT e alla Regione Campania. Anticipazione e rate sono pure regolate da analoghi criteri omogenei riportati nei singoli accordi programmatici, Convenzioni ecc. di cui andrà preso immediato atto.
- Al fine di poter fornire eventuali contributi va seguito il monitoraggio, di competenza RUP (attualmente delegato dallo stesso a funzionario del Provveditorato avvalso).
- Dal coacervo delle ultime Relazioni al Parlamento e delle relazioni bimestrali al MiSE, contenenti tutte le notizie più significative, possono essere desunti tutti i termini di organizzazione e competenze dell'Ufficio Commissariale.
- La vastità e diversità delle materie trattate consiglierebbe a giudizio di chi scrive l'individuazione di più soggetti trasferitari, dove però la viabilità Lioni - Grottaminarda. Stanti le sue peculiari caratteristiche (Concessione di Committenza, particolari condizioni contrattuali, organizzazione funzionale ecc.) rappresenta in effetti pacchetto autonomo ed organico separabile dal resto e trasferibile in blocco ad un unico gestore.

- Gli archivi sono ordinati ed in relazione alla notevole mole ed esigenza di spazi adeguati sono distribuiti organicamente tra più sedi.
Se i progetti ed i documenti di contabilità dei lavori sono presso la Direzione dei lavori in Grottaminarda (AV) ed ovviamente presso il Concessionario, per le parti essenziali sono anche presso la sede MiSE di Salerno, il RUP ed il Provveditorato OO.PP. sede di Napoli.
Le documentazioni amministrative, di liquidazione e pagamento (migliaia di unità) sono presso la sede Commissariale di Roma così come gli originali – registrati ove necessario – dei contratti (molte decine), i pareri giuridici (varie decine), le Relazioni (oltre 100 comprese quelle alla Corte dei Conti), tutta la corrispondenza (oltre 33000 unità), i Decreti Commissariali (oltre 2000), i registri di protocollo ed i relativi archivi (circa 200 contenitori).
I medesimi documenti completi di allegati, limitati alle questioni di diretto interesse operativo, sono anche presso la sede MiSE di Salerno.
- Le documentazioni a corredo delle richieste di subappalti ecc., così come i relativi riscontri, sono presso la sede dei Provveditorato di Napoli.
Anche le richieste antimafia che questo Ufficio dispone comunque con cadenza annuale per verifica periodica sono presso il medesimo Provveditorato.
- Oltre al Protocollo di Legalità, ogni contratto è accompagnato da specifico Patto di Integrità.
- Ulteriori verifiche dei DURC e dichiarazioni su quietanze dei subappaltatori, così come verifiche ex Equitalia, vengono effettuate dall'Ufficio prima dei pagamenti e allegate agli stessi, e sono reperibili agli atti.
- La tracciabilità delle erogazioni (flussi finanziari), i piani operativi di sicurezza, gli ingressi dei trasportatori in cantiere, i mezzi ivi di volta in volta presenti giusta anche Patto di Integrità vengono documentati, informandone tutti i soggetti aventi in qualche modo causa nella gestione dei lavori.
Tali documentazioni sono reperibili complete in più siti, a disposizione dei controlli Interforze, DIA ecc.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Filippo D'Ambrosio)



Elenco Allegati:

1. Brochure
2. Tabelle economico-finanziarie generali
3. Autorizzazioni sismiche
4. Autorizzazioni idrauliche
5. Elenco Convenzioni con Comuni, Enti, Amministrazioni varie
6. Elenco Convenzioni e atti aggiuntivi con Concessionari
7. Elenco interferenze
8. Memo contenziosi espropriativi
9. Elenco subappalti
10. Schede "generali" contratti e stralci
11. Situazione pagamenti SAL e SAE
12. Convenzione con Regione Campania relativa a Del. CIPE 54/16 (v. Relazione generale)




Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

Ministero dello Sviluppo Economico,
Ministero delle Infrastrutture

Regione Campania

S.S.V. LIONI – GROTTAMINARDA

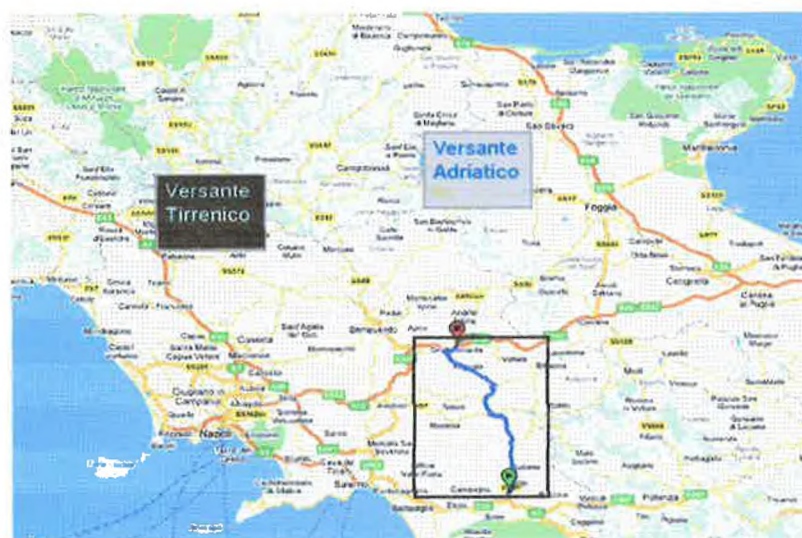

18 dicembre 2018



Il Commissario ad Acta art. 86 L. 289/02

STRADA A S.V. LIONI – GROTAMINARDA PER IL COLLEGAMENTO
DELL'AUTOSTRADA A3 SA – RC (Svincolo di Contursi) CON
L'AUTOSTRADA A16 NA – BA (Svincolo di Grottaminarda)

Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario ad Acta ex Art.86 L. 289/02 – Ministero dello Sviluppo Economico

Importo Progetto: 430 ML €

1. Descrizione e obiettivi dell'infrastruttura Lioni – Grottaminarda (euro 430 milioni)

L'infrastruttura viaria Lioni Grottaminarda costituisce il completamento del collegamento, già in parte realizzato, tra la A16 Napoli - Bari e la A3 Salerno - Reggio Calabria e fa parte dell'itinerario più ampio Agropoli – Contursi – Grottaminarda - Termoli, che parte da Contursi Terme raggiungendo Lioni con la SS 691, nota anche come strada a scorrimento veloce Fondo Valle del Sele, prosegue fino a Grottaminarda (Strada a S.V. Lioni-Grottaminarda) e tramite la variante alla SS90, può svilupparsi fino a collegare il basso Tirreno con l'Adriatico fino a Termoli.

Detta infrastruttura viaria, finanziata solo a partire dall'anno 2013 per un primo stralcio, rientrava negli schemi territoriali post terremoto Irpinia, ma mai era stata ricompresa nei relativi programmi realizzativi.

Nell' area sono stati invece realizzati, nell'ambito dell' ampio programma di sviluppo finanziato dalla legge 219/81, fin dalla metà degli anni ottanta, diversi nuclei e poli industriali:

- Flumeri;
- Grottaminarda;
- Sturno;
- S. Angelo dei Lombardi;
- Lioni;
- Nusco;
- Colliano;
- Oliveto Citra;
- Contursi;
- Valle Ufita
- Camporeale (Ariano Irpino);
- Centro ortofrutticolo della Comunità Montana Valle Ufita (località Ometa).

È inoltre in previsione la Stazione Comprensoriale "Ariano 2" ovvero l'unica fermata in Irpinia della tratta Caserta -Bari con annesso interporto per scalo merci (località Fiumarelle)


Pertanto il completamento dell'itinerario Contursi (A3) – Grottaminarda (A16) attraverso la realizzazione dei 20 km d'asse della **Lioni – Grottaminarda**, consentirà di connettere tutte le aree industriali della zona tra di loro e con le principali direttrici autostradali A16 e A3 verso il nord e verso i porti di Napoli ,Salerno, Bari e Gioia Tauro e gli scali ferroviari ed intermodali.

In larga scala, l'intervento in esame costituisce la possibilità di realizzare un sistema infrastrutturale maggiormente interconnesso e gerarchizzato, attraverso il quale potenziare uno schema di collegamenti a "rete" auspicato dal Piano Generale dei Trasporti; consentirà, infatti, di inserire le aree interne dell'Irpinia negli itinerari nazionali di comunicazione e nel sistema logistico nazionale, anche grazie al collegamento dell'arteria con la stazione Irpinia della futura linea ferroviaria ad **alta capacità Napoli - Bari** e con il terminal bus dell'**Air a Grottaminarda**.

Infine rappresenterà una importante via di fuga ovvero di rapido soccorso in caso di calamità ed una certezza in termini di sicurezza e di tempi di percorribilità.


Finalità dell'intervento:

- Collegamento Lioni (S. Angelo dei Lombardi) con Grottaminarda in provincia di Avellino, assolvendo alla funzione di completare l'asse Contursi - Grottaminarda previsto nello schema viario a livello territoriale interregionale ed in buona parte già realizzato (tratto Contursi –Lioni - S. Angelo dei Lombardi).
- Realizzare il collegamento tra le autostrade A16 (Napoli - Canosa) ed A3 (Salerno - Reggio Calabria)
- Prospettive di prosecuzione dell'itinerario verso sud-ovest fino ad Agropoli e verso nord-est fino a Termoli (A14).

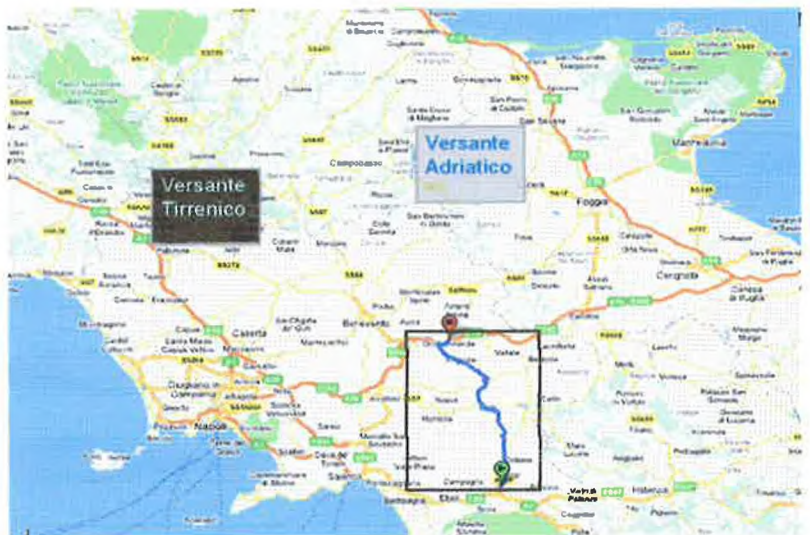

Criticità del sistema viario attuale:

- Inadeguato a realizzare un collegamento di livello interregionale A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli).
- Non connette la rete locale con quella regionale.
- Non è idoneo a soddisfare le caratteristiche della domanda di traffico civile e commerciale attuale e futura.
- Non garantisce sufficiente accessibilità al territorio, alle concentrazioni produttive, ai bacini di manodopera.
- Non è dotato dei necessari ed omogenei livelli di sicurezza.

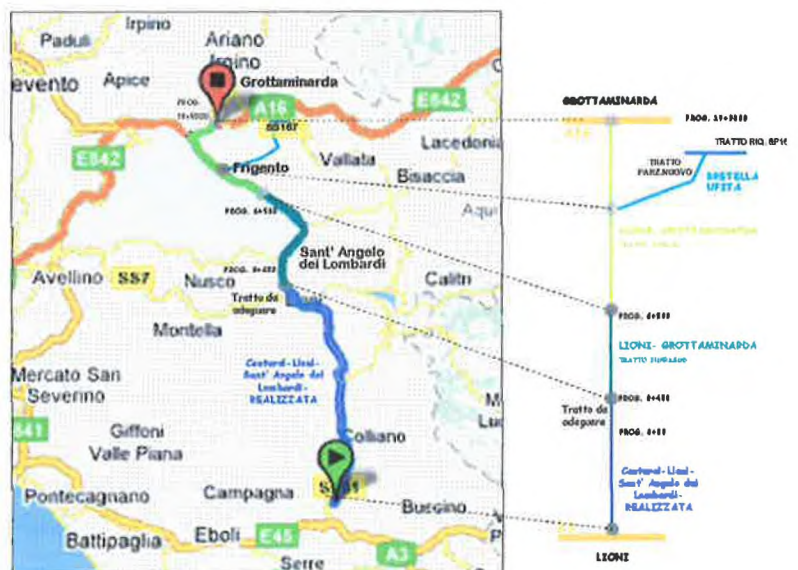

Vantaggi apportati dall'intervento:

- Favorire lo sviluppo degli insediamenti produttivi presenti nell'area attraverso il collegamento tra di loro e con le direttrici autostradali ed i principali porti del sud Italia
- Conferire maggiore accessibilità ai comuni ed alle attività locali:
 - 14 comuni serviti
 - ≈ 50.000 abitanti
 - 3 Sistemi locali del lavoro
 - 3700 spostamenti generati
 - 3800 spostamenti attratti
- Migliorare l'accessibilità con la valle Ufita
- Ridurre le distanze e i tempi di percorrenza:
- Incrementare l'accessibilità per il territorio interno della provincia di Avellino
- Adeguare i livelli di sicurezza
- Integrare con una ulteriore tratta il previsto corridoio Tirreno - Adriatico


Descrizione sintetica

Al di là delle prospettive di prosecuzione dell'itinerario verso Sud-Ovest fino ad Agropoli e verso Nord-Est fino a Termoli (A14), la nuova infrastruttura consentirà nell'immediato la interconnessione dei diversi insediamenti industriali della zona ed un più agevole collegamento tra queste e le Autostrade A16 (Napoli – Canosa) ed A3 (Salerno – Reggio Calabria), oltre che un generale miglioramento della situazione trasportistica dell'area.

L'opera stradale è localizzata nella Regione Campania, interamente nel territorio della provincia di Avellino; i territori comunali direttamente interessati sono S. Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Villamaina, Frigento, Gesualdo e Grottoamminarda.

L'intero tracciato di lunghezza circa 19.5 km (al netto degli svincoli) è previsto in nuova sede, e insiste sostanzialmente su territori destinati a "zona agricola" nelle previsioni degli strumenti di pianificazione comunali.

La fascia di intervento interessata dall'itinerario non contiene aree edificate, salvo le poche presenze marginali che sono di modesta entità anche nella zona urbana di Grottoamminarda a maggiore consistenza insediativa.

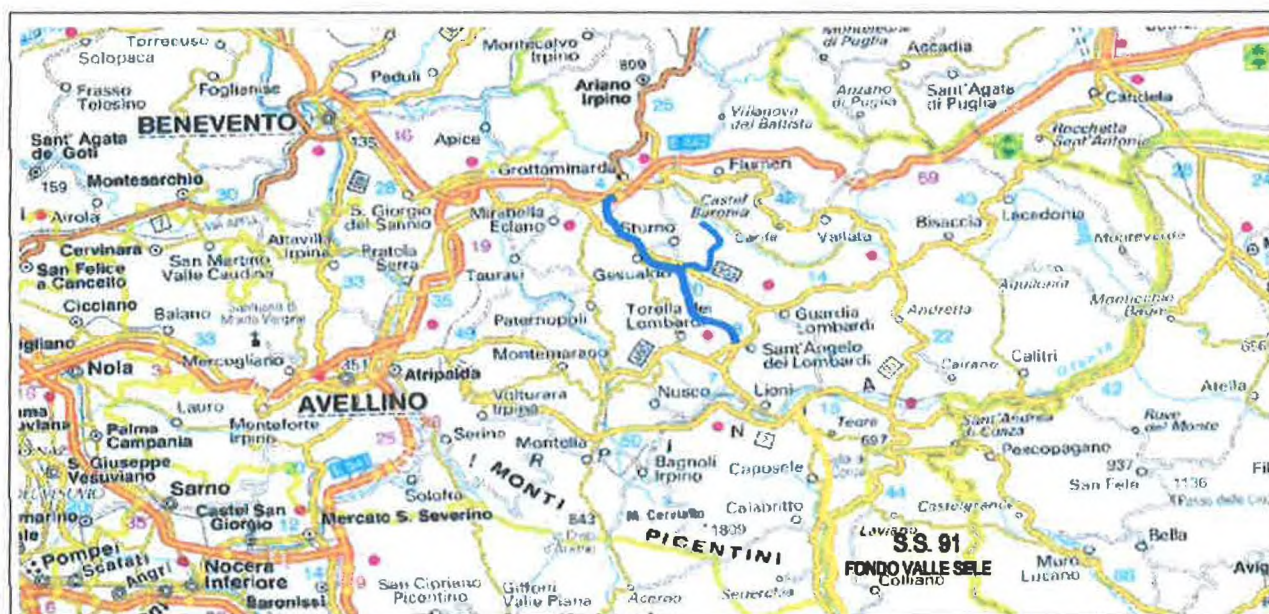

L'infrastruttura in esame è prossima ad alcune aree SIC appartenenti al Parco Regionale dei Monti Picentini, ma non le attraversa.

Dal punto di vista del vincolo archeologico la strada attraversa territori che, se pur ricadenti in comprensorio di certo interesse archeologico, non presentano emergenze di rilievo: il corridoio stradale non tocca aree vincolate né sedi di prevedibili rinvenimenti di significativa importanza.

Per quanto riguarda il rischio frana, gli studi di settore hanno evidenziato le tratte ricadenti in ambiti di attenzione e per essi sono state dimensionate "opere di risanamento e/o sostegno" compatibili con l'ambiente circostante.


Notevoli sono gli interventi al contorno, con particolare riferimento alle sistemazioni idrauliche.

Caratteristiche tecniche:

• Sezione	tipo C1 D.M. 05/11/2001	
• Intervallo velocità di progetto	60 - 100 Km/h	
• Pendenza longitudinale (corsia di arrampicamento)	max. 4,85 %	max. 6,09% tra km 17+940 e 19+050
• Lunghezza max dei rettilinei	940 m	
• Raggio di curvatura planimetrico minimo:	620 m	
• Raggio di curvatura altimetrico minimo:	10.000 m	
• Sviluppo complessivo del tracciato	19.980 m	
• N. 17 gallerie artificiali	1818.30 m	
• N. 3 gallerie naturali	3265 m	
• N. 16 Viadotti	4357 m	
• N. 6 Sottovia scatolari		
• N. 24 Tombini		
• Tratti in trincea 20% sviluppo complessivo		
• Tratti in rilevato 30% sviluppo complessivo		
• Svincoli previsti (*)	5 :	

- S. Angelo dei Lombardi;
- Villamaina - Terme di San Teodoro;
- Frigento;
- Gesualdo;
- di collegamento con la Variante alla S.S. 90

(*) Oltre all'innesto finale in rotatoria sulla SP 36 in prossimità del casello autostradale di Grottaminarda della A16 Napoli - Bari

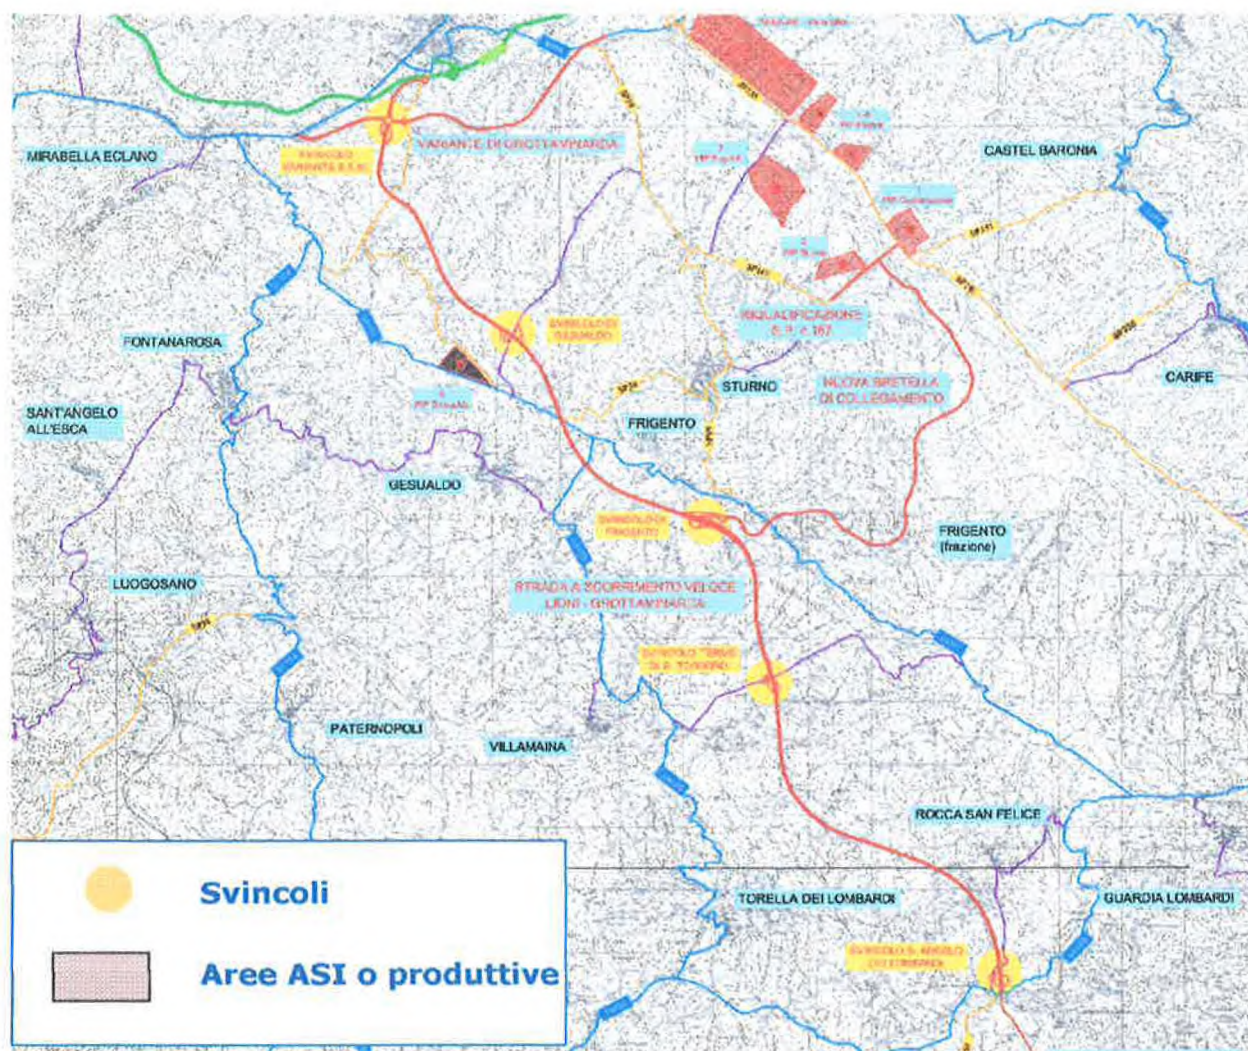

Dall'inquadratura funzionale, per la strada in oggetto risulta definito un intervallo di velocità di progetto (60+100) km/h. Per quanto riguarda la sezione trasversale, è stata prevista una sezione tipo C1 che risulta caratterizzata da un'unica carreggiata con due corsie (una per verso di marcia) pari a 3,75 m e banchine laterali pari a 1,50 m, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a 10,50 m.


Per la definizione delle tipologie progettuali delle opere d'arte maggiori, in particolare per i viadotti, sono state prese in considerazione le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato oltre che la configurazione geometrica delle singole opere; la scelta delle tecniche costruttive adottate è passata, come accennato, anche attraverso un'attenta valutazione dell'inserimento ambientale dell'opera stessa e del suo aspetto estetico finale.



Gli interventi d'inserimento ambientale del tracciato di progetto prevedono la creazione di unità ambientali in grado di assolvere al compito di ricucitura dei margini dell'infrastruttura con le unità ambientali esistenti favorendo, nel contempo, il recupero vegetazionale dell'area interessata dai lavori, con evidenti ricadute positive sul paesaggio o su specifici aspetti di natura geomorfologica.

Nei primi 6.5 km del tracciato (individuati dall'Ufficio Commissariale come 2° Lotto – Infrased), ricadono cinque viadotti, sul fiume Fredane e nei valloni compresi tra il sistema collinare e il bacino del Fredane stesso, mentre nella restante parte del tracciato (1° Lotto – Infrav), ricadono dieci viadotti, localizzati nelle aree di maggiore qualità ambientale, nei valloni compresi tra il sistema collinare e i due bacini del Fredane e dell'Ufita.

Gli interventi di inserimento ambientale sono, pertanto, destinati da una parte, ad assicurare una effettiva mitigazione degli impatti visuali e paesaggistici con impianti di raccordo degli elementi della struttura (pile, spalle) con le formazioni vegetali presenti ai margini; dall'altra, ad eliminare i segni del cantiere sviluppatosi nelle aree sottoviadotto.



2. Iter amministrativo

Il progetto esecutivo dell'opera, articolato in 1° Lotto (competenza Infrav) e 2° Lotto in continuità (competenza Infrasad) è stato approvato dal Commissario ad Acta ex articolo 2 legge 289/02 con apposito decreto n° 709 del 28/7/2010.

Tale decreto riassume il precedente iter amministrativo a partire dall'originario affidamento in concessione ai Consorzi INFRASUD ed INFRAV in virtù della art. 32 della legge 219/81 e dell'art. 86 della L. 289/02.

Il suddetto decreto di approvazione all'articolo 1 recita quanto segue:

E' approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della "strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il collegamento dell'autostrada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con l'autostrada A16 NA-BA (Svincolo di Grottaminarda)" redatto dal Consorzio INFRASUD per il tratto dalla progressiva 0+450 alla progressiva 6+500 e dal Consorzio INFR.AV per il tratto dalla progressiva 6+500 alla progressiva 19+980 per l'importo complessivo di €430.000.000,00 articolato come segue :

LAVORI IN CONCESSIONE	Tratto INFRASUD (denominato 2° LOTTO) – da progr. 0+450 a progr. 6+500	Tratto INFR.AV (denominato 1° LOTTO) - da progr. 6+500 a progr. 19+980
Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D)	124.278.064,50	227.565.421,77
Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima)	5.714.684,74	10.092.570,89
Oneri di concessione (6,00%)	7.456.683,87	13.653.925,31
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di esproprio)	1.657.506,16	7.334.028,94
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in economia, consulenze e varie	676.150,00	1.302.400,00
Imprevisti	15.362.841,19	
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)	14.073.739,45	
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006	831.983,18	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	430.000.000,00	

L'attribuzione dell'importo complessivo del progetto, distribuendo anche le voci comuni, è di euro 150.055.806,69 al tratto INFRASUD e di euro 279.944.193,31 al tratto INFR.AV.

All'articolo 2 dello stesso decreto di approvazione viene stabilito che in caso di finanziamento parziale rispetto alla somma totale sopra determinata si proceda per stralci sulla base delle effettive somme rese disponibili e nei relativi tempi di assegnazione ferme restando condizioni rivolte a conservare invariato l'importo di progetto a carico dell'Amministrazione.

Tra dette condizioni particolari si richiamano:

a) inserimento di una clausola contrattuale che limita il pagamento dei lavori a misura agli importi di stima complessiva progettuale ed ove la contabilità effettiva superasse tale limite esclusione di qualsiasi riconoscimento economico.

Ovviamente è prevista la compensazione nell'ambito dei lavori a misura perché obiettivo è che non si superi l'importo totale di tali lavori a misura come stimato ed approvato.

Essendo il progetto finanziato per stralci, tale compensazione andrebbe effettuata per ogni stralcio e quindi anche tra i vari stralci nell'ambito e nei limiti però della specifica fonte di finanziamento (Stato e Regione Campania).

Detta clausola, assolutamente vantaggiosa per l'Amministrazione, insieme alla cadenza delle compensazioni è oggetto di atto transattivo tuttora all'esame dell'ADS di Napoli.

Non tutti però hanno compreso i benefici per la Committenza pubblica e per il lavoro in sé di tale ultima condizione.

b) Esclusione di riconoscimenti economici e/o di aggiornamenti qualsiasi sia il numero di stralci e qualsiasi siano i tempi di finanziamento, ed altresì esclusione di qualsiasi corrispettivo nel caso di finanziamento parziale dell'opera con contestuale acquisizione da parte dell'Amministrazione del progetto non realizzato a titolo assolutamente gratuito.

c) Realizzazione a carico dei Concessionari di qualsiasi interferenza da spostare ove già esistente ma non censita progettualmente.

d) Assunzione a carico del Concessionario delle spese legali in caso di contenziosi nel settore espropriativo delegato.

e) Altre condizioni restrittive e cautelative per l'Amministrazione, che rendono minimi i rischi di maggiori oneri (ad es. per interessi) per il pubblico Erario.

3. Descrizione dei lotti e degli stralci costruttivi realizzabili all'attualità

Con deliberazione n° 62 del 3/8/2011 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta delle Repubblica Italiana del 31/12/2011, nell'ambito dell'assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud, venne assegnato all'opera in oggetto (il cui progetto esecutivo, munito di tutti i necessari benestare, n.o., autorizzazioni ecc. era già approvato e cantierabile dal luglio 2010) un primo finanziamento regionale di **220 milioni di Euro** per la realizzazione di un lotto funzionale nell'ambito della tratta Lioni - Grottaminarda dell'asse nord/sud Tirreno – Adriatico.

Il Commissario con Verbale del 28.11.2011, sentiti i soggetti interessati presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise, individuava la tratta relativa funzionale nella tratta Grottaminarda – Frigento per l'importo suddetto, tutto ricadente nel perimetro dei lavori.

Con deliberazione n° 27 del 23/3/2012 del CIPE, vennero assegnati ulteriori **70 milioni di Euro** su finanziamento statale, distribuiti sulle 5 annualità dal 2012 al 2016 e destinati specificamente al tratto tra lo Svincolo di Frigento e lo svincolo Terme di San Teodoro (Villamaina), tratto che così completava il 1° lotto dei lavori.

Tale ulteriore stanziamento, unitamente al precedente ed alle risorse già trasferite di cui:

- al Decreto dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007 di **euro 2,5 milioni**, ad oggi assegnato sulla c.s. commissariale per euro 2,4 milioni;
- al Decreto Dirigenziale dell'Area Generale di coordinamento LL.PP. della Regione Campania n° 148 del 24 luglio 2009 di **euro 2,5 milioni**.

portava l'ammontare complessivo degli stanziamenti a **euro 295 milioni**.

Tenuto conto delle somme così come sopra definite fu possibile rimodulare nel corso del 2012 gli stralci funzionali realizzabili come appresso:

Una tratta funzionale, di importo pari a **euro 260 milioni** (suddivisibile in stralci secondo gli effettivi finanziamenti), che prevedeva la realizzazione del tratto di strada compreso tra gli svincoli di Grottaminarda - Frigento- San Teodoro (Villamaina) inclusi i due svincoli di estremità e gli svincoli interni per Gesualdo, Frigento e di collegamento con la variante S.S.90. Inoltre è inclusa la riqualificazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fino alla S.S. 428.

Tale tratta consente un agevole collegamento tra i comuni di Villamaina, Frigento, Gesualdo e Grottaminarda. Inoltre consente, sempre attraverso la strada comunale Napoletana che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio della nuova arteria con la S.S.428.

Detta tratta funzionale comprendeva quindi per intero lo stralcio Grottaminarda – Frigento di cui al Verbale del 28.11.2011 sopra citato.

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti e alla luce della intervenuta delibera CIPE n° 27 del 23.3.2012, tale tratta funzionale venne suddivisa nelle seguenti sub tratte:

- da **progressiva 7+125 a progressiva 11+937** per euro 70.000.000 (finanziamento MIT) a valere sulla Delibera CIPE n° 27 del 23 marzo 2012 e definita dall'Ufficio Commissariale 1° Lotto, 1° Stralcio, da Frigento allo Svincolo di San Teodoro (Villamaina);
- da **progressiva 11+937 a progressiva 19+980**; per euro 190.000.000 a valere per :
 - o Euro 186.375.000 sulla Delibera CIPE n° 62 del 3 agosto 2011;
 - o euro 1.500.000 sul Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007;
 - o euro 2.125.000 sul Decreto Dirig. Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione Campania n° 148.

Una seconda tratta funzionale (finanziamento regionale), di euro 35 milioni (completamento ai 295 milioni di euro in argomento), che prevedeva la realizzazione dello svincolo per Sant'Angelo dei Lombardi ed il completamento della strada fino al km 1+925 ed il collegamento con la S.P.217.

Proseguendo lungo la S.P.217 per circa 7.5 km si arriva sulla strada comunale Napoletana di cui si è detto, percorrendo la quale, per circa 1.5 km si arriva allo svincolo di Terme San Teodoro (Villamaina).

Tale tratta (indicata come 2° Lotto 1° Stralcio), attraverso la realizzazione del nuovo svincolo, che consente l'immissione della strada esistente Lioni - S. Angelo dei Lombardi alla S.P. n° 78, permette di migliorare il collegamento attuale, che si presenta, allo stato, parziale e con caratteristiche geometriche non compatibili con le disposizioni della normativa vigente, ma soprattutto, consente attraverso il collegamento con la S.P.217, posto al km 1+925, di allacciarsi al 1° stralcio funzionale che parte dallo svincolo di Terme di San Teodoro (Villamaina) e termina a Grottaminarda.

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti dei 35 milioni di euro in argomento e alla luce della intervenuta delibera CIPE n° 27 del 23.3.2012, tale stralcio funzionale veniva così finanziato:

- o Euro 33.625.000 a valere su Delibera CIPE n° 62 del 3 agosto 2011;
- o euro 1.000.000 a valere su Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007;
- o euro 375.000 a valere su Decreto Dirig. dell'Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione Campania n° 148.

In conclusione, per rendere attuabili tratte funzionali, l'importo di **220 milioni di Euro di cui alla delibera del 3/8/2011 del CIPE** venne distribuito in via definitiva come segue:

- 186.375.000 di Euro al lotto n° I (realizzando il secondo stralcio funzionale in prosecuzione con il 1° stralcio finanziato dal MIT per euro 70 milioni)
- 33.625.000 di Euro al lotto n° II (realizzando il primo stralcio di tale lotto)

Al riguardo, con Delibera della Giunta Regionale n° 650 del 15 dicembre 2014 pubblicata sul BURC n° 85 del 22 dicembre 2014, avente ad oggetto: FSC 2007 – 2013. Delibera CIPE n° 62/2011. Atto aggiuntivo all'APQ "Sistemi di

mobilità". Modifica ed integrazione delle DDGRR 200/2014 e 473/2014", la Regione Campania ha deliberato *"di confermare nell'Atto Aggiuntivo all'APQ "Sistemi di mobilità" l'intervento di competenza nazionale già individuato nella delibera CIPE n. 62/11 che risulta già dotato di OGV, costituito da "Asse Nord/Sud Tirreno Adriatico: Lauria – Contursi – Grottaminarda – Termoli – Candela. Tratta Lioni – Grottaminarda. 1° lotto" del costo di 220,00 M€ (Soggetto attuatore Commissario ad Acta ex L. 289/2002).*

In data 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Campania (Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo e Dipartimento delle Politiche Territoriali – Direzione Generale per la Mobilità), l'Accordo di Programma Quadro "Sistemi di mobilità" relativo alla più volte richiamata Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011.

A seguire, con Delibera della Giunta Regionale n° 47 del 9 febbraio 2015 pubblicata sul BURC n° 13 del 26 febbraio 2015, avente ad oggetto: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015 – 2017 della Regione Campania – Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017. Modifica n. 367 dell'8 agosto 2014", la Regione Campania ha deliberato *"di iscrivere le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della L.R. 5 gennaio 2015, n. 1" (All. 10 alla Delibera).*

Nel dettaglio, nell'Allegato 10, alla voce "FSC 2007 – 2013: Accordo di Programma QuadroTratta Lioni – Grottaminarda 1° Lotto – Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011", vengono previsti per competenza vincolata nel triennio 2015 – 2017 euro 175 milioni dei 220 milioni di euro di cui sopra, di cui euro 60 milioni per cassa nel 2015, euro 55 milioni nel 2016 ed euro 60 milioni nel 2017. La messa a disposizione della rimanente somma di euro 45 milioni di cui alla Delibera CIPE n. 62/2011 è stata prevista dalla Regione Campania nelle annualità successive, come da Decreto Dirigenziale n° 12/2015.

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016 concernente la rimodulazione dei flussi finanziari dell'intervento di che trattasi, sono stati resi disponibili circa euro 144 milioni oltre i 17 milioni circa già previsti per l'anno 2015, per complessivi euro 161.435.990,00. La messa a disposizione della rimanente somma di euro 58.564.010,00 di cui alla Delibera CIPE n. 62/2011 è stata prevista dalla Regione Campania nelle annualità 2019 - 2020.

Le assegnazioni di cui alle Delib. CIPE 62/2011 e 27/2012, congiuntamente alle deliberazioni regionali di cui sopra, erano rivolte, si ripete, a consentire la realizzazione delle due tratte funzionali di cui si è detto, per un ammontare complessivo di **295 milioni di Euro** così distinte:

- **260 milioni** di Euro alla **tratta funzionale I** (competenza Infrav, in costruzione per il 1° Stralcio funzionale e per il 2° Stralcio 1° Costruttivo)
- **35 milioni** di Euro alla **tratta funzionale II** (competenza Infrasad, da affidare)

Si evidenzia quindi che, con tali risorse, sarebbe stato possibile realizzare l'asse stradale per circa due terzi del suo sviluppo, con un significativo incremento sia di funzionalità che in termini di benefici per il territorio attraversato.

Si riporta di seguito il quadro di spesa dei due lotti funzionali, come definito nel corso dell'anno 2012, in analogia con il quadro del progetto esecutivo complessivo approvato con Decreto Commissariale n° 709 del 28.07.2010.

In considerazione dell'ulteriore stanziamento di cui alla Delibera CIPE n° 54/2016, nel mese di luglio 2018, su richiesta della Regione Campania, i Lotti e gli stralci costruttivi realizzabili all'attualità sono stati sostanzialmente rimodulati come segue:

A. Realizzazione dell'intero 1° Lotto (tratta Consorzio INFR.AV.) da progr. 6 + 500 a progr. 19 + 980 (costo dell'intervento euro 279.944.193,31), attingendo dai seguenti stanziamenti:

a. Delibera CIPE n° 27/2012 (Fondi MIT)	euro	70.000.000,00
b. Da Delibera CIPE n° 62/2011 (Fondi FSC) da 220 M€	euro	209.944.193,31
per complessivi	euro	279.944.193,31

B. Realizzazione del 2° Lotto, tratta Consorzio INFRASUD da progr. 0 + 450 a progr. 3 + 052 (costo dell'intervento euro 65.000.000,00) attingendo dal seguente stanziamento:

a. Delibera CIPE n° 54/2016 (Fondi FSC)	euro	65.000.000,00
b. Stanziamento mancante MIT	euro	70.000000,00

Il rimanente stanziamento di euro 10.055.806,69, portato dalla Delibera CIPE n° 62 del 3 agosto 2011, così come l'importo complessivo di euro 5 milioni portato dalle due Delibere regionali del 2007 e 2009, è da destinare nella tratta residua del 2° Lotto ed in tal senso è in corso relativa rimodulazione con modifica APQ.

Si riporta di seguito il quadro di spesa dei lotti, così come ridefinito nel mese di luglio 2018, in conformità con il quadro del progetto esecutivo complessivo approvato con Decreto Commissariale n° 709 del 28.07.2010.

Nel quadro di spesa non sono riportati euro 15.055.806,68 (residuo Delibera CIPE 62/2011 e Delib. Reg. 2007 e 2009 di cui sopra), in quanto, come detto, la relativa tratta realizzabile è in fase di definizione di dettaglio.

LAVORI IN CONCESSIONE	Tratto INFRASUD Progr. 0+450 a 3+052	Tratto INFR.AV Progr. 6+500 a 19+980
Importo netto lavori	53.207.185,00	227.217.490,70
Oneri Speciali di sicurezza	2.554.339,00	10.092.570,89
Oneri di concessione (6,00%)	3.192.431,10	13.633.049,44
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Espropriazioni	1.200.000,00	8.434.133,28
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in economia, consulenze e varie	509.650,00	1.302.400,00
Imprevisti	11.720.030,73	
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)	11.216.987,03	
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006	663.926,14	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	344.944.193,31	

4. Descrizione delle tratte da finanziare per il completamento dell'intervento

Tenuto conto dei finanziamenti e stanziamenti di cui al punto precedente, per il completamento dell'opera occorre un ulteriore stanziamento di **euro 70 milioni**, che consentirà, **unitamente all'importo di euro 15.055.806,68** indicato nel precedente paragrafo, il completamento del tratto, di competenza del Consorzio INFRASUD, **da progressiva 3+052 a progr. 6 + 500**, del valore complessivo di **euro 85.055.806,68**, e, quindi, di tutta la SSV Lioni – Grottaminarda.

Il quadro di spesa relativo al tratto residuo di euro 85.055.806,68 viene qui riportato:

LAVORI IN CONCESSIONE	Tratto INFRASUD Progr. 3+052 a progr. 6+500
LAVORI DI COMPLETAMENTO	
Importo netto lavori	71.070.879,50
Oneri Speciali di sicurezza	3.160.345,74
Oneri di concessione (6,00%)	4.264.252,77
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di esproprio)	706.042,08
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in economia, consulenze e varie	166.500,00
Imprevisti	2.676.894,38
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)	2.842.835,18
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006	168.057,04
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	85.055.806,68²⁾

IMPORTO TRATTE DA RISORSE STANZIATE	360.000.000,00
IMPORTO NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO.....	70.000.000,00
TOTALE.....	430.000.000,00

N.B.: vengono allegati a parte quadri sinottici completi con ogni dettaglio economico-finanziario.

² Comprensivi dei 10.055.806,68 € più 2.500M€ Del. Reg. della Direzione Viabilità assegnati attualmente per € 2.400, e 2.500 M€ Del. Reg. LL.PP.

5. 1° Lotto, 1° Stralcio in esecuzione (*) (Finanziamento MIT Delib. CIPE 27/2012)

La disponibilità della somma di **euro 70 milioni** di cui al deliberazione CIPE n° 27 del 23/3/2012 ha portato, nell'ambito del primo lotto funzionale (Infrav) Grottaminarda – Frigento – San Teodoro, alla individuazione di un 1° Stralcio della **sub – tratta San Teodoro (Villamaina) – Frigento (da progr. 7+125 a progr. 11+937)** ed all'avvio, con la consegna dei lavori del 31 gennaio 2013, delle relative attività.

La tratta, come indicato nella **Scheda n° 1**, ha una lunghezza complessiva pari a circa 5 km.

Prevede la realizzazione dello svincolo di San Teodoro - Villamaina e lo svincolo di Frigento. Inoltre è prevista la rifunionalizzazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fino alla S.S.428.

Le opere d'arte maggiori previste sono costituite da n° 4 viadotti, per uno sviluppo di circa ml. 881 e n° 6 gallerie artificiali, per uno sviluppo di circa ml. 657.

Sono inoltre previste opere minori varie (sottopassi, tombini, opere di sostegno e di rinaturalizzazione, ecc.).

La tratta consente un agevole collegamento tra i centri di Villamaina e Frigento, alternativo agli attuali collegamenti stradali costituiti dalla S.S.303 e S.S.428.

Inoltre consente, attraverso la strada comunale Napoletana, che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio della nuova arteria con la S.S.428 ed il rapido collegamento del centro di Frigento con la stessa S.S.428.

Il quadro di spesa del lotto funzionale è il seguente:

Importo netto lavori	€	56.850.862,91
Oneri speciali di sicurezza	€.	2.578.104,00
Oneri di concessione 6%	€.	3.411.051,77
Totale lavori	€.	62.840.018,68
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
Espropriazioni	€.	2.108.098,00
Oneri per eliminazione interferenze	€.	350.646,00
Imprevisti	€.	2.290.325,32
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.)	€.	2.274.035,00
Prezzo chiuso ex art.133 D.Lgs 163/2006	€.	136.877,00
Importo totale	€.	70.000.000,00

(*) Nella Delibera CIPE n. 27/2012, in quanto successiva alla Del CIPE n. 62/2011, la tratta viene indicata come "2° Stralcio".

5.1 Avanzamento delle attività

A valle della consegna dei lavori del 31 gennaio 2013, si è dato corso:

- alle attività tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza);
- alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attività, delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli aventi diritto, ecc.);
- alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici;
- ai movimenti di terra, diffusamente su tutto il lotto, ed alle bonifiche dei piani di posa.

Ottenuta la prima autorizzazione sismica, si è dato corso alla esecuzione della galleria artificiale Galleria Vallicocco.

Nel mese di marzo 2015 si è poi dato inizio ad una seconda galleria artificiale (Galleria San Pancrazio), e, nei mesi successivi, ad ulteriori n° 2 gallerie artificiali (Galleria San Marco e Galleria Casino Covone). Al 02/02/2016, con le autorizzazioni sismiche delle Gallerie Artificiali Mefite, si è dato inizio anche ai lavori di realizzazione delle ultime 2 gallerie artificiali. Alla fine del mese di Marzo 2016 si è dato inizio anche alla realizzazione del primo Viadotto (Mefite) e, successivamente anche del secondo Viadotto (S. Pancrazio) e del terzo (S. Martino). Nel mese di Marzo del 2017 si è

ottenuta l'autorizzazione sismica anche del 4° ed ultimo Viadotto presente nel lotto in questione, il "Rampone", attualmente in corso di completamento.

Alla data del 10 dicembre 2018 tutte le Gallerie Artificiali sono ultimate, mentre le opere relative ai Viadotti sono in fase di completamento; sono altresì in corso opere minori, quali le trincee drenanti e i rilevati; le restanti opere sono in iter, c/o i competenti Enti, per le approvazioni in materia sismica.

Alla data del 10 dicembre 2018, sono stati redatti:

- n° 8 Stati di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2017 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi diritto) per un importo progressivo di circa euro 1.240.000,00;
- n° 25 stati di avanzamento per lavori a tutto il 31.08.2018, per un importo di circa euro 43.800.000,00.

E' in fase di emissione il SAL n° 26 per lavori a tutto il 31 ottobre 2018, per un importo progressivo di circa euro 45.000.000,00.

Alla data del 10 dicembre 2018 l'impiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, è di circa 120 unità, a cui va aggiunto tutto il personale relativo all'indotto.

Eventi non prevedibili di natura essenzialmente tecnica stanno determinando ritardi nell'esecuzione dei lavori. Sono in corso provvedimenti per il recupero dei tempi. In particolare è stata predisposta bozza di transazione nel luglio 2017 e sottoposta al parere dell'ADS di Napoli tuttora in corso di acquisizione.

In proposito su richiesta della medesima ADS questo Ufficio ha avanzato richiesta di parere tecnico anche al Consiglio Superiore dei LL.PP. che tuttavia non sembra poter avere parte in causa.

E' stato emesso decreto di proroga al 28 dicembre 2019 della dichiarazione di pubblica utilità.

In data 17.12.12 il MIT ha versato sulla c.s. intestata al Commissario l'anticipazione di € 15.000.000,00, in data 25.7.16 un acconto di € 9.548.000,00 e in data 5.7.2017 un ulteriore acconto di € 20.000.000,00.

Ulteriore acconto (4° acconto) per € 22 milioni è stato richiesto in data 9.4.18, a fronte del quale sono stati assegnati in data 17.05.2018 € 20.531.858,00. Il restante importo di euro 1.468.142,00 è in corso di reinscrizione di somme perenti da parte del MIT.

6. Lavori del 1° Lotto 2° Stralcio 1° Costruttivo (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 47/2015 e del Decreto Dirigenziale n° 145/2015 e del Decreto Dirigenziale n° 12/2015, che ha disposto l'impegno di **euro 60 milioni** per l'anno 2015, si è definito il 2° Stralcio (1° Costruttivo) e si sono avviate, con la consegna dei lavori del 16 novembre 2015, le relative attività propedeutiche.

Lo stralcio costruttivo, ricompreso all'interno della Scheda n° 2, ha una lunghezza complessiva di circa 3 km.

Prevede, in quanto individuata come lotto Costruttivo, la realizzazione puntuale di alcune opere d'arte maggiori o parti di esse, che nel dettaglio sono:

- Galleria Naturale S. Filippo e relativo Cunicolo di Servizio;
- Viadotto San Silvestro;
- Viadotto Schivito Macchie;
- Galleria Artificiale Macchie;
- Galleria Artificiale Pratola;
- Galleria Artificiale SS 90.

Il quadro di spesa del lotto costruttivo in esame, approvato con decreto commissariale n° 1419 del 14 settembre 2015, è il seguente:

Importo netto lavori	€	48.117.134,17
Oneri speciali di sicurezza	€.	3.004.148,76
Oneri di concessione 6%	€.	2.887.028,05

Totale lavori	€.	54.008.310,98
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
Espropriazioni	€.	1.805.086,36
Oneri per eliminazione interferenze	€.	317.054,00
Imprevisti	€.	1.829.863,30
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.)	€.	1.924.685,37
Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006	€.	115.000,00
Importo totale	€.	60.000.000,00

6.1 Avanzamento delle attività

A valle della consegna per l'avvio delle attività espropriative del 17 settembre 2015, si è dato corso alle attività tese alla acquisizione dei suoli, espletando tutte le procedure previste ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/01 mediante la pubblicazione sia su quotidiani che all'Albo Pretorio dei comuni interessati; sono state, inoltre, espletate e concluse le attività previste dall'art. 17 del D.P.R. 327/01 mediante notifica ai singoli soggetti interessati con raccomandata A/R e pubblicazione all'Albo Pretorio dei comuni interessati per i soggetti sconosciuti o non reperibili.

Con l'emissione del decreto commissariale n° 1494 del 13 gennaio 2016 l'Autorità espropriante ha emesso il Decreto di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio.

Si è dato corso quindi:

- alle attività operative tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza);
- alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attività, delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli aventi diritto, ecc.);
- alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici;
- all'accantieramento.

Alla data del 10 dicembre 2018 sono in fase di completamento, in territorio di Grottaminarda, le gallerie artificiali "Macchie" e "Pratola", ivi compreso, per quest'ultima, il tratto sottostante la strada provinciale n° 36; è in fase di completamento, sempre in territorio di Grottaminarda, il viadotto "Schivito Macchie"; sono state completate la paratie di pali agli imbocchi Sud (Lato Frigento) e Nord (Lato Gesualdo) della galleria naturale "San Filippo" per consentire lo scavo di ingresso all'opera da realizzare in sotterraneo e le operazioni di scavo tra le paratie per arrivare a quota galleria; si è dato corso allo scavo della galleria naturale lato Nord (lato Grottaminarda), eseguito per circa 30 metri; sono attualmente in corso ulteriori verifiche di carattere geologico – tecnico sulla natura dei terreni attraversati; è in fase di completamento il viadotto "San Silvestro" in territorio del Comune di Gesualdo.

Alla data del 10 dicembre 2018 sono stati redatti:

- n° 5 Stati di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2018 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi diritto) per un importo progressivo di circa euro 665.000,00;
- n° 11 stati di avanzamento per lavori a tutto il 31 agosto 2018, per un importo di circa euro 23.800.000,00.

Alla data del 10 dicembre 2018 l'impiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, è di circa 90 unità, mentre a regime è previsto un impiego su detto 1° Lotto – 2° Stralcio di circa 120 unità, a cui va aggiunto tutto il personale relativo all'indotto.

Eventi non prevedibili di natura tecnica determinano ritardi nell'esecuzione dei lavori. A questi potrebbero aggiungersene altri derivanti da una situazione di amministrazione straordinaria del Socio Consorzio Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. Sono in corso provvedimenti per il recupero dei tempi ed in particolare è anche in fase di acquisizione parere dell'ADS di Napoli, di cui si è già detto, su schema di atto transattivo.

In data 16 novembre 2016 la Regione Campania ha versato un acconto sulla contabilità speciale commissariale 3250 per euro 6.000.000,00, e in data 20 dicembre 2017 un ulteriore acconto di euro 11.337.080,00.

In data 01/08/2018, la Regione Campania ha versato al Commissario ad Acta l'ulteriore acconto di € 12.662.920,00.

7. Lavori del 1° Lotto 3° Stralcio (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016 concernente la rimodulazione dei flussi finanziari di cui alla Delibera CIPE n° 62/2011, sono stati resi disponibili circa euro 144 milioni oltre i 17 milioni circa già previsti per l'anno 2015, per complessivi euro 161.435.990,00, comprensivi dei 60 mln già contrattualizzati.

E' stato quindi definito un progetto stralcio denominato 1° lotto 3° stralcio, ricompreso all'interno della scheda n° 2, dell'importo di euro 94.220.990,00.

E' stato inoltre definito, per i rimanenti euro 7.125.000,00 disponibili, l'ulteriore stralcio di cui al successivo paragrafo, denominato 2° lotto 1° stralcio, ricompreso all'interno della scheda n° 4, che consente di dare avvio anche al tratto di competenza del Consorzio INFRASUD, ma rispetto al quale la Regione Campania, nel mese di luglio 2018, ha fornito indicazione di attingere le risorse occorrenti dai fondi della Delibera CIPE 54 dell'1 dicembre 2016 (e non più da quelli della Delibera CIPE 62/2011). Si è già accennato a rimodulazione già in corso in tal senso.

Il progetto del 1° Lotto 3° Stralcio è stato approvato con decreto commissariale n° 1619 del 7 febbraio 2017 ed oggetto di contrattualizzazione con il Consorzio Concessionario (INFR.AV.) in data 27 luglio 2017; in data 28 febbraio 2018 è stato emesso il decreto di occupazione di urgenza; nei mesi di aprile e maggio 2018 si è dato corso alle immissioni in possesso sulle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Alla data del 10 dicembre 2018 tutte le aree sono state acquisite; sono state eseguite le lavorazioni di bonifica dagli ordigni residuati bellici; sono in corso di esecuzione le gallerie artificiali "Gesualdo" e "Valli" ed i viadotti "Caputo Celesa" e "Penta". E' altresì in fase di completamento la galleria artificiale "Macchie", le cui strutture erano state realizzate nell'ambito del 2° Stralcio.

Sempre alla data del 10 dicembre 2018 sono stati redatti n° 4 SAL per lavori a tutto il 31 agosto 2018, per l'importo di euro 2.000.000,00 mila circa.

Il 1° Lotto 3° Stralcio prevede in sintesi:

- la realizzazione di ulteriori 700 metri circa della Galleria Naturale S. Filippo;
- il completamento di tutte le lavorazioni previste tra la progr. 14 + 115 (Sbocco galleria San Filippo) e la progr. 19 + 980 (Svincolo di Grottaminarda), a completamento delle opere e lavorazioni previste con il 1° Lotto 2° Stralcio 1° Costruttivo.

Questo tratto, che rende completa ed usufruibile l'arteria tra gli svincoli di Gesualdo e Grottaminarda, prevede la realizzazione delle seguenti principali opere d'arte:

- Viadotto Pescariello;
- Viadotto Caputo Celesa;
- Viadotto Penta;
- Galleria Artificiale Gesualdo;
- Galleria Artificiale Valli;
- Galleria Artificiale Sant'Andrea;
- Galleria Artificiale Pioppi.

Il quadro di spesa del 1° Lotto 3° Stralcio, approvato con decreto commissariale n° 1619 del 7 febbraio 2017, è il seguente:

Importo netto lavori	€	75.997.515,06
Oneri speciali di sicurezza	€.	3.075.667,63
Oneri di concessione 6%	€.	4.559.850,90
Totale lavori	€.	83.633.033,59

Somme a disposizione dell'amministrazione:		
Espropriazioni	€.	3.916.892,37
Oneri per eliminazione interferenze	€.	634.700,00
Imprevisti	€.	2.846.463,44
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.)	€.	3.039.900,60
Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006	€.	150.000,00
Importo totale	€.	94.220.990,00

In data 04/07/2018, con D.G.R. n° 47, la Regione Campania ha versato al Commissario ad Acta l'anticipazione di euro 9.422.099,00 giusta DD 145/2015.

8. Lavori del 2° Lotto 1° Stralcio (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

Il 2° Lotto 1° Stralcio è stato definito, come detto nel precedente paragrafo, nell'ambito delle somme della Del. CIPE 62/2011 messe a disposizione dalla regione Campania con Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016, e consente di dare avvio anche al 2° Lotto di competenza del Consorzio INFRASUD.

Il relativo progetto è stato approvato con decreto commissariale n° 1685 del 25 luglio 2017 ed è stato oggetto di contrattualizzazione con il Consorzio Concessionario (INFRASUD) in data 27 luglio 2017.

Alla data del 10 dicembre 2018 è stato emesso il decreto di occupazione di urgenza, si è proceduto alla acquisizione dei suoli e sono in corso le attività relative alla bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici; sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Regione Campania nel mese di luglio 2018 di attingere le risorse occorrenti dai fondi della Delibera CIPE 54 dell'1 dicembre 2016 (e non più da quelli della Delibera CIPE 62/2011).

Il 2° Lotto 1° Stralcio è individuato nella tratta compresa tra le progr. 0 + 450 e 0 + 664, e prevede in sintesi:

- la realizzazione delle rampe dello Svincolo di S. Angelo dei Lombardi da e per Lioni, con innesto sulla SP 78, denominate "A", "B" e "C";
- la realizzazione dell'asse stradale da progr. 0 + 450,00 a progr. 0 + 664,00;
- la realizzazione della Spalla "A" del viadotto d'asse denominato "Fredane 1";
- la realizzazione delle trincee drenanti, opere di sistemazione idraulica, opere a verde e finiture in corrispondenza delle rampe "A", "B" e "C" dello Svincolo di S. Angelo dei Lombardi;
- la realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio delle Rampe "A", "B" e "C" dello Svincolo di S. Angelo dei Lombardi.

Il quadro di spesa del 2° Lotto 1° Stralcio, approvato con decreto commissariale n° 1685 del 25 luglio 2017, è il seguente:

Importo netto lavori	€	5.558.890,04
Oneri speciali di sicurezza	€.	333.460,29
Oneri di concessione 6%	€.	333.533,40
Totale lavori	€.	6.225.883,73
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
Espropriazioni	€.	342.619,05
Oneri per eliminazione interferenze	€.	240.500,00
Imprevisti	€.	171.641,62
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.)	€.	222.355,60
Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006	€.	12.000,00
Importo totale	€.	7.215.000,00

E' stato effettuato in data _____ da parte della Regione Campania, il versamento al Commissario ad Acta dell'anticipazione di euro 721.500,00.

9. Attivazione importo residuo Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011

Con la messa a disposizione da parte della Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016, dell'importo di euro 161.435.990,00 (con i quali sono stati definiti il 1° Lotto 2° Stralcio, il 1° Lotto 3° Stralcio ed il 2° Lotto 1° Stralcio), **residua** dalla Delibera CIPE 62/2011 l'importo di **euro 58.564.010,00**.

La medesima Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016 ha previsto la messa a disposizione di tale importo nelle annualità 2019 – 2020.

Sulla scorta delle indicazioni della Regione Campania del luglio 2018 più volte richiamate, con questo importo:

- sarà completato tutto il 1° Lotto (fabbisogno euro 55.723.203,32);
- il rimanente importo di euro 2.840.806,68, unitamente all'importo di euro 7.215.000,00 di cui al paragrafo precedente ed all'importo di euro 5.000.000,00 di cui alle due Delibere regionali del 2007 e 2009, per complessivi euro 15.055.806,68, sarà impiegato sul 2° Lotto.

Anche per il completamento del 1° Lotto, consistente nella esecuzione della residua parte della galleria naturale "San Filippo" (individuato come 1° Lotto 4° Stralcio) e nella esecuzione del tratto stradale compreso tra le progr. 6+500,00 e 7+125,00 (individuato come 1° Lotto 5° Stralcio), viene allegata una scheda di sintesi (**Scheda n° 3**).

10. Ulteriori stanziamenti CIPE

La messa a disposizione dell'ulteriore stanziamento di **euro 65.000.000,00** previsto nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 – 2020 approvato con Delibera CIPE n° 54 dell'1 dicembre 2016, in G.U. n° 88 del 14 aprile 2017, renderà possibile, secondo le indicazioni della Regione Campania del luglio 2018, la realizzazione della tratta di competenza del Consorzio INFRASUD dal km. 0+450 al km 3+052 circa (2° Lotto 1° Stralcio e 2° Stralcio), come da scheda di sintesi allegata (**Scheda n° 4**).

La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 104 del 20 febbraio 2018 ha preso atto dello stanziamento disposto ed ha attivato le procedure per rendere i fondi disponibili.

Il Commissario ha sottoscritto Convezione a tre (Regione / Commissario / MIT) in data 20.3.2018 con prot. 30539 che regola i rispettivi impegni.

Con Decreto Dirigenziale n° 20 del 3 agosto 2018 (in BURC n° 55 del 6 agosto 2018) la Regione Campania ha decretato l'impegno di spesa.

11. Stanziamenti da reperire per il completamento dell'opera

Come già riportato nei precedenti paragrafi, per il completamento dell'opera residuano da stanziare **€ 70 milioni**, tutti a carico del MIT in base all'accordo Stato – Regione dell'1 agosto 2008, con i quali sarà possibile completare il tratto **da progressiva 3 + 052 a progr. 6 + 500** per l'importo di **euro 85 milioni** circa (2° lotto 3° Stralcio) e, quindi, l'intera SSV Lioni - Grottaminarda.

Anche per il completamento di questo 2° Lotto 3° Stralcio viene allegata una scheda di sintesi (**Scheda n° 5**).

12. Composizione societaria dei Consorzi concessionari

La realizzazione dell'infrastruttura è affidata in concessione a due Consorzi, con la seguente suddivisione ed attuale composizione societaria:

- il tratto da **progr. 0 + 00 (Inizio lotto) a progr. 6 + 500** al **Consorzio INFRA.SUD**, composto dalle seguenti Società:
 - CONIC 2 S.r.l.
 - S.A.F. 2 S.r.l.

- il tratto da **progr. 6 + 500 a progr. 19 + 980 (Fine lotto)** al **Consorzio INFR.AV.**, composto dalle seguenti Società:
 - Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in A.S. (attualmente in regime di Amministrazione Straordinaria)
 - ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A.
 - Marino Costruzioni S.r.l.
 - S.A.F. 3 S.r.l.

COMMISSARIO AD ACTA art. 86 LEGGE 289/02		
Viabilità Lioni - Grottaminarda		
VERSAMENTI SULLA C.S. 3250 SUDDIVISI PER SOGGETTO FINANZIATORE, LOTTO E STRALCIO		

MIT	1° lotto 1° stralcio	1^ anticipazione	17/12/12	15.000.000,00
		2° acconto	25/07/16	9.548.000,00
		3° acconto	05/07/17	20.000.000,00
		4° acconto	21/06/18	20.531.858,00
		TOTALE		65.079.858,00

Regione Campania	1° lotto 2° stralcio	1^ anticipazione	16/11/16	6.000.000,00
		2° acconto	20/12/17	11.337.080,00
		3° acconto	14/08/18	12.662.920,00
		Totale		30.000.000,00

Regione Campania	1° lotto 3° stralcio	1^ anticipazione	11/07/18	9.422.099,00
		Totale		9.422.099,00

Regione Campania	2° lotto 1° stralcio	1^ anticipazione	21/11/18	721.500,00
		Totale		721.500,00

TOTALE GENERALE	105.223.457,00
Sommano importi per progettazione	110.123.457,00

VERSAMENTI PER PROGETTAZIONE

Regione Campania	27/07/07	250.000,00	1)
	20/10/08	1.000.000,00	1)
	15/12/09	2.500.000,00	
	17/12/09	530.000,00	1)
	01/12/11	620.000,00	1)

1) Per totali M€ 2,400 su 2.500 assegnati. Residuano pertanto € 100.000,00 da accreditare.

S.S.V. LIONI - GROTTAMINARDA
QUADRO DI SPESA LOTTO INFRAV

10 dicembre 2018

SITUAZIONE FINANZIAMENTI/CONTRATTUALIZZAZIONI

	PROGETTO ESECUTIVO GENERALE	LOTTE CONTRATTUALIZZATE AL 10 DICEMBRE 2018 (DELIBERA CIPE 27/2012 E PARTE DELIB. CIPE 62/2011)				TRATTE INFRAV RESIDUE DA CONTRATTUALIZZARE AL 10 DICEMBRE 2018 (DELIBERA CIPE 62/2011)			IMPORTO DELIBERA CIPE 62/2011 UTILIZZABILE SU 2° LOTTO - INFRASUD - (e pertanto già in corso di rimodulazione)	COLONNA DI VERIFICA
		IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON D.M. N° 709 DEL 28 LUGLIO 2010 CON MODIFICA IMPORTO LAVORI DA ISTRUTTORIA DIRETTORE LAVORI DEL 2012 SU LOTTO 200 MLN E STIME ESPROPRI DA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE GIUGNO 2011	IMPORTO 1° LOTTO 1° STRALCIO FUNZIONALE SAN TEODORO - FRIGENTO (PROGR. 6+500 - 11+937) (DELIBERA 27/2012) - CONTRATTO DEL 21 GENNAIO 2012	IMPORTO 1° LOTTO 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO (PARTE DELIBERA 62/2011) - CONTRATTO DEL 16 SETTEMBRE 2015	IMPORTO 1° LOTTO 3° STRALCIO (PARTE DELIBERA 62/2011) - CONTRATTO DEL 27 LUGLIO 2017	SOMMAIO LAVORI DEL TRATTO SAN TEODORO - GROTTAMINARDA CONTRATTUALIZZATI AL 10 DICEMBRE 2018	COMPLETAMENTO GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO (1° LOTTO 4° STRALCIO)	TRATTA DA PROGR. 6+500 (CONFINI INFRASUD) A PROGR. 7+125 (INIZIO 1° LOTTO 1° STRALCIO) (VIADOTTO DEI BAGNI) (1° LOTTO 5° STRALCIO)	TOTALE INFRAV. DA CONTRATTUALIZZARE AL 10 DICEMBRE 2018	
1	Lavori	227.217.400,70	50.850.002,91	48.117.134,17	75.007.515,00	180.965.512,14	30.319.044,10	15.732.134,46	46.251.078,56	227.217.400,70
2	Oneri speciali di sicurezza	18.002.579,80	2.578.104,00	3.804.148,76	3.075.067,83	8.657.920,39	818.805,36	515.845,14	1.434.650,50	18.001.661,85
3	Oneri di concessione (6,00% di 1)	13.833.840,44	3.411.051,77	2.887.928,05	4.558.850,98	10.857.930,72	1.831.100,65	943.929,87	2.775.118,72	13.833.840,44
	SOMMAIO	250.043.111,83	62.840.818,68	54.809.210,98	82.633.033,59	200.481.363,25	33.289.849,11	17.191.907,67	50.461.747,78	250.042.201,70
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:										
4	Espropriazioni (da stime)	8.434.133,28	2.188.098,80	1.305.886,36	3.916.892,37	7.830.876,73	-	894.956,55	604.056,55	8.434.133,28
5	Oneri per eliminazione interferenze (da stime Consorzio)	1.302.400,00	350.546,00	317.054,00	634.700,00	1.302.400,00	-	-	-	1.302.400,00
6	Imprevisti (Da quadro di spesa Consorzio e Rapporto Validez. RUP)	9.837.739,87	2.290.325,32	1.829.863,30	2.848.483,44	6.906.052,00	1.101.859,72	1.480.233,71	2.671.093,03	9.839.846,32
7	Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione) (4%)	9.088.800,83	2.274.935,80	1.924.485,37	3.039.980,60	7.238.420,67	1.220.703,28	828.285,38	1.850.078,66	9.088.699,63
8	Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs. 163/2006 (Attribuzione al Consorzio in percentuale ai lavori)	538.110,30	136.877,00	115.840,00	150.000,00	481.877,00	106.522,80	20.710,41	136.233,30	538.110,30
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	29.001.082,28	7.159.801,32	5.991.689,03	10.587.956,41	23.739.626,70	2.509.109,80	2.752.285,65	5.261.455,54	29.001.091,53
	TOTALE INTERVENTO	279.044.193,31	73.000.620,00	60.800.900,00	94.220.990,00	224.220.990,00	35.779.958,90	19.944.193,32	55.723.203,32	279.044.193,33

S.S.V. LIONI - GROTTAMINARDA
QUADRO DI SPESA LOTTO INFRASUD

10 dicembre 2018

SITUAZIONE FINANZIAMENTI/CONTRATTUALIZZAZIONI

	PROGETTO ESECUTIVO GENERALE	DELIBERA CIPE 54/2016: LOTTO S.ANGELO DEI LOMBARDI - FINE VIADOTTO FREDANE 3 (PROGR. 0+450 - 3 + 052) (2° LOTTO 1° STRALCIO + 2° STRALCIO)			TRATTA INFRASUD RESIDUA NON COPERTA DA FINANZIAMENTO (DA PROGR. 3+052 A PROGR. 6 +500)	
	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON D.M. N° 709 DEL 28 LUGLIO 2010 CON MODIFICA STIME ESPROPRI DA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE GIUGNO 2011	2° LOTTO 1° STRALCIO (PROGR. 0+450 - 0+664): CONTRATTO DEL 27 LUGLIO 2017	IMPORTO 2° LOTTO 2° STRALCIO (PROGR. 0+664 - 3+052)	IMPORTO COMPLESSIVO 2° LOTTO 1° + 2° STRALCIO	2° LOTTO 3° STRALCIO: TRATTO DA PROGR. 3+052 A PROGR. 6 +500)	NOTE
1 Lavori	124.278.064,50	5.558.890,04	47.648.294,96	53.207.185,00	71.070.879,50	Sussistono i finanziamenti di cui alle due Delibere regionali del 2007 e 2009 per euro 2,5 + 2,5 mln; inoltre residua dal 1° LOTTO l'importo della Delibera 62/2011 per euro 10.065.806,69. In corso di rimodulazione
2 Oneri speciali di sicurezza	5.714.684,74	333.460,29	2.220.878,71	2.554.339,00	3.160.345,74	
3 Oneri di concessione (6,00% di 1)	7.456.683,87	333.533,40	2.858.897,70	3.192.431,10	4.264.252,77	
SOMMARIO	137.449.433,11	6.225.883,73	52.728.071,37	58.953.955,10	78.495.478,01	
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:						In realtà, quindi, potrebbe essere individuato ed avviato un ulteriore stralcio per euro 15.055.806,69 da individuare nel dettaglio
4 Espropriazioni (da stime)	1.906.042,08	342.619,05	857.380,95	1.200.000,00	706.042,08	
5 Oneri per eliminazione interferenze (da stime Consorzio)	676.150,00	240.500,00	269.150,00	509.650,00	166.500,00	
6 Imprevisti (Da quadro di spesa Consorzio e Rapporto Validaz. RUP)	4.759.186,04	171.641,62	1.910.650,04	2.082.291,66	2.676.894,38	
7 Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione) (4%)	4.971.122,58	222.355,60	1.905.931,80	2.128.287,40	2.842.835,18	
8 Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs. 183/2006 (Attribuzione ai Consorzi in percentuale ai lavori)	293.872,88	12.000,00	113.815,84	125.815,84	168.057,04	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ.	12.606.373,58	989.116,27	5.056.928,63	6.046.044,90	6.560.328,68	
TOTALE INTERVENTO	150.055.806,69	7.215.000,00	57.785.000,00	65.000.000,00	85.055.806,69	

CONSORZIO INFRAV

N.	OPERA	N. AUTORIZZAZIONE	DATA AUTORIZZAZIONE
1° LOTTO 1° STRALCIO FUNZIONALE			
1	GALLERIA ARTIFICIALE VALLICOCCO OPERE DI IMBOCCO, SCATOLARE IDRAULICO PK 9+105	73639	25/11/2014
2	GALLERIA ARTIFICIALE S. PANCRAZIO	73849	16/03/2015
3	GALLERIA ARTIFICIALE S. MARCO	73847	16/03/2015
4	GALLERIA ARTIFICIALE CASINO COVONE	74155	01/07/2015
5	ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI, SOTTOVIA A PK 10+500	74591	18/11/2015
6	GALLERIA ARTIFICIALE MEFITE 1	74806	02/02/2016
7	GALLERIA ARTIFICIALE MEFITE 2	74805	02/02/2016
8	VIADOTTO MEFITE, MURO SOSTEGNO PK 9+636, TRINCEE DRENANTI	74906	30/03/2016
9	VIADOTTO SAN PANCRAZIO, PARATIA AL PIEDE RILEVATO PK 7+514 ÷ 7+550, TRINCEA DRENANTE	75168	22/07/2016
10	PARATIA DI SOSTEGNO PK 8+195 ÷ 8+209	75164	22/07/2016
11	PK 8+209 ÷ 8+933 (MURI DI CONTRORIPA, PARATIA AL PIEDE, MURI SU PALI, TRINCEE DRENANTI) (AREA 4)	AS.2016.544.2	19/07/2016
12	VIADOTTO SAN MARTINO, MURO SU PALI A PK 7+698, TRINCEE DRENANTI	75231	19/08/2016
13	VIADOTTO RAMPONE, TRINCEE DRENANTI	75592	09/03/2017
14	MURI DI CONTRORIPA E OPERE A SOSTEGNO RILEVATO DELLO SVINCOLO DI SAN TEODORO (AREA 1)	75765	30/05/2017
15	VIADOTTO MEFITE (VARIANTE TRAVI)	74906/var	30/06/2017
16	VIADOTTO SAN PANCRAZIO (VARIANTE TRAVI)	75168/VAR	08/06/2017
17	OPERE A SOSTEGNO RILEVATO PK 9+099 ÷ 9+460, ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO PK 9+440, TRINCEE DRENANTI AREA 6)	75888	28/07/2017
18	OPERE SOSTEGNO TERRA RINFORZATA PK 9+475 ÷ 9+610 E MURI IN C.A. 9+491÷9+581	AS.2017.682.1	05/10/2017
19	OPERE SOSTEGNO TERRA RINFORZATA PK 7+225 ÷ 7+334 E PK 7+370 ÷ 7+388	AS.2017.683.1	26/09/2017
20	VIADOTTO RAMPONE (VARIANTE IMPALCATO)	75592/VAR	14/09/2017
21	OPERE SOSTEGNO TERRA RINFORZATA PK 8+209 ÷ 8+375 E PK 8+750 ÷ 8+933	AS.2017.707.2	10/10/2017
22	VIADOTTO SAN MARTINO (VARIANTE IMPALCATO)	75231/VAR	20/11/2017

23	MURI DI CONTRORIPA PK 9+983 ÷ 10+314, MURI DI SOTTOSCARPA E PARATIE RIVESTITE SVINCOLO DI FRIGENTO, TRINCEE DRENANTI (AREA 9)	76203	13/11/2017
24	MURI TERRA RINFORZATA PK 11+475, MURI CONTRORIPA PK 10+992 ÷ 11+520, MURO SOTTOSCARPA PK 10+925, TRINCEE DRENANTI PK 11+050 (AREA 11)	76548	24/04/2018
25	MURI DI CONTRORIPA PK 9+856 ÷ 9+871 (AREA 8)	AS.2018.768.3	03/07/2018
26	MURI DI CONTRORIPA IN SX E DX DA PROGR. 9+058 ÷ 9+065 (AREA 5)	AS.2018.784.1	17/07/2018
27	GALLERIA ARTIFICIALE CASINO COVONE (VARIANTE PARATIA IMBOCCO)	75164/var	26/06/2018
28	GALLERIA ARTIFICIALE SAN MARCO (VARIANTE)	73847/var	27/06/2018
29	OPERE D'ARTE MINORI - SVINCOLO SAN TEODORO - RAMPA A	76699	26/06/2018
1° LOTTO 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO			
1	GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO - IMBOCCO NORD	75615	21/03/2017
2	GALLERIA ARTIFICIALE MACCHIE	AS 2017 610_1	14/03/2017
3	GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO - IMBOCCO SUD	75614	21/03/2017
4	GALLERIA ARTIFICIALE PRATOLA	AS 2017 611_1	11/04/2017
5	GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO	75786	14/06/2017
6	VIADOTTO SAN SILVESTRO, TRINCEE DRENANTI	75771	06/06/2017
7	VIADOTTO SCHIVITO MACCHIE	GC.AI.2017.003012	24/08/2017
8	MURI DI CONTRORIPA PK 17+655 ÷ 17+687 E MURI DI CONTRORIPA PK 17+797 ÷ 17+809	AS 2017 711_2	19/10/2017
9	GALLERIA ARTIFICIALE SS 90	AS 2018 769_1	26/04/2018
1° LOTTO 3° STRALCIO			
1	GALLERIA ARTIFICIALE VALLI	76523	13/04/2018
2	MURI DI CONTRORIPA DA PK 17+937,50 ÷ 17+987,50	AS.2018.780.3	03/07/2018
3	VIADOTTO PENTA	GC.AI.2018.002556.AUTO.PRD	28/06/2018
4	VIADOTTO CAPUTO CELESA	76745	04/07/2018
5	GALLERIA ARTIFICIALE GESUALDO	76963	20/09/2018
6	SOTTOVIA PK 18+070	AS.2018.816_2	06/09/2018
7	MURI DI CONTRORIPA DA PK 18+400 ÷ 19+042	AS.2018.808.3	27/11/2018
8	VIADOTTO PESCARIELLO	in iter	in iter

CONSORZIO INFR.AV.							
SSV. LIONI - GROTTAMINARDA - 1° Lotto -							
- AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE -							
N.° Ord.	TIPO ATTO	DATA STIPULA	ENTE	DESCRIZIONE	CONTRATTO	PARTE D'OPERA	NOTE
1	Concessione a titolo oneroso	15/02/2017	Genio Civile Avellino	Attraversamento aree demaniali	1° Lotto Funzionale	Torrente San Pancrazio	Atto stipulato con oneri posti a carico del Concessionario sino alla consegna delle opere
2						Vallone Carpiello (Viadotto Rampone)	
3						Vallone San Martino	
4	Concessione a titolo oneroso	03/08/2018	Genio Civile Ariano I.	Attraversamento aree demaniali	2° Stralcio Costruttivo	Vallone Penta	Atto stipulato con oneri posti a carico del Concessionario sino alla consegna delle opere
5	Concessione a titolo oneroso		Genio Civile Avellino	Attraversamento aree demaniali	3° Stralcio	Vallone S. Elia (Svincolo di Gesualdo)	In itinere

COMMISSARIO AD ACTA art. 86 L. 289/02 - CONVENZIONI E CONCESSIONI IN CORSO

SSV. LIONI - GROTTAMINARDA

N.° Ord.	TIPO ATTO	DATA STIPULA	ENTE	DESCRIZIONE	CONTRATTO	PARTE D'OPERA
1	Convenzione	17/09/2009	Provveditorato OO.PP. Napoli	Funzioni di Stazione Appaltante		1° e 2° lotto
2	Convenzione	24/03/2010	ing. Giancarlo d'Agostino	Direzione Lavori		1° e 2° lotto
3	Convenzione	10/09/14	Comune Villamaina	Viabilità interferita	1° Lotto funzionale	Strade Comunali
4	Convenzione	05/02/15	Comune Frigento	Viabilità interferita	"	Strade Comunali
5	Protocollo Legalità	05/03/2015	Prefettura Avellino	Prvenzione tentativi di nfiltrazione criminalità organizzata		1° e 2° lotto
6	D.D.145 - Accordo Programma Quadro 30.12.14	21/05/2015	Regione Campania - D.G. Mobilità	Gestione M€ 220 (Del. CIPE 62/11)	1° lotto	
7	Convenzione		MIT - Regione Campania	Gestione M€ 65 Del. CIPE 54/16	2° lotto	
8	Convenzione	03/08/2018	Regione Campania	"	"	
9	Convenzione		MIT	Gestione M€ 70	1° lotto	
10	Convenzione		MIT			
11	Servitù	02/09/16	e-Distribuzione	Risoluzione interferenze	"	Viadotti Mefite - San Pancrazio - San Marco
12	Concessione	15/02/2017	Genio Civile Avellino	Attraversamento aree demaniali	"	Torrente San Pancrazio
13	Concessione					Vallone Carpiello
14	Concessione					Vallone San Martino
15	Servitù	02/09/2016	e-Distribuzione	Risoluzione interferenze	1° lotto 1° stralcio	Napoletana - Sv. Gesualdo - GA Valli - GA S. Andrea, Grottninarda ecc.
		16/02/2017			1° lotto 2° stralcio	
		13/07/18			1° Lotto funzionale 1° e 2° stralcio	
		28,11,18			1° lotto 2° stralcio	
16	Concessione	03/08/18	Genio Civile Ariano I.	Attraversamento aree demaniali	2° stralcio costruttivo	Vallone Penta
17	Convenzione	in corso	ANAS	Viabilità interferita	"	Galleria SS90
18	Servitù	"	SNAM	Risoluzione interferenze	"	Svincolo Gesualdo
19	Convenzione	"	ASPI	Viabilità interferita	3° stralcio	Rotatoria Km. 19+954
20	Convenzione	"	Comune Grottaminarda	Viabilità interferita	2° e 3° stralcio	Strade Comunali
21	Convenzione	"	Comune Gesualdo	Viabilità interferita	"	Strade Comunali

COMMISSARIO AD ACTA art. 86 L. 289/02 - CONVENZIONI E CONTRATTI CON CONSORZI CONCESSIONARI DEI LAVORI
SSV. LIONI - GROTAMINARDA

N.° Ord.	TIPO ATTO	DATA STIPULA	Concessionario	DESCRIZIONE		PARTE D'OPERA
1	Convenzione Base	14/09/1982	INFR.AV.			
2	Convenzione Base	14/09/1982	INFRASUD			
3	Atto Aggiuntivo Quadro	28/07/10	INFR.AV.	Individuazione ed esecuzione dei lavori	1° lotto	dalla progr. 6+500 alla progr. 19+980
4	Atto Aggiuntivo Quadro	28/07/10	INFRASUD	Individuazione ed esecuzione dei lavori	2° lotto	dalla progr. 0+450 alla progr. 6+500
5	Contratto	23/01/13	INFR.AV.	Affidamento lavori	1° lotto 1° stralcio funzionale	dalla progr. 7+125 alla progr. 11+937
6	Atto integrativo	14/02/2013	INFR.AV.	tracciabilità dei flussi finanziari	1° lotto 1° stralcio funzionale	
7	Atto integrativo	16/07/2015	INFR.AV.	Obblighi disciplina Protocollo Legalità	1° lotto 1° stralcio funzionale	
8	Contratto	16/09/2015	INFR.AV.	Affidamento lavori	1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo	dalla progr. 12+140 alla progr. 19+980
9	Contratto	27/07/2017	INFR.AV.	Affidamento lavori	1° lotto 3° stralcio	"
10	Contratto	27/07/2017	INFRASUD	Affidamento lavori	2° lotto 1° stralcio	dalla progr. 0+450 alla progr. 6+500

SSV LIONI-GROTTAMINARDA (DA PROGR. 6.500 A PROGR. 19.980)
RIEPILOGO INTERFERENZE (AGG. 30.09.2018)
RAFFRONTO CON IMPORTI PREVISTI NEL PROGETTO ESECUTIVO

sigla	Inte	Tipo	Progressiva riferimento	Caratteristiche oggetto interferito	WBS opera in progetto	Ente Gestore	Note	Previsione risoluzione	Costi risoluzione previsti nel P.E.	Costi in corso d'opera	Costi RIMBORSATI	Costi in corso di RIMBORSO	STATO
24	F	Elettricità	7267,00	Linea MT su pali	Galleria San Pancrazio - Svincolo San Teodoro (Villamaina)	ENEL distribuzione	Lungo la str. com. Napoletana - S.Pancrazio (lato dx verso la rotonda), in corrispondenza dello svincolo, proseguendo a valle della rotonda lungo la str. com. Bagni-Fellitto (dx e sx) fino all'innesto della strada che si collega alle Terme di S.Teodoro (Contrada Cerasio).	Occorre	€ 27 000,00	€ 89 032,93	88930,62		RIMBORSATA PER € 88.930,62
25	F	Elettricità	7275,00	Linea BT su pali	Galleria San Pancrazio - Svincolo San Teodoro (Villamaina)	ENEL distribuzione	Lungo la str. com. S.Pancrazio-Napoletana (lato dx verso la rotonda), in corrispondenza dello svincolo.	Occorre	€ 27 000,00				
31	F	Elettricità	9468,00	2 linee BT/MT su pali	Trincea e viabilità locale deviate in affiancamento all'asse principale (tratto gall. art. Vallicocco - viadotto Melite)	ENEL distribuzione	Strada Meliti deviate	Occorre	€ 36 000,00				
32	F	Elettricità	9547,00	Linea MT su pali	Trincea e viabilità locale deviate in affiancamento all'asse principale (tratto gall. art. Vallicocco - viadotto Melite)	ENEL distribuzione	In zona agricola limitrofe alla strada comunale Meliti, in prossimità del viadotto Melite.	Occorre	€ 27 000,00				
33	F	Elettricità	9692,00	2 linee MT su pali	Rilevato asse principale ante viadotto Melite	ENEL distribuzione	In zona agricola in prossimità dell'inizio del viadotto Melite.	Occorre	€ 27 000,00				
34	F	Elettricità	9775,00	Linea MT su pali	Viadotto Melite	ENEL distribuzione	Linea di M.T. tra pila 2 e spalla B del viadotto Melite.	Occorre	€ 27 000,00				
43	F	Elettricità	11356,00	Linea BT su pali	Galleria artificiale San Marco	ENEL distribuzione	Linea BT lungo la strada comunale San Marco	Occorre	€ 9 000,00	€ 37 551,93			ATTESA FATTURA ENTE
26	F	Servizi comunali	7274,00	Illuminazione strada comunale	Galleria San Pancrazio - Svincolo San Teodoro (Villamaina)	Comune di Villamaina	Lungo la str. com. Napoletana - S.Pancrazio, in corrispondenza ed a valle dello svincolo.	Occorre	€ 20 000,00				
27	F	Idrica	7268,00	condotta idrica in polietilene Ø 75	Galleria S. Pancrazio - Svincolo San Teodoro (Villamaina)	Alto Calore Servizi	Lungo la str. com. Napoletana - S.Pancrazio, in corrispondenza ed a valle dello svincolo.	Occorre	€ 23 000,00				
28	F	Telecomunicazioni	8904,00	Linea su pali	Trincea ante galleria Vallicocco	Telecom	lungo strada comunale Vallicocco	Occorre	€ 20 600,00				
30	F	Telecomunicazioni	9275,00	Linea su pali	Rilevato tratto gall. art. Vallicocco - viadotto Melite	Telecom	Linea sulla viabilità locale deviate, in affiancamento al tratto in rilevato.	Occorre	€ 12 400,00	€ 18 985,56	37891,25		RIMBORSATA 80% PER € 37.891,25
35	F	Telecomunicazioni	9894,00	Linea su pali	Galleria artificiale melite	Telecom	Linea lungo la strada comunale Meliti	Occorre	€ 600,00				
38	F	Telecomunicazioni	9997,00	Stessa linea della pag 9894	Rampa di collegamento con la Valle Ufita	Telecom	Le quote vi riferiscono alla rotonda (sez. R6).	Occorre	€ 4 000,00				
42	F	Telecomunicazioni	10745,00	Linea su pali	Rilevato	Telecom	Strada comunale Le Mattine	Occorre	€ 11 000,00				
29	F	Idrica	8913,00	condotta idrica in polietilene Ø 50	Trincea	Alto Calore Servizi	Lungo la str. com. Vallicocco	Occorre	€ 28 500,00	€ 137 765,92		17492,19	CHIESTO RIMBORSO PER € 17.492,19
36	F	Servizi comunali	9907,00	Fognatura Comunale (pvc Ø 315)	Galleria artificiale Melite	Comune di Frigento	Fognatura lungo strada comunale Melite	Occorre	€ 10 000,00				
37	F	Idrica	9900,00	condotta idrica in polietilene Ø 63	Galleria artificiale Melite	Alto Calore Servizi	Str. com. Meliti, in prossimità dello svincolo per Frigento	Occorre	€ 27 500,00				
44	F	Idrica	11362,00	condotta idrica in acciaio Ø 65 mm	Galleria artificiale San Marco	Alto Calore Servizi	Lungo la strada comunale San Marco	Occorre	€ 9 500,00				
46	F	Servizi comunali	11360,00	Fognatura Comunale (pvc Ø 315)	Galleria San Marco	Comune di Frigento	Lungo la strada comunale San Marco	Occorre	€ 9 500,00				
39	F	Servizi comunali	10736,00	Illuminazione strada	Rilevato	Comune di Frigento	Linea di pubblica illuminazione lungo la strada comunale Le Mattine	Occorre	€ 20 000,00				
40	F	Servizi comunali	10742,00	Fognatura Comunale (pvc Ø 315)	Rilevato	Comune di Frigento	Strada comunale Le Mattine	Occorre	€ 10 000,00				
41	F	Idrica	10743,00	condotta idrica in polietilene Ø 90	Rilevato	Alto Calore Servizi	Lungo la str. com. Le Mattine	Occorre	€ 28 500,00				
45	F	Telecomunicazioni	11367,00	Linea su pali	Galleria San Marco	Telecom	Linea sulla strada comunale San Marco	Occorre	€ 600,00				
47	F	Idrica	11570,00	condotta idrica in acciaio Ø 225 mm	Rilevato	Alto Calore Servizi	L'acquedotto attraversa la zona agricola	Occorre	€ 5 000,00				
48	F	Elettricità	12240,00	Linea MT su tralicci da 20.000 V	Galleria naturale Piano di San Filippo (imbocco lato Lioni - Sud)	ENEL distribuzione	Linea su tralicci in zona agricola	Occorre	€ 27 000,00	€ 49 552,43	49454,43		RIMBORSATA PER € 49.454,43
49	F	Elettricità	12310,00	Linea BT su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	ENEL distribuzione	In corrispondenza della strada comunale San Paolina Lappetra	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre
50	F	Telecomunicazioni	12322,00	Linea su pali	Galleria Piano di San Filippo	Telecom	In corrispondenza della strada comunale San Paolina Lappetra	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre
51	F	Elettricità	12725,00	Linea BT su pali	Galleria Piano di San Filippo	ENEL distribuzione	Linea su strada comunale Frigento	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre
52	F	Telecomunicazioni	12728,00	Linea BT su pali	Galleria San Paolo - Svincolo San Teodoro (Villamaina)	Telecom	Strada comunale Frigento	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre
53	F	Servizi comunali	12910,00	Illuminazione stradale di via San R	Galleria Piano di San Filippo	Comune di Frigento	strada comunale San Filippo	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre
54	F	Telecomunicazioni	13000,00	Linea su pali	Galleria Piano di San Filippo	Telecom	Linee in zona agricola in prossimità della SS303	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre

SSV LIONI-GROTTAMINARDA (DA PROGR. 6.500 A PROGR. 19.980)
RIPILOGO INTERFERENZE (AGG. 30.09.2018)
RAFFRONTO CON IMPORTI PREVISTI NEL PROGETTO ESECUTIVO

sigla	lotto	Tipo	Progressiva riferimento	Caratteristiche oggetto interferito	WBS opera in progetto	Ente Gestore	Note	Previsione * risoluzione	Costi risoluzione previsti nel P.E.	Costi in corso d'opera	Costi RIMBORSATI	Costi in corso di RIMBORSO	STATO
55	III	Elettricità	13035,00	Linea BT su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	ENEL distribuzione	Linea in zona agricola in prossimità della SS303	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre
56	III	Servizi comunali	13080,00	Illuminazione strada comunale	Galleria naturale Piano di San Filippo	Comune di Filigento	Via Piano S. Filippo	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre
57	III	Elettricità	13115,00	Linea BT su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	ENEL distribuzione	Via Piano S. Filippo	Non occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non occorre
58	III	Elettricità	13128,00	Linea BT su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	ENEL distribuzione	zona agricola nei pressi di Via Piano S. Filippo	Non occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non occorre
59	III	Telecomunicazioni	13260,00	Linea su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	Telecom	Via Piano S. Filippo in zona di accesso residenziale	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non occorre
60	III	Telecomunicazioni	13778,00	Linea su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	Telecom	strada comunale Fontana Tassola	Non occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non occorre
61	III	Telecomunicazioni	13780,00	Linea su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	Telecom	strada comunale Fontana Tassola	Non occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non occorre
62	I C	Idrica	14160,00	condotta idrica in acciaio 1/2"	Rilevato	Alto Calore Servizi	In prossimità del viadotto San Silvestro	Occorre	€ 0,00	€ 0,00			RISOLTA
63	I C	Telecomunicazioni	14168,00	Linea su pali	Viadotto San Silvestro	Telecom	Limite strada di accesso a residenze	Occorre	€ 11 000,00	€ 0,00			RISOLTA DA TELECOM
64	I C	Idrica	14232,00	condotta idrica in acciaio 1/2"	Viadotto San Silvestro	Alto Calore Servizi	Si trova sull'area dove deve essere costruita la pila	Occorre	€ 0,00	€ 0,00			RISOLTA
65	I C	Elettrica	14240,00	Linea MT su pali	Viadotto San Silvestro	ENEL distribuzione	Linea MT in zona agricola	Occorre	€ 9 000,00	€ 9 706,81	9608,81		RIMBORSATA PER € 9.608,81
65a	I C	Idrica	14342,00	condotta idrica in acciaio Ø 350 mm	Viadotto San Silvestro	Alto Calore Servizi	La condotta è ubicata in zona agricola	Occorre	€ 39 000,00	€ 44 555,64	44555,64		RIMBORSATA PER € 44.555,64
66	III	Telecomunicazioni	14683,00	Linea su pali	Galleria artificiale Gesualdo	Telecom	Strada comunale San Silvestro	Occorre	€ 5 000,00	€ 17 151,34		13723,07	CHIESTO RIMBORSO 80% PER € 13.723,07
68	III	Elettricità	14722,00	Linea BT su pali	Galleria artificiale Gesualdo - svinc. Gesualdo	ENEL distribuzione	Linea di B.T. in zona agricola	Occorre	€ 27 000,00	€ 17 622,71		17622,71	CHIESTO RIMBORSO PER € 17.622,71
71	III	Telecomunicazioni	15402,00	Telecom	Galleria Artificiale Valli	Telecom	Strada comunale Pescariello	Occorre	€ 600,00	€ 4 502,00		3603,6	CHIESTO RIMBORSO 80% PER € 3.603,60
73	III	Elettricità	15420,00	Linea BT su pali	Galleria artificiale Valli	ENEL	In zona agricola, in prossimità della str. com. Pescariello	Occorre	€ 27 000,00	€ 11 837,47		11837,47	CHIESTO RIMBORSO PER € 11.837,47
74	III	Elettricità	16349,00	Linea BT su pali	Galleria artificiale Sant'Andrea	ENEL distribuzione	Strada comunale contrada Sant'Andrea	Occorre	€ 9 000,00	€ 15 602,88		15602,88	CHIESTO RIMBORSO PER € 15.602,88
75	III	Telecomunicazioni	16350,00	Linea pali	Galleria Artificiale Sant'Andrea	Telecom	Strada comunale contrada Sant'Andrea	Occorre	€ 600,00	€ 5 274,40		4221,52	CHIESTO RIMBORSO 80% PER € 4.221,52
77	I C	Telecomunicazione	16992,00	Linea su pali	Galleria Le Macchie	Telecom	Strada comunale Le Macchie	Occorre	€ 5 000,00	€ 2 602,81	2084,25		RIMBORSATA 80% PER € 2.084,25
79	I C	Elettricità	17038,00	Linea BT su pali	Galleria Artificiale Le Macchie	ENEL distribuzione	in zona agricola	Occorre	€ 9 000,00	€ 13 049,26	12951,26		RIMBORSATA PER € 12.951,26
80	I C	Elettricità	17684,00	Linea MT su pali	Trincea	ENEL distribuzione	in zona agricola, prima della gall. artif. Pratola	Occorre	€ 27 000,00	€ 39 030,60	38932,00		RIMBORSATA PER € 38.932,00
81	I C	Elettricità	17747,00	Linea MT su pali	Galleria Pratola che sottopassa la SP 36.	ENEL distribuzione	Lungo la SP 36 che sovrappassa la gall. artif. Pratola.	Occorre	€ 18 000,00				
83	I C	Elettricità	17767,00	Linea MT su pali	Galleria artificiale Pratola	ENEL distribuzione	Strada provinciale sp 36	Occorre	€ 9 000,00				
84	I C	Elettricità	17840,00	Linea MT su pali	Trincea dopo la gall.artif. Pratola	ENEL distribuzione	zona agricola	Occorre	€ 18 000,00				
82	I C	Telecomunicazioni	17750,00	Linea interrata	Galleria Artificiale Pratola	Telecom	Strada Sp 36	Occorre	€ 24 000,00	€ 13 416,13	10734,9		RIMBORSATA 80% PER € 10.734,90
85	I C	Elettricità	18085,00	Linea MT su pali	Rilevato con deviazione stradale	Accorpato da ENEL distribuzione	Lungo la strada comunale Cimilero	Occorre	€ 18 000,00	€ 31 691,47	31691,47		CHIESTO RIMBORSO PER € 31.691,47
86	I C	Elettricità	18165,00	Linea MT su pali	Trincea		Lungo la strada interpodereale in prossimità del sottovia progr. 18 069.	Occorre					
87	I C	Elettricità	18922,00	Linea MT su pali	Rotatoria in corrispondenza della Galleria Artificiale SS 90	ENEL Distribuzione	in zona agricola	Occorre	€ 18 000,00	€ 33 117,19		33117,19	CHIESTO RIMBORSO PER € 33.117,19
									€ 1 302 400,00	€ 1 115 289,07	€ 296 004,42	€ 197 318,79	

LEGENDA	
	Autorizzate 1° Lotto Funzionale
	Autorizzate 1° Lotto Costruttivo
	Autorizzate 3° Stralcio
F	Previste 1° Lotto Funzionale
F	Previste 1° Lotto Costruttivo
III	Previste 3° Stralcio

6 dicembre 2018

MEMO CONTENZIOSI PASSIVI IN ESSERE CON TERZI

(CHE POSSONO COINVOLGERE INDIRETTAMENTE
ANCHE L'AMMINISTRAZIONE)

1. SSV LIONI – GROTTAMINARDA (1° Lotto progr. 6+500 - 19+980)

A. 1° LOTTO 1° STRALCIO FUNZIONALE

Non ci sono allo stato contenziosi che possono coinvolgere l'Amministrazione

B. 1° LOTTO 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO

N°	Tipologia	Proponente	Resistente	Motivazione	Stato del contenzioso	Prossima udienza
1	Ricorso al Presidente della Repubblica in data 26 maggio 2016	Espropriati vari	Consorzio INFR.AV.	Richiesta di annullamento del Decreto di occupazione di urgenza n° 1494 del 13 gennaio 2016	INFR.AV. ha proposto controdeduzioni	Non ci sono aggiornamenti sullo stato del ricorso
2	Ricorso presso la Corte di Appello di Napoli	Cogliano Angelo e Teresina (Espropriati)	Consorzio INFR.AV	Opposizione alla stima determinata ex art. 21 DPR 327/2001	Si è tenuta una prima udienza il 24 ottobre 2018	Nell'Udienza del 24/10/2018 il Giudice si è riservato se respingere il ricorso o procedere alla nomina di un CTU
3	Ricorso presso la Corte di Appello di Napoli	Cogliani Pasquale e Nardi Rosa (Espropriati)	Consorzio INFR.AV	Opposizione alla stima determinata ex art. 21 DPR 327/2001	Non ci sono ancora state udienze	6 marzo 2019
4	Richiesta danni	Uva Michele	Società ICI (Consorzata INFR.AV.), Consorzio INFR.AV. e Assicuraz. di ICI	Richiesta danni per interclusione fondi	Si è tenuta una udienza il 10 aprile 2018; il Giudice ha rimandato per ulteriori provvedimenti all'11 aprile 2019	11 aprile 2019

Al. 9

28/12/2018

CONS.	TRATTO	COMM.TE	NOTA CONCESSIONARIO	DATA ARRIVO NOTA AL D.L.	IMPRESA SUB-APPATTRICE	LAVORI	IMPORTO CONTRATTO	DI CUI PER LAVORI	PER SICUREZZA	NOTE D.L.	AUTORIZ. R.U.P.	COORD.AMMIN. CARLO VITALE (da 25/07/16)	AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFR. E TRASP. PROV. INTERR. OO.PP. CAMPANIA-MOLISE	AUTORIZZAZIONE COMMISSARIO AD ACTA	NOTE
Infr.Av.	1° STRALCIO FUNZIONALE	S.A.F.3 S.r.l.	27.04.18 n. 894	27/04/2018	"POLIMAR S.a.s."	Servizio riparazione con sostituzione vasca maturazione provini c/s	€ 130,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	1° STRALCIO FUNZIONALE	S.A.F.3 S.r.l.	27.04.18 n. 895	27/04/2018	"OFFICINE DE LUCA"	Servizio riparazione mezzi cantiere	€ 687,41	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	1° LOTTO 3° STRALCIO	MARINO	14.05.18 n. 988	14/05/2018	"DOTT. GIOVANNI VITILLO"	Servizi professionali di consulenza botanica/forestale	€ 5 000,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	1° LOTTO 3° STRALCIO	I.C.I. S.p.A.	21.05.18 n. 1047	21/05/2018	"C.F.S. Centro per la Formazione e Sicurezza in edilizia"	Servizi corsi di formazione	€ 5 000,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO	CONDOTTE	14.06.18 n. 1202	18/06/2018	ATI "INGEO S.r.l./GEOING S.r.l."	Servizio indagini geognostiche/geofisiche integrative	€ 133 736,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO	CONDOTTE	10.10.18 n. 2024	12/10/2018	ATI "INGEO S.r.l./GEOING S.r.l."	Comunicazione distacco personale per 1 mese da IGEO S.a.s. a INGEO S.r.l. Mandataria	€ 5 000,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	1° LOTTO 3° STRALCIO	I.C.I. S.p.A.	18.07.18 n. 1466	18/07/2018	"PROTOS CHEC S.r.l."	Monitoraggio lavori per rilascio polizza decennale di esecuzione	€ 16 200,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	1° LOTTO 2° STRALCIO	I.C.I. S.p.A.	27.08.18 n. 1680	27/08/2018	"OFFICINA MECCANICA IRPINIA MOTORI DI ROBERTO GIUSEPPINA & C. S.a.s."	Servizi di manutenzione mezzi cantiere	€ 5 000,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	1° LOTTO 3° STRALCIO	MARINO	10.10.18 n. 2012	12/10/2018	"ING. GAETANO SAGLIOCCA"	Servizi professionali di progettazione illuminotecnica	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	1° LOTTO 2° STRALCIO	MARINO	18.10.18 n. 2102	19/10/2018	"MYO S.p.A."	Fornitura cancelleria	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	1° LOTTO 3° STRALCIO	MARINO	22.10.18 n. 2133	23/10/2018	"MULTI COM S.r.l."	Servizio manutenzione stampante laser	€ 5 000,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	1° LOTTO 3° STRALCIO	MARINO	22.10.18 n. 2135	23/10/2018	"GEOCONSULTLAB S.r.l."	Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 8 200,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	1° LOTTO 3° STRALCIO	MARINO	22.10.18 n. 2137	23/10/2018	"BELARDO ANGELO ECOLOGIA"	Servizio smaltimento rifiuti lavorazioni cantiere	€ 2 800,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
Infr.Av.	1° LOTTO 3° STRALCIO	MARINO	05.12.18 n. 2517	05/12/2018	"BELARDO ANGELO ECOLOGIA"	ATTO AGGIUNTIVO PER TOTALI 10.000,00	€ 7 200,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					

CONSORZIO INFR.AV.

CONCESSIONE del 14/09/1982

ACCORDO QUADRO del 28/07/2010

CONTRATTI STRALCIO

CONTRATTO 1° STRALCIO - 1° Lotto FUNZIONALE del 23/01/2013

CONTRATTO 1° STRALCIO - Atto Integrativo N° 1

CONTRATTO 1° STRALCIO - Atto Integrativo N° 2

<u>Consegna lavori</u>	del	31/01/2013	
<u>Tempo contrattuale</u>	gg	1460	
<u>Data Ultimazione</u>		30/01/2017	
<u>Nuova data ultimazione (Decreto Com.le N° 1618)</u>		11/08/2017	
<u>Nuova data ultimazione (Atto Transazione)</u>		31/12/2018	
STATO AVANZAMENTO LAVORI	in corso	72%	SAL n° 26 al 31/10/18

CONTRATTO 2° STRALCIO - 1° Lotto COSTRUTTIVO del 16/09/2015

<u>Consegna lavori espropri</u>	del	17/09/2015	
<u>Consegna lavori</u>	del	16/11/2015	
<u>Tempo contrattuale</u>	gg	1096	
<u>Data Ultimazione</u>		16/11/2018	
<u>Nuova data ultimazione (Atto Transazione)</u>		30/06/2019	
STATO AVANZAMENTO LAVORI	in corso	44%	SAL n° 11 al 31/08/18

CONTRATTO 3° STRALCIO -

<u>Consegna lavori</u>	del	25/09/2017	
<u>Tempo contrattuale</u>	gg	1215	
<u>Data Ultimazione</u>		23/01/2021	
STATO AVANZAMENTO LAVORI	in corso	2,42%	SAL n° 4 al 31/08/18

CONSORZIO INFRASUD

CONCESSIONE del 14/09/1982

ACCORDO QUADRO del 28/07/2010

CONTRATTI STRALCIO

CONTRATTO 1° STRALCIO - 2° Lotto del 25/07/2017

<u>Consegna lavori</u>	del	18/09/2017
<u>Tempo contrattuale</u>	gg	973
<u>Data Ultimazione</u>		18/05/2020

STATO AVANZAMENTO LAVORI

Lavori di 1° lotto 1° stralcio

CAUSALE	IMPORTI CERTIFICATI	MANDATI	
		N.	Data
1° S.A.E.	272.200,00	77	30.7.14
2° S.A.E.	310.100,00	186	10.12.14
3° S.A.E.	79.500,00	4	20.2.15
4° S.A.E.	342.500,00	51	19.3.15
5° S.A.E.	76.400,00	134	10.8.15
6° S.A.E.	95.300,00	199	29.10.15
7° S.A.E.	41.285,00	279	26.10.16
8° S.A.E.	17.653,54	233	3.8.17
TOTALE	1.234.938,54		

CAUSALE	IMPORTI CERTIFICATI	MANDATI	
		N.	Data
1° S.A.L.	496.125,12	187	10.12.14
2° S.A.L.	402.919,21	135	10.8.15
3° S.A.L.	389.299,41	136	10.8.15
4° S.A.L.	411.715,27	137	10.8.15
5° S.A.L.	436.347,88	203	4.11.15
6° S.A.L.	1.411.745,52	215	9.12.15
7° S.A.L.	2.376.720,68	214	4.12.15
8° S.A.L.	1.823.859,73	172	3.5.16
9° S.A.L.	1.099.946,26	217	27.5.16
10° S.A.L.	2.194.230,93	218	1.6.16
11° S.A.L.	767.750,11	253	20.9.16
12° S.A.L.	1.271.340,49	278	26.10.16
13° S.A.L.	1.578.727,40	331	27.12.16
14° S.A.L.	2.553.725,02	122	7.3.17
15° S.A.L.	1.620.383,84	154	4.4.17
16° S.A.L.	1.198.265,03	237	7.8.17
17° S.A.L.	2.749.956,69	237	7.8.17
18° S.A.L.	2.347.756,88	240	7.9.17
19° S.A.L.	3.683.248,97	298	8.11.17
20° S.A.L.	3.927.561,21	132	30.1.18
21° S.A.L.	5.693.426,08	143	22.2.18
22° S.A.L.	840.195,18	187	10.4.18
23° S.A.L.	1.088.281,29	279	20.7.18
24° S.A.L.	1.668.534,17	324	3.10.28
25° S.A.L.	1.277.950,37	416	30.11.18
TOTALE	43.319.012,61		

Lavori di 1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo

CAUSALE	IMPORTI CERTIFICATI	MANDATI	
		N.	Data
1° S.A.E.	328.909,13	297	7.12.16
2° S.A.E.	282.788,18	123	7.3.17
3° S.A.E.	8.387,21	234	3.8.17
4° S.A.E.	28.366,17	143	22.2.18
TOTALE	648.450,69		

CAUSALE	IMPORTI CERTIFICATI	MANDATI	
		N.	Data
1° S.A.L.	72.235,01	333	27.12.16
2° S.A.L.	140.295,24	238	7.8.17
3° S.A.L.	1.997.161,19	239	7.8.17
4° S.A.L.	3.033.267,57	241	7.9.17
5° S.A.L.	5.363.674,52	133	5.2.18
6° S.A.L.			
7° S.A.L.	2.593.797,23	166	26.3.18
Saldo 5 - 6 - 7 quota Condotte	2.430.782,59	245	28.5.18
8° S.A.L.	1.489.578,49	246	1.6.18
9° S.A.L.	2.610.189,86	314	12.9.18
10° S.A.L.	2.400.138,28	336	24.10.18
11° S.A.L.	1.390.329,38	456	20.12.18
TOTALE	23.521.449,36		

TOTALE PAGATO 70.728.036,45

Lavori di 1° lotto 3° stralcio

CAUSALE	IMPORTI CERTIFICATI	MANDATI	
		N.	Data
1° S.A.E.			
2° S.A.E.			
3° S.A.E.			
4° S.A.E.			
TOTALE	0,00		

CAUSALE	IMPORTI CERTIFICATI	MANDATI	
		N.	Data
1° S.A.L.			
2° S.A.L.	177.200,67	312	28.8.18
3° S.A.L.	520.974,33	432	7.12.18
4° S.A.L.	1.306.010,25	457	20.12.18
TOTALE	2.004.185,25		



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta - art. 86 L. 289/02

COMPLETAMENTI EX ART. 32 L. 219/81

Promemoria circa tipologia adempimenti più urgenti ed informazioni di indirizzo

- La questione espropriativa (ricognizioni, ricostruzioni documentali, frazionamenti, transazioni, depositi definitivi, recuperi ecc.) è molto complessa pur se da tempo riportata in canali positivamente verificati e sperimentati da questo Ufficio sotto il profilo amministrativo e giuridico. Tuttavia, a tutt'oggi restano da definire ancora alcune delle migliaia di ditte e particelle interessate da procedure espropriative risalenti anche a decenni fa.

Ferma restando la precisione, l'alta definizione e la conservazione di tutte le pratiche evase, sembra necessario sottolineare la delicatezza della materia e l'urgenza di acquisire da parte del Soggetto che subentrerà a questo Ufficio conoscenza della situazione generale e dei casi di dettaglio.

- Analogamente il Soggetto subentrante, che sia il medesimo o meno di cui sopra, dovrà senza indugi rendersi disponibile per il supporto alla Div. II[^]/DGIAl in relazione ai contenziosi (pure in genere risalenti anche a vari lustri) ed una volta definiti, provvedere a chiudere contabilmente e contrattualmente i progetti relativi.
- I lavori residui di completamento riguardano il recupero del Viadotto Ficocchia (da consegnare; al momento la consegna è interrotta per interdittiva Prefettizia ed udienza fissata per il 27.2.2019), lo Svincolo di Muro Lucano (da effettuare gara) ed eventualmente l'illuminazione dello Svincolo di Rapone (da effettuare gara).
Le documentazioni sono presso la sede Commissariale di Salerno ed il Provveditorato OO.PP. sede di Potenza.
Sussiste inoltre qualche richiesta di interventi aggiuntivi rientranti in un concetto di completamento funzionale da parte dei Comuni di Pescopagano e Castelgrande.
- Sono in corso di ultimazione (gennaio 2019) i lavori di pannellatura della Galleria Montenuovo, che consentiranno l'avvio della procedura di consegna all'ANAS dell'ultima tratta della Viabilità Nerico – Muro Lucano. Il Soggetto subentrante dovrà pertanto provvedere urgentemente a completare tali operazioni di consegna.
- I monitoraggi sui lavori Commissariali infrastrutturali ex art. 32 L. 219/81 vengono effettuati dal Provveditorato OO.PP. sede di Potenza (i completamenti infrastrutturali in Campania sono da anni conclusi e le opere in esercizio). L'Ufficio Commissariale provvede comunque a verifiche e controlli e richiede annualmente verifiche antimafia. Ogni nuovo contratto è accompagnato da Patto di Integrità.

- Caso a sé stante è rappresentato dal Prog. 6053, trasferito dal MiSE a questo Ufficio solo nell'agosto 2017 ma per il quale non sono state ancora consegnate dal MiSE stesso le necessarie documentazioni progettuali, contabili e di collaudo. Tale collaudo è risultato peraltro inidoneo e lo scrivente Ufficio ha anche attivato l'AGS per l'eventuale recupero di somme a carico dei collaudatori ancora aggredibili.
- Particolare cura è sempre stata posta nella tempestività dei pagamenti (previe verifiche di competenza), tempestività che consente di recuperare alcuni ritardi nella contabilizzazione dei lavori, affidata essenzialmente al Provveditorato sedi di Napoli e Avellino.

Tale rapidità nei pagamenti è essenziale ad evitare interessi a favore del creditore.

Le documentazioni di progetto e contrattuali sono reperibili presso il Provveditorato sede di Potenza. Presso gli Uffici Commissariali di Roma e Salerno sono conservati tutti gli atti amministrativi, dispositivi contabili ed economico-finanziari.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. *Filippo D'Ambrosio*)



Elenco Allegati:

1. Relazione sui lavori ex comma 2
2. Tabella stato appalti lavori e consegne
3. Relazione su procedure espropriative
4. Pro-memoria per acquisizioni aree demaniali
5. Nota DGLAI/Div.II stato attuale dei contenziosi
6. Elenco transazioni (1^ e ultima pagina)
7. Altre transazioni
8. Elenco decreti definitivi di esproprio
9. Elenco depositi
10. Tabella progetti chiusi e da chiudere



Commissario ad Acta
ex art. 86 L. 289/02

Ministero dello Sviluppo Economico

Relazione tecnica, amministrativa, contabile
progetti di completamento
ex c.2 art. 86 L. 289/02

MiSE - Viale America, 201 - 00144 R O M A
Tel. 0654927818 - fax 0654927828

filippo.dambrosio@mise.gov.it - commissariadacta@pec.mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

Relazione tecnica, amministrativa, contabile progetti di completamento ex c. 2 art. 86 L. 289/02

Lavori in corso o/o in fase di chiusura contabile

I completamenti ex c. 2 art. 86 L. 289/02 riguardano le viabilità Nerico- Muro Lucano – Calitri – Baragiano e Calitri – Ofantina e relativo svincolo la cui esecuzione era stata affidata negli anni '80 in concessione all'ATI ICLA S.p.A. oggi in liquidazione, con specifiche Convenzioni successivamente revocate dal MiSE.

Per la chiusura di tutte le attività connesse con il terremoto Irpinia è stato nominato nel febbraio 2003 un Commissario ad Acta, ivi inclusi i completamenti dei suddetti lavori rimasti per anni in abbandono.

I progetti di completamento infrastrutturale interessati, come individuati dal MISE in sede di trasferimento al Commissario, sono:

- n. 39/60/6057- Viabilità Nerico-Muro Lucano
- n. 39/60/6062 – Viabilità Muro Lucano-Baragiano
- n. 39/40/6063 – Viabilità Calitri-Ofantina
- n. 39/40/6064 – Svincolo strada Calitri-Ofantina

Un cenno a parte va fatto per il prog. 6053, già in Concessione al Consorzio CO.INFRA., trasferito con D.M. del 2.8.2017 e riportato in fondo alla presente Relazione.¹

PROG. n.39/60/6057 – VIABILITA' NERICO-MURO LUCANO

I lavori originariamente previsti in un unico progetto sono stati suddivisi, per motivi tecnico funzionali, in tre lotti, l'ultimo dei quali in ulteriori 2 stralci, ridenominati e rinumerati 39/60/COM/6057/01 – 1° lotto, 39/60/COM/6057/02 – 2° lotto, 39/60/COM/6057/03-01 – 3° lotto 1° stralcio, 39/60/COM/6057/03-02 – 3° lotto 2° stralcio e in un ulteriore progetto numerato 39/60/COM/6057/SF relativo alla sistemazione definitiva del viadotto Ficocchia.

¹ I restanti 67 progetti trasferiti al Commissario (v. c.1 art. 86 L. 289/02) richiedevano modesti interventi costruttivi ma notevoli incombenze in campo amministrativo-contabile, espropriativo, contenzioso, ecc.

L'asse principale ha una lunghezza complessiva di circa 28 Km. ed ha caratteristiche geometriche del tipo C V secondo le norme CNR con una carreggiata di m. 9,50 costituita da due corsie da m. 3,50 ciascuna e da due banchine laterali da m. 1,25 ciascuna. Le diverse viabilità secondarie hanno una carreggiata che a seconda dell'importanza delle singole viabilità varia per ciascuna di esse da un minimo di m. 4 a m. 6.

Prog. n. 39/60/COM/6057/01

Lavori del I° lotto: (Collegamento Nerico – Pescopagano lunghezza tratta di circa 5 Km. + bretella per Pescopagano lunghezza tratta di circa 4 Km).

L'importo del progetto del I lotto ammonta a € 5.306.734,09 di cui € 2.540.780,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a € 94.825,99 appaltati all'Impresa Calabria Pasquale s.r.l., € 596.461,57 per lavori connessi compresi oneri di sicurezza pari a € 19.946,37 appaltati all'Impresa Basso Costruzioni s.r.l. ed € 2.169.492,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Tutti i lavori del 1° lotto sono ultimati, collaudati, consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti in via anticipata provvisoria, divenuta definitiva una volta approvati i collaudi t.a., nei rapporti Mise/Provincia (Provincia di Potenza, Provincia di Avellino) ed in parte in via definitiva (ANAS e Comune di Pescopagano) e regolarmente aperti al traffico.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) chiusura contabile progetto.

Si segnala che non sussistono riserve.

A fronte dell'importo originario impegnato di € 5.306.734,09 sono stati erogati complessivamente € 4.831.257,25 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di € 475.476,84.

Prog. n. 39/60/COM/6057/02

Lavori del II lotto: (Collegamento svincolo per Pescopagano con svincolo di Muro Lucano lunghezza tratta circa 21 Km.).

L'importo del progetto del II lotto dei lavori di completamento ammonta attualmente a € 22.557.195,31 di cui € 15.391.561,83 per lavori principali compresi oneri di sicurezza

pari a €.321.750,68, €. 148.260,00 per spese di progettazione esecutiva, €. 527.547,33 compresi oneri di sicurezza per il progetto redatto da questo Ufficio, dei lavori di ripristino della funzionalità del viadotto Farenga (inseriti tra le somme a disposizione) ed €. 7.017.373,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori relativi al viadotto Farenga).

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. AKEI Costruzioni Generali S.r.l. ed altri.

I lavori principali sono stati ultimati in data 23.12.2016.

Sono state collaudate staticamente tutte le opere d'arte realizzate.

E' stato altresì emesso il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo in data 6.10.2017 approvato con decreto commissariale n. 1784 del 4.12.2017.

Le opere relative al tratto di circa Km. 3,5 compreso tra lo svincolo di Pescopagano (Progr. Km. 5+800) e lo Svincolo di Rapone (Progr. Km. 9+450 circa) + la galleria artificiale Km. 9+100 sono state consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza, e regolarmente aperte al traffico, con verbale in data 24.7.2014 approvato con decreto commissariale n. 1282 del 3.9.2014 pubblicato nella GURI n. 229 del 2.10.2014. Con l'approvazione del collaudo detta consegna è divenuta definitiva per quanto riguarda i rapporti tra Mise e Provincia.

All'attualità anche le n. 5 viabilità secondarie realizzate sono state consegnate, per quanto di competenza, al Comune di Muro Lucano con verbale in data 14.9.2017 approvato con decreto commissariale n. 1720 del 3.10.2017 pubblicato nella GURI n. 286 del 7.12.2017 e al Comune di Castelgrande con verbale in data 11.10.2017 approvato con decreto commissariale n. 1728 del 23.10.2017 pubblicato nella GURI n. 291 del 14.12.2017. Anche dette consegne sono divenute definitive con l'approvazione del collaudo.

Si sottolinea che tutte le restanti tratte dell'asse principale, tutte, come detto, collaudate, non potendo ancora essere trasferite in via definitiva all'ANAS nelle more della funzionalità della intera tratta Nerico-Muro Lucano, sarebbero state come di norma consegnate da questo Ufficio in via provvisoria alla Provincia e nella fattispecie a quella di Potenza. Tuttavia, stante il rifiuto della Provincia alla presa in carico per problematiche gestionali, a seguito di incontri e corrispondenza con la Regione Basilicata, era stata concordata la consegna di tutte le restanti opere realizzate alla medesima Regione Basilicata e da quest'ultima contestualmente consegnate all'ANAS quale soggetto gestore.

A seguito di successivi contatti e riunioni è stato successivamente stabilito di procedere direttamente alla consegna definitiva all'ANAS, stante peraltro l'intervenuto decreto di statizzazione del 20.2.2018 pubblicato nella GURI n. 98 del 28.4.2018. E' stata quindi effettuata la predisposizione degli atti ulteriori e di dettaglio richiesti dall'ANAS medesima per la citata consegna definitiva, comunque possibile stante l'intervenuta collaudazione tecnico-amministrativa di tutte le opere oltre che statica. La consegna della citata documentazione è avvenuta in data 19.3.2018 (v. nota prot. n. 30511 del 16.3.2018) presso l'ANAS di Potenza. Numerose ulteriori documentazioni specifiche sono state richieste nel frattempo dalla stessa ANAS.

Sopralluoghi congiunti sui lavori sono stati quindi effettuati in data 21.3.2018 e in data 6.6.2018.

A seguito della richiesta dell'ANAS S.p.A. formulata in data 13.6.2018 in sede di ulteriore riunione presso la Regione Basilicata, lo svincolo di Castelgrande, rientrante nelle opere del 3° lotto 1° stralcio, è stato consegnato al Comune di Castelgrande a partire dagli inviti sull'asse da questo Ufficio con verbale in data 30.7.2018 approvato con decreto Commissariale n. 1936 del 2.8.2018, pubblicato nella GURI n. 217 del 18.9.2018.

Con verbale in data 31.7.2018 approvato con decreto commissariale n. 1937 del 3.8.2018, pubblicato anch'esso nella GURI n. 217 del 18.9.2018, sono state consegnate in via definitiva all'ANAS S.p.A. le opere della viabilità Nerico-Muro Lucano realizzate in parte con il progetto di 2° lotto e in parte con il progetto di 3° lotto 1° stralcio, costituite dal tratto di asse principale compreso tra la progr. Km. 15+800 (escluso svincolo di Castelgrande) e la progr. Km. 27+500 (uscita per Muro Lucano).

Si rappresenta che l'ANAS S.p.A. ha richiesto altresì:

- 1) la realizzazione di alcuni interventi urgenti di miglioramento al fine di garantire l'immediata apertura del tratto funzionale della strada compreso tra lo svincolo di Castelgrande e l'uscita per Muro Lucano;
- 2) la produzione di documentazione espropriativa particolareggiata;
- 3) la rilevazione dei dati necessari per l'inserimento nel DB di catasto ANAS;
- 4) la realizzazione di un rilievo al fine di realizzare complessi elaborati atti a determinare gli esatti elementi geometrici dell'asse viario in argomento.

Per quanto riguarda il precedente punto 1) è stato redatto dal Direttore dei Lavori principali, nell'ambito del progetto generale di 3° lotto 1° stralcio, il progetto dei lavori urgenti di miglioramenti richiesti dall'ANAS per l'importo di €. 41.430,89 di cui

€ 38.934,86 per lavori da assoggettare a ribasso, € 703,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.792,76 per somme a disposizione. Detto progetto è stato approvato con decreto commissariale n. 1925 del 9.7.2018. L'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. dei citati lavori all'Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. (prot. n. 31.911 del 9.8.2018) per l'importo di € 37.182,79 al netto del ribasso offerto del 4,50% oltre oneri di sicurezza pari a € 703,27. Detti lavori sono stati ultimati il giorno 31.8.2018 ed è stata certificata in data 11.9.2018 dal D.L. la regolare esecuzione attestando l'importo totale dei lavori eseguiti in € 37.885,19 di cui € 37.181,92 per lavori e € 703,27 per oneri di sicurezza.

Per quanto riguarda le attività di cui al precedente punto 2) l'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. all'ing. Aniello Artiago (prot. n. 32.194 del 18.9.2018) per la predisposizione dei Piani Particellari di Esproprio grafici e descrittivi ed attività connesse per l'importo di € 33.000,00. Il termine per l'ultimazione delle citate attività è stato stabilito entro il 15 febbraio 2019. In data 6.12.2018 sono stati consegnati, come da contratto, gli elaborati relativi ad un primo tratto di viabilità dalla progressiva Km. 16+100 alla progressiva Km. 27+500.

Per quanto riguarda le attività di cui al precedente punto 3) l'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. allo Studio Tecnico Guarino & De Bonis (prot. n. 32.177 del 14.9.2018) per le attività di rilevazione dei dati necessari per l'inserimento nel DB di catasto per l'importo di € 35.989,00. Il termine per l'ultimazione delle citate attività è stato stabilito entro il 12 gennaio 2019. In data 13.11.2018 sono state completate le attività di cui sopra relative sempre al citato tratto di viabilità dalla progressiva Km. 16+100 alla progressiva Km. 27+500.

Per quanto riguarda le attività di cui al precedente punto 4) l'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. alla Società Areatecnica s.r.l. (prot. n. 32.217 del 19.9.2018) per le attività di realizzazione di un rilievo per l'importo di € 39.000,00. Il termine per l'ultimazione delle citate attività è stato stabilito entro il 29.12.2018. Anche per queste ultime attività sono stati consegnati in data 19.11.2018 gli elaborati relativi al medesimo tratto di cui sopra.

L'ANAS S.p.A. ha, altresì, richiesto successivamente l'installazione di segnaletica integrativa in corrispondenza dell'innesto con Muro Lucano. Detti lavori, il cui progetto è stato redatto dal Direttore dei Lavori principali, nell'ambito del progetto generale di 3° lotto 1° stralcio, sono stati affidati dall'Ufficio Commissariale che ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. alla Società C.G.A. s.r.l. di Brienza (PZ) (prot. n. 32.118 del 10.9.2018) per l'importo di € 4.414,24. L'ultimazione delle citate attività è intervenuta in data 6 ottobre 2018 e in data 15 ottobre 2018 è stata certificata la regolarità dell'esecuzione.

Nell'ambito del presente 2° lotto dei lavori è stato approvato il progetto, redatto da questo Ufficio, dei lavori di ripristino della continuità della pista esistente – tratto compreso tra la progr. Km. 11+000 e Km. 11+400. Per l'esecuzione di detti lavori si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016, all'ATI Akei esecutrice dei lavori principali. La Direzione dei Lavori è affidata a funzionario di questo Ufficio. Detti lavori sono stati ultimati in data 28.7.2017 ed è stata dichiarata la regolarità dell'esecuzione con atto in data 15.9.2017.

I lavori di ripristino della funzionalità strutturale del Viadotto Farenga dal Km. 25+130 al Km. 25+340 aggiudicati all'Impresa Tecnologie Stradali s.r.l. a seguito di gara pubblica esperita dal Provveditorato OO.PP. di Potenza per l'importo netto di € 484.401,47 oltre oneri di sicurezza pari a € 43.300,00, previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione relative al progetto generale unitamente alle relative ulteriori somme a disposizione pari a € 68.374,35, sono stati ultimati in data 25.9.2017, giusta certificato di ultimazione e, comprese lavorazioni marginali, in data 21.11.2017, giusta attestazione del D.L.. Dette opere sono state collaudate staticamente ed è intervenuto il collaudo tecnico-amministrativo con certificato in data 25.5.2018 approvato con decreto commissariale n. 1984 del 5.11.2018.

In fase di esecuzione dei citati delicatissimi lavori è risultata una anomalia, riscontrata dal Consulente Tecnico dell'Ufficio Commissariale, in corrispondenza delle testate della longherina centrale. Pertanto sono stati eseguiti i lavori di saldatura carpenteria di collegamento longherine del viadotto Farenga affidati per l'importo di € 38.688,22 alla citata Impresa Tecnologie Stradali s.r.l. ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017. Detti lavori sono stati ultimati in data 7.12.2017, giusta certificato del D.L. ed è stata dichiarata la regolarità dell'esecuzione con

atto in data 18.12.2017 per l'importo di €. 38.669,85.

Resta da consegnare soltanto il tratto compreso tra lo svincolo di Rapone (progr. Km. 9+450) e lo svincolo di Castelgrande (progr. Km. 15+800). La consegna di tale ulteriore tratto è stata subordinata da ANAS S.p.A. all'esecuzione di lavori di risanamento all'interno della galleria Montenuovo, lavori previsti nell'ambito del progetto di 3° lotto 1° stralcio.

Le attività residue in avanzato corso riguardano:

- 1) pagamento saldo lavori;
- 2) completamento procedure espropriative;
- 3) chiusura contabile progetto;
- 4) Risoluzione riserve ATI Akei, già oggetto delle Relazioni del D.L., del Collaudatore, del RUP. Attualmente l'ATI Akei è sottoposta ad interdittiva della Prefettura di Napoli.

A fronte dell'importo attualmente impegnato di €. 22.557.195,31 sono stati erogati complessivamente €. 20.161.946,45 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 2.395.248,86.

La cura e l'attenzione sempre posta dall'Ufficio Commissariale nel garantire sicurezza, affidabilità progettuale e competenza direzionale (affidata sempre a funzionari pubblici) hanno consentito risultati importanti oltre che in termini tecnici per la professionalità dei medesimi funzionari anche in termini economici.

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-01

Lavori del III lotto 1° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano – Svincolo di Castelgrande – n.4 cavalcavia).

L'importo del progetto del 1° stralcio del 3° lotto ammonta attualmente a €.23.140.992,42 di cui €.18.145.616,39 per lavori principali compresi oneri di sicurezza, €.161.292,00 per spese di progettazione e €. 4.108.424,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Tra dette somme a disposizione sono compresi €. 999.340,40 compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.367,55 per lavori di risanamento della galleria Montenuovo e €. 29.737,19 compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.396,71 per lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle del Comune di Muro Lucano.

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. Troiano s.a.s.

di Troiano Lucio & C. ed altri.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 6.4.2017 ed è stato emesso il certificato di collaudo in data 5.12.2017 approvato con decreto commissariale n. 1807 del 15.12.2017 con accertamento di una economia di €. 628.564,10 dovuta essenzialmente ad una ridotta lavorazione sull'asse entro il quinto. Detta somma sarà utilizzata per la realizzazione dello svincolo di Muro Lucano a livelli sfalsati, che L'ANAC, su richiesta di parere di questo Ufficio, non aveva (sorprendentemente comunque) ritenuto opera complementare.

Le opere relative all'impianto di illuminazione galleria artificiale Progr. Km. 9+100 circa sono state consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza con verbale in data 24.7.2014 approvato con decreto commissariale n. 1282 del 3.9.2014 pubblicato nella GURI n. 229 del 2.10.2014. Come già segnalato al paragrafo precedente, con l'approvazione del collaudo detta consegna è divenuta definitiva per quanto riguarda i rapporti tra Mise e Provincia.

All'attualità anche le n. 4 viabilità secondarie realizzate sono state consegnate, per quanto di competenza, al Comune di Muro Lucano e al Comune di Castelgrande con verbali in data 10.10.2017 approvati con decreti commissariali n. 1726 e n. 1727 del 23.10.2017 pubblicati nella GURI n. 291 del 14.12.2017. Dette consegne sono divenute definitive con l'approvazione del collaudo.

Tutti i collaudi statici risultano redatti e si è provveduto alla certificazione ex art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 ai fini della presa in consegna anticipata delle opere in argomento. Per la consegna delle opere principali vedasi punto precedente.

Per quanto riguarda i lavori di risanamento della galleria Montenuovo, consistenti essenzialmente nella posa in opera di pannelli di rivestimento, il cui progetto è stato redatto da questo Ufficio, si rappresenta che i medesimi lavori, aggiudicati all'Impresa Pietro Falbo di Luzzi (CS) per l'importo al netto del ribasso di €. 695.922,05, consegnati il 1° ottobre p.v. in via d'urgenza e sotto riserva di legge nelle more del perfezionamento del contratto d'appalto, dovranno essere ultimati entro la fine del mese di gennaio 2019. All'attualità tali lavori sono in avanzata fase di realizzazione ed è stato emesso un 1° SAL alla data del 3.12.2018 per un importo di €. 304.795,63.

I lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle di Muro Lucano realizzati dall'ATI Troiano esecutrice dei lavori principali, e diretti da funzionario di questo Ufficio, sono stati ultimati in data 5.7.2017 ed è stata dichiarata la regolarità dell'esecuzione con atto in data 10.7.2017. Detta viabilità è compresa nelle n. 4 viabilità secondarie consegnate al Comune di Muro Lucano con il citato verbale in data 10.10.2017.

Inoltre risulta esaminato favorevolmente, con prescrizioni, il progetto redatto da questo Ufficio relativo all'illuminazione dello svincolo di Rapone che, tuttavia all'attualità non potrà essere affidato da parte di questo Ufficio la cui scadenza è al 31.12 p.v..

Le attività residue riguardano:

- 1) pagamento saldo lavori;
- 2) completamento procedure espropriative,
- 3) completamento lavori di risanamento della galleria Montenuovo;
- 4) realizzazione illuminazione dello svincolo di Rapone;
- 5) chiusura contabile progetto;
- 6) risoluzione riserve ATI Troiano.

L'ANAS sostiene di non poter prendere al momento in consegna la tratta dallo svincolo di Rapone (progr. Km. 9+450) allo svincolo di Castelgrande (progr. Km. 15+800), prima del completamento dei citati lavori di risanamento della galleria Montenuovo, in corso. Il sottoscritto non condivide tale posizione, ma ad evitare conflitti istituzionali, si astiene dall'imporre il trasferimento delle opere con Decreto. C'è infatti da sottolineare che tali opere restano di fatto senza manutenzione e senza custodia, non essendo titolato il Commissario ad intervenire in tal senso.

A fronte dell'importo attualmente impegnato di €. 23.140.992,42 sono stati erogati complessivamente €. 19.861.408,09 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.3.279.584,33.

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-02

Lavori del III lotto 2° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano).

L'importo del progetto preliminare del 3° lotto 2° stralcio (approvato con decreto commissariale n. 1324 del 4.12.2014, ammonta a € 7.415.648,67 di cui € 6.439.914,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 126.272,82 ed € 975.734,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

All'attualità risulta completata la progettazione esecutiva per l'importo di € 11.000.000,00 di cui € 10.067.635,20 per lavori comprensivi di € 162.595,56 di oneri di sicurezza. In relazione a detta progettazione è stato emesso dal C.T.A. parere favorevole all'approvazione, con prescrizioni, con Voto n. 73 del 12.10.201. Risulta in fase di indizione Conferenza dei Servizi per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

Occorre purtroppo sottolineare che i tempi operativi del Provveditorato sono particolarmente lunghi.

Le attività residue riguardano pertanto:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) affidamento ed esecuzione lavori;
- 3) collaudazione, consegna opere, chiusura contabile.

A fronte dell'importo impegnato di € 7.415.648,67 sono stati erogati complessivamente € 53.230,62 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di € 7.362.418,05.

Prog. n. 39/60/COM/6057/SF : (Lavori di riparazione, consolidamento ed adeguamento del viadotto "Ficocchia").

L'importo del progetto ammonta a € 1.985.528,22 di cui € 1.558.924,78 per lavori compresi oneri diretti ed indiretti di sicurezza pari a € 46.862,23 ed € 426.603,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

E' in corso da parte del Provveditorato avvalso la stipula del contratto con l'Impresa aggiudicataria Akei Costruzioni Generali s.r.l., sospesa per intervenuta interdittiva da parte della Prefettura di Napoli.

Le attività residue riguardano pertanto:

- 1) contrattualizzazione, esecuzione lavori, collaudazione dei lavori;
- 2) consegna definitiva opere, attualmente in esercizio provvisorio;
- 3) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.985.528,22 sono stati erogati complessivamente €.42.643,37 per spese di rilievi e indagini, di consulenze tecniche e di indennità di missioni, per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.1.942.884,85.

Prog. n. 39/60/COM/6062: (collegamento Muro Lucano – Baragiano lunghezza tratta di circa 5,4 Km.)

L'importo del progetto ammonta a €. 5.267.107,00 di cui €. 2.276.163,25 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 217.082,32, ed €. 2.990.943,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori principali sono stati appaltati all'ATI Lopardo ed altri.

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Comune di Muro Lucano, Provincia di Potenza, A.N.A.S.) e sono in regolare esercizio.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.267.107,00 sono stati erogati complessivamente €.4.462.152,32 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.804.954,68.

Prog. n.39/60/COM/6062/02: (ripristino viadotto Platano-collegamento SS 94)

Il ripristino di ~~detto tratto~~, che collega l'asse viario Basentana-Baragiano, realizzato nell'ambito di ~~altro progetto~~ e consegnato all'ANAS S.p.A. in via provvisoria da questa Amministrazione in data 2.12.1993 e in via definitiva dall'Ufficio Commissariale in data 11.3.2004, costituisce collegamento necessario per la continuità dell'intero asse stradale Basentana-Muro Lucano. Detti lavori di ripristino, pertanto, si sono resi necessari ai sensi dell'art. 86 c. 1 L. 289/02 a seguito di richiesta dell'ANAS destinatario del medesimo tratto in questione.

L'importo del progetto ammontava a €. 472.951,99 di cui €. 336.341,75 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 10.000,00 ed €. 136.610,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori sono stati appaltati all'Impresa Bochicchio Nunzio.

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati all'Ente competente (A.N.A.S.) ed in regolare esercizio.

Con decreto commissariale n. 2011 del 3.12.2018 è stata disposta la chiusura tecnica, amministrativa e contabile del progetto ed è stata accertata una economia di €. 104.951,65 che è stata portata ad integrazione dei fondi della C.S. 3250.

A fronte dell'importo impegnato di €. 472.951,99 sono stati erogati complessivamente €.368.634,34 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.104.317,65.

Prog. n.39/40/COM/6063: (collegamento Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 2.661.864,38 di cui €. 1.435.585,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 68.637,29 e oneri di sicurezza speciali pari a €. 30.000,00, €. 57.182,73 per opere complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.754,60 e oneri di sicurezza specifici pari ad €. 1.874,98, €. 12.500,00 per lavori di ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano compresi oneri specifici di sicurezza pari a €. 247,50 ed €. 1.156.596,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori principali, le opere complementari e i lavori di ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano sono stati appaltati all'Impresa I.C.M. s.r.l..

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Provincia di Avellino e Comune di Calitri) e sono regolarmente aperti al traffico.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 2.661.864,38 sono stati erogati complessivamente €.1.994.954,50 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.668.909,88.

Prog. n.39/40/COM/6064: (Svincolo Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 1.336.634,70 di cui €. 593.420,36 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 34.675,59, €. 132.966,65 per opere integrative e complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.983,70, €. 106.100,39 per lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.773,94, inseriti tra le somme a disposizione del progetto, ed €. 610.247,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresi detti lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico.

I lavori principali sono stati appaltati all'Impresa Edil Viro, le opere integrative e complementari all'Impresa Ciardiello Antonio e i lavori di ripristino della bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico all'Impresa Ediltecnostade s.r.l..

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (ANAS, Provincia di Avellino, Comune di Calitri, Consorzio ASI di Avellino) e sono in regolare esercizio.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;

2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.336.634,70 sono stati erogati complessivamente €.956.715,11 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.379.919,59.

Aspetti economici-finanziari

Per tutto quanto esposto a fronte complessivamente di €. 109.188.516,31, di cui €.44.298.128,00 per completamento lavori progetti revocati ex c. 2 art. 86 L. 289/02 ed €.64.890.388,31 per completamento n. 68 progetti successivamente trasferiti, assegnati originariamente al Commissario quali residui risalenti all'anno 1997, risultano erogati €.67.849.192,39 e resta quindi una disponibilità di €. 41.339.323,92.

Con dette risorse disponibili dovrà provvedersi sostanzialmente al recupero del viadotto Ficocchia per €.1.942.884,85, alla realizzazione dello svincolo per Muro Lucano per €. 11.000.000,00, all'eventuale illuminazione di Rapone, al pagamento del saldo dei lavori del 2° lotto, del 3° lotto 1° stralcio e dei lavori del viadotto Farenga, alle eventuali riserve per presunti 700 mila €, al completamento delle procedure espropriative.

In definitiva, senza considerare i ribassi sui lavori in particolare dello svincolo di Muro Lucano, resterebbero comunque circa €. 25.500.000,00 di economie sui residui, si ripete risalenti all'anno 1997, mai aggiornati.

Con dette risorse dell'anno 1997 stanziato per realizzare i lavori allora di progetto rimasti incompiuti questo Ufficio oltre a detti completamenti, ha aggiornato i progetti, ha eseguito numerosi lavori di adeguamento alle nuove norme intervenute, ha riparato frane e scoscendimenti importanti, ha ripristinato le opere ammalorate, ha curato ogni aspetto connesso con la sicurezza non previsto in origine, ha realizzato migliorie importanti per milioni di €. (vedasi per tutte pannellature gallerie, impianti illuminazione, ecc.). In più dall'anno 2012 ha finanziato la propria stessa esistenza.

Le notevoli economie recuperate sulle somme assegnategli sono state rese possibili mediante:

- riprogettazione razionale di lavori e suddivisione funzionale degli stessi;
- affidamento di incombenze tecniche all'interno dell'Amministrazione;
- oculata gestione delle risorse evitando ogni possibile contenzioso;
- definizione di circa 800 transazioni in campo espropriativo con risultati economici notevoli a vantaggio dell'Amministrazione;

- impegno lavorativo spontaneo dei funzionari pubblici MISE addetti (peraltro part-time con unica eccezione) alla Struttura Commissariale oltre ogni limite abituale, con presenza e comunque reperibilità continua;
- instaurazione di rapporti collaborativi ottimali con il territorio in tutte le sue espressioni;
- assoluta trasparenza e quindi fiducia e disponibilità da parte dei terzi.

Si ritiene pertanto che, a parte il progetto 6053 che segue, la gestione commissariale potrebbe concludersi per la parte ex art. 32 L. 219/81 entro i primi mesi del 2019 esclusi i lavori in fase di affidamento e di consegna.

Per tale motivo l'importanza del subentro al 31.12.2018 da parte dell'Amministrazione/i trasferitaria/e al fine della continuità.

Tra i risultati più significativi raggiunti da questa gestione figurano pertanto, in conclusione:

- qualificazione, aggiornamento, crescita professionale di tutti i funzionari MISE di supporto;
- oculata gestione del denaro pubblico;
- esclusione sostanziale di contenziosi (un caso) nei confronti del Commissario e di riserve (un caso) da parte degli appaltatori;
- instaurazione di meccanismi per l'immediatezza delle verifiche, dei controlli e dei pagamenti (nessuna somma per interessi o oneri connessi);
- autofinanziamento con economie sui lavori;
- utilizzazione di risorse risalenti all'anno 1997 realizzando opere ed interventi ulteriori e concretizzando una economia finale;
- fiducia del territorio e delle istituzioni locali sull'operato dello Stato.

Qualche strumentale voce politica e giornalistica contraria, su basi suggestive e generiche relative al terremoto dell'Irpinia è facilmente contestabile perché per lo più non conferente.

Prog. n. 39/40//6053: (Viabilità FVS – 1° lotto)

Come noto, detto progetto, unico di completamento rimasto nelle competenze MISE per le particolari condizioni in cui era venuto a trovarsi sotto il profilo contabile ed amministrativo, è stato trasferito alle competenze dell'Ufficio Commissariale con D.M. del

2.8.2017. In data 4.5.2018 è stata accreditata la somma residua di €. 7.223.625,29 per la definizione tecnica e amministrativa delle opere.

E' nota peraltro la situazione di contenzioso esistente tra Concessionario e MISE in cui il medesimo progetto versa.

L'Ufficio del sottoscritto è in attesa di ricevere dalla Div. 8/DGIAI le necessarie ulteriori documentazioni richieste con note n. 28.784 del 12.10.2017, n. 29.721 del 4.1.2018, n. 30.193 dell'8.2.2018, n. 31.466 del 28.6.2018, n. 31.991 del 27.8.2018 e n. 32.742 del 13.11.2018.

All'AGS, inoltre, è stato chiesto, con nota n. 29.645 del 21.12.2017, l'effettivo stato contenzioso con l'ex Concessionario, che risulta tuttavia definito in Appello a favore dell'Amministrazione con Sentenza n. 5631/2017 del 23.5.2017 della Corte di Appello di Roma Prima Sezione Civile, impugnata dal medesimo ex Concessionario mediante ricorso in cassazione.

In relazione a ulteriori contenziosi con alcuni professionisti (eredi Criscuolo; eredi Vallebella) questo Ufficio, per quanto riguarda il contenzioso Vallebella, ha provveduto, sulla base della nota della Div. II Contenzioso della DGIAI n. 256496 del 20.7.2018, ad erogare quanto stabilito dalla Sentenza n. 11758/2017 del Tribunale di Roma. Per quanto riguarda il contenzioso Criscuolo non si sono avuti riscontri dal legale degli eredi Criscuolo in merito ad una eventuale possibilità di pervenire ad un accordo transattivo.

Si ritiene tuttavia che il saldo riconosciuto a detti eredi Criscuolo e Vallebella con separate Sentenze passate in giudicato, contrasti con la dichiarata inidoneità del Certificato di Collaudo, come sempre sostenuto da questo Ufficio.

Al fine di un definitivo chiarimento, è stata interessata l'AGS tramite la Div. 2/DGIAI e anche da questo Ufficio con nota n. 32.864 del 22.11.2018.

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ELENCO PROGETTI EX C. 2 ART. 86 L.289/02

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.
60/6057/1	Viabilità Nerico-Muro Lucano	2.540.770,03	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)	5.306.734,09	4.831.257,25	In corso compl. proced.esprop.		16.7.2009	Si	27.5.2011	28/29.11.2012	5.12.2012 Anas
	Lavori principali											
	Lavori di prima somma urgenza al viadotto Ficocchia	158.076,10	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					5.5.2010	Si	20.10.2011	28.11.2012	5.12.2012 16.7.2014 *
	Lavori di seconda somma urgenza al viadotto Ficocchia	98.051,00	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					11.12.2009	=====	14.5.2010	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori di completamento 1° lotto	596.461,57	Basso Costr.srl Melfi (PZ)					27.10.2012	=====	16.7.2014	28/29.11.2012	5.12.2012 16.7.2014 *
	Lavori in economia per traslazione campata viadotto Ficocchia	19.940,00	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					26.1.2010	=====	28.5.2010	28.11.2012	5.12.2012 16.7.2014 *
	Lavori in economia ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	37.286,57	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					16.2.2011	=====	7.4.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori integrativi interventi di ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	36.797,32	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					22.3.2011	=====	23.12.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori ripristino blocchi e cartelli stradali agli imbocchi di viabilità chiusa al traffico	17.631,73	C.A.I. s.r.l. Potenza					17.9.2004	=====	22.12.2004	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori consolidamento frana al Km.1+250 della Bretella di Pescopagano	276.396,98	La Castellese s.r.l. Castelfranci (AV)					6.11.2008	Si	6.11.2009	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia supporto campagne di indagini su Viadotto Ficocchia	23.749,51	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					15.2.2008	=====	23.2.2010	28.11.2012	16.7.2014 *
	Lavori in economia relativi a lavori di somma urgenza Viadotto Ficocchia	36.694,55	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)					22.3.2010	=====	24.2.2011	28.11.2012	16.7.2014 *
	Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Ficocchia	1.000,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza					5.4.2011	=====	28.6.2011	=====	=====
	Nolo a caldo by-bridge per ulteriori indagini Viadotto Ficocchia	950,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza					12.4.2011	=====	28.6.2011	=====	=====
	Lavori ripristino impianto di illuminazione svincolo per Pescopagano	10.423,45	Basso Costr.srl Melfi (PZ)					08.08.2013	=====	01.10.2013	28/29.11.2012	5.12.2012 16.7.2014 *

Elenco progetti ex c. 2 (dicembre 2018)

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Cottauo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.
60/6057/2	Lavori principali	15.391.561,83	ATI Akei s.r.l. Napoli	22.557.195,31	20.161.946,45	In corso compl. proced.esprop.		23.12.2016	Si	6.10.2017	Parziale 1) 24.7.2014	Parziale 1) 4.12.2017 Parziale 3) 31.7.2018
	Lavori di somma urgenza per frana in località Raicelle del Comune di Muro Lucano	284.475,35	ATI Akei s.r.l. Napoli					18.3.2011	==	17.1.2012	==	==
	Lavori di 1^ somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolumità tratto Km. 23 circa	423.657,90	ATI Akei s.r.l. Napoli					10.8.2011	Si	22.3.2012	==	==
	Lavori di 2^ somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolumità tratto Km. 23 circa	400.109,34	ATI Akei s.r.l. Napoli					14.9.2011	Si	22.3.2012	==	==
	Danni di forza maggiore dal Km.18+420 al Km.27+400	150.844,90	ATI Akei s.r.l. Napoli				==	==	==	24.10.2011	==	==
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi abbandonati	1.900,00	Pellicano Verde Muro Lucano (PZ)					23.6.2008	==	14.8.2008	==	==
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati	9.950,00	Ecological Systems Muro Lucano (PZ)					10.7.2007	==	31.7.2007	==	==
	No'o a caldo by-bridge per indagini Viadotto Farenga	1.000,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza					6.4.2011	==	28.6.2011	==	==
	Segnaletica orizzontale e verticale svincolo di Rapone	16.268,67	C.G.A. s.r.l.					20.12.2014	==	7.1.2015	==	==
	Lavori di ripristino Viadotto Farenga	527.547,33	Tecnologie Stradali s.r.l. Roma					25.9.2017	Si	25.5.2018	==	31.7.2018
	Lavori saldatura carpenteria di collegamento longerine viadotto Farenga	38.669,85	Tecnologie Stradali s.r.l. Roma					7.12.2017	==	18.12.2017	==	==
	Lavori di ripristino della continuità della pista esistente - tratto compreso tra progr. Km.11+000 e Km. 11+400	38.023,96	ATI Akei s.r.l. Napoli					28.7.2017	==	15.9.2017		

Elenco progetti ex c. 2 (dicembre 2018)

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.
60/6057/3 1° stralcio	Svincolo Castelgrande- impianti nelle gallerie e Cavalcavia viabilità secondaria Lavori principali	18.145.616,39	ATI Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)	23.140.992,42	19.861.408,09	In corso compl. proced.esprop.		6.4.2017	Si	5.12.2017	Parziale 2) 24.7.2014	Parziale 3) 31.7.2018
	Lavori di risanamento della galleria Montenuovo	695.922,05	Pietro Falbo Luzzi (CS)			Lavori in corso Emesso 1° SAL	29.1.2019					
	Lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in loc. Raiocelle di Muro Lucano	29.736,02	ATI Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)					5.7.2017	=====	10.7.2017	10.10.2017	15.12.2017
	Lavori urgenti di miglioramenti richiesti dall'ANAS	37.885,19	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)					8.9.2018	=====	11.9.2018	=====	31.7.2018
	Lavori urgenti di installazione segnaletica integrativa in corrispondenza dell'innesco con Muro Lucano richiesti dall'ANAS	4.413,58	C.G.A. s.r.l. Brienza (PZ)					6.10.2018	=====	15.10.2018	=====	31.7.2018
60/6057/3 2° stralcio	Svincolo Muro Lucano - Lavori principali	6.439.914,00		7.415.648,67	53.230,62	Ultimata progett. esecutiva-In corso indiz Conf.Serv.						
60/6057/SF	Lavori di ripristino Viadotto Ficocchia	1.558.924,78		1.985.528,22	42.643,37	Stipulato contratto In corso verifica antimafia						
60/6062	Viabilità Muro Lucano-Baragiano - Lavori principali	2.276.163,25	ATI Leopardo V. Buonabitacolo (SA)	5.267.107,00	4.462.152,32	In corso compl. proced.esprop.		30.10.2007	Si	21.5.2008		20.7.2009 *
	Viabilità secondaria Cavalcavia Ponte Giacola	689.580,26	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)					14.9.2010	Si	20.4.2011	28.1.2011	6.6.2011 *
	Lavori in economia allacciamento provv. alla viabilità comunale	89.712,33	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)					21.5.2009	=====	1.7.2009		20.7.2009 *
	Rotatoria Muro Lucano - Innesco SS. 7 Appia	128.178,76	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)					5.4.2011	=====	1.7.2011	31.5.2011	18.7.2011 *
	Illuminazione Rotatoria Muro Lucano Innesco SS.7 Appia	5.978,66	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)					29.4.2011	=====	6.7.2011	31.5.2011	18.7.2011 *
	Lavori in economia illuminazione svincolo S.S. 7 Appia	34.881,65	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)					29.9.2010	=====	14.10.2010	28.1.2011	6.6.2011 *
	Lavori in economia collegamento viabilità esistente, drenaggio acque meteoriche e segnaletica stradale	22.521,69	Silvano s.r.l. Picerno (PZ)					8.2.2011	=====	22.2.2011	28.1.2011	6.6.2011 *

Elenco progetti ex c. 2 (dicembre 2018)

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.
60/6062/2	Ripristino viadotto Platano - collegamento SS. 94	336.341,75	Bochiocio N. Bella (PZ)	368.634,34	368.634,34	Progetto chiuso con D.C.n.2011 del 3.12.2018		27.6.2011	Si	12.12.2011	24.8.2011	23.1.2012 *
40/6063	Viabilità Calitri-S.S. 401 Ofantina Lavori principali	1.435.585,03	I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA)	2.661.864,38	1.994.954,50	In corso compl. procedure espropriative		14.3.2009	Si	4.8.2011	25.8.2010	25.8.2010 Com.Calitri 18.10.2011 *
	Opere complementari	57.182,73	I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA)					2.1.2010	=====	23.6.2010	25.8.2010	2.7.2012 *
	Ripristino quadri elettrici impianto di illuminazione in galleria Gagliano	12.500,00	I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA)					10.7.2010	=====	10.8.2010	25.8.2010	18.10.2011 *
	Svincolo sulla viabilità Calitri/Ofantina Lavori principali	593.420,36	Edil Viro			In corso compl. proc.esproprial.			Si		25.8.2010	2.9.2011 *
40/6064	Opere complementari	132.966,65	Ciardiello A. Avellino	1.336.634,70	956.715,11			1.9.2011	=====	27.4.2012	25.8.2010	14.5.2012 *
	Lavori ripristino viabilità svincolo Calitri/A.I.Nerico	106.100,39	Ediltecnostade s.r.l. Quarto (NA)					27.4.2012	=====	26.11.2012	=====	15.1.2014 *
TOTALI		53.971.963,46		70.040.339,13	52.732.942,05							

* La data riportata per la consegna definitiva dell'opera è quella conclusiva nel rapporto Amministrazione centrale-Ente consegnatario

- 1) Tratto svincolo Pescopagano (PZ)-Svincolo Rapone (PZ)
- 2) Galleria artificiale in Pescopagano (PZ)
- 3) Tratto compreso tra la progr. Km. 15+800 (escluso svincolo di Castelgrande) e la progr. Km. 27+500 (uscita per Muro Lucano) - all'ANAS. Lo svincolo di Castelgrande è stato consegnato al Comune di Castelgrande in data 30.7.2018.

RELAZIONE SULLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA L.219/81

Ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985 n. 210, nonché dell'art. 14 comma 4 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, che ha convertito il Decreto Legge 333/1992, l'approvazione del progetto, e, di conseguenza, del piano particellare grafico e descrittivo, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera e produce gli effetti di cui all'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1 e s.m. e i.

Strettamente connesse con la realizzazione delle opere sono le procedure espropriative per le quali l'Ufficio Commissariale opera direttamente, a parte l'apporto tecnico di esterni esperti in materia topografica e catastale, professionalità non rintracciabili nell'organico ministeriale.

Ciò premesso, si ritiene necessario segnalare quanto appresso.

Come noto le procedure espropriative sono attualmente regolamentate dal testo del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità", coordinato con le modifiche approvate dal D.L.vo 27.12.02 n. 302.

In particolare l'art.6 prevede che le attività relative all'acquisizione dei suoli siano espletate direttamente dal committente e non più, nel caso di opere pubbliche statali, dall'Ufficio del Territorio competente.

Tali disposizioni sono tuttavia applicabili a partire dal 30.6.03 per espropriazione ed occupazione di aree di sedime di nuove opere in quanto l'art. 57 del suddetto T.U., al comma 1, recita come appresso:

"Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data".

Nel caso in specie a questo Ufficio è stato demandato il compito di completare opere già dichiarate di pubblica utilità, rimaste incompiute ma già ben definite nella loro configurazione.

Le modeste varianti introdotte nei progetti di completamento, non hanno modificato le caratteristiche ed i requisiti originari dei progetti che, pertanto, hanno conservato la propria identità.

Quanto sopra ha comportato il subentro dell'Ufficio Commissariale nelle attività già in corso, altrimenti di competenza prefettizia (anche sulle numerosissime particelle oggetto della precedente procedura per le quali occorre emettere i decreti definitivi di esproprio).

Si sottolinea che tale adeguamento ha comportato un pesante onere riorganizzativo per l'Ufficio commissariale ed il ricorso a supporti esterni per mancanza di idonee professionalità in ambito ministeriale.

La situazione determinatasi si è configurata, pertanto, come assai complessa e delicata, stanti gli adempimenti necessari ed obbligatori nei confronti delle ditte espropriande, che andavano e vanno, comunque, effettuati.

A conforto di quanto sopra esistono sostanzialmente due elementi essenziali: 1) la natura dei lavori eseguiti, consistenti in completamenti di opere revocate ad uno stadio di avanzamento notevole; 2) la inopportunità, anche sotto il possibile profilo contenzioso, dell'applicazione di procedure diverse (con conseguenze anche economiche per i proprietari dei suoli oggetto di occupazione e di esproprio) su particelle limitrofe o, addirittura, sulla medesima particella.

Pertanto, questo Ufficio ha provveduto alle incombenze connesse con la procedura acquisitiva dei beni interessati dai completamenti ex. c. 2 art. 86 L. 289/02, applicando la procedura introdotta dalla L.219/81.

Visto il piano particellare si predispone l'avviso dell'avvio del procedimento espropriativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, allegando dettagliato elenco degli immobili da espropriare con gli intestatari catastali da pubblicare all'albo pretorio dei comuni interessati, e nel caso in cui le ditte interessate siano superiori a 50, sui giornali (uno a tiratura Regionale ed un altro a tiratura Nazionale) e si richiede ai Comuni medesimi di ricevere gli indirizzi degli intestatari catastali.

Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione, nel caso non ci siano opposizioni in merito o siano comunque state risolte eventuali criticità, si approva il decreto di occupazione che viene pubblicato unitamente alle date previste per l'immissione nel possesso tramite la

pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati e sui giornali (uno a tiratura Regionale ed un altro a tiratura Nazionale).

Con l'immissione in possesso si verifica la coltura prevalente esercitata sui fondi oggetto di occupazione richiedendo contestualmente ai comuni interessati il certificato di destinazione urbanistica e si procede con il calcolo delle stime indennitarie in base al Valore Agricolo Medio approvato dalla Regione interessata nell'anno di riferimento che si inviano alle ditte rintracciate. Per le ditte non rintracciate viene pubblicato agli albi comunali e sui giornali (uno a tiratura Regionale ed un altro a tiratura Nazionale) che le stime sono visionabili c/o l'Ufficio Commissariale.

L'Ufficio Commissariale ha ritenuto di procedere ad accordi transattivi direttamente con le Ditte in esproprio al fine di addivenire in tempi brevi e bonariamente all'acquisizione delle particelle interessate dai progetti, in nome e per conto del Ministero, in quanto titolare degli espropri ed a cui le particelle espropriate sono state e saranno intestate.

La Ditta deve, ovviamente, dichiarare, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m. e i., la piena, esclusiva e libera proprietà dell'immobile oggetto di esproprio ed i dati del soggetto conduttore del fondo all'atto dell'immissione in possesso.

Con la suddetta dichiarazione il proprietario dell'immobile in esproprio si impegna a non procedere a trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli né a costituire servitù o altri oneri di carattere reale e di accettare irrevocabilmente per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo la somma concordata a tacitazione piena e definitiva.

L'indennità da corrispondere viene calcolata sulla base di una stima di previsione di superficie da espropriare in quanto l'esatta quantificazione della stessa avviene solo a seguito dei frazionamenti.

Per i terreni a destinazione agricola alla data dell'immissione in possesso la suddetta stima viene elaborata sulla base dei valori agricoli medi per ettaro e per tipo di coltura dei terreni della Regione Agraria interessata, ai sensi della legge 28.01.1977 n.10 e desunti dalle tabelle vigenti all'atto della transazione, ove non sussistano stati di consistenza già definiti, tenendo conto della maggiorazione da corrispondere al proprietario per l'accordo bonario o in qualità di coltivatore diretto, nonché della indennità da corrispondere per l'occupazione temporanea, che viene calcolata dalla data dell'immissione in possesso fino alla data dell'accordo transattivo, ovvero per 96 mesi pur in presenza di occupazioni più lunghe.

Tali indennità, infine, sono maggiorate del 70% in considerazione di quanto previsto dalla L.219/81 e si intendono onnicomprensive e ristoratrici anche di tutti gli eventuali danni diretti o indiretti conseguenti all'espropriazione dell'immobile.

Per eventuali manufatti che insistano sulle particelle interessate dall'esproprio si adotta la stima riportata sul verbale di consistenza e di immissione in possesso.

Per i terreni a vocazione edificatoria alla data dell'immissione in possesso la stima viene elaborata sulla media del valore venale all'epoca della consistenza, salvo eventuali variazioni da concordare con la Ditta espropriata.

Alla Ditta, quindi, nel caso abbia presentato la documentazione attestante l'effettiva proprietà dell'immobile viene corrisposto un acconto pari al 70% della suddetta stima in quanto ^{come} la ^{della} definitiva superficie in esproprio determinata dal frazionamento potrebbe subire variazioni anche in difetto rispetto a quella provvisoriamente considerata.

Il saldo viene, pertanto, corrisposto solo a seguito dell'approvazione del frazionamento da parte dell'Ufficio del Territorio competente.

Si precisa che dal quantum transattivo resta, comunque, escluso ogni riconoscimento di interessi, di risarcimento danni e di rivalutazione monetaria.

Nel caso la Ditta voglia avvalersi del ministero del notaio per la definizione della cessione bonaria lo fa a proprie spese in quanto l'Amministrazione procederà tramite decreto definitivo di esproprio.

Con la sottoscrizione dell'accordo la Ditta rinuncia a proporre opposizione alla stima e rinuncia, altresì, ad ogni altra azione giudiziaria attinente l'occupazione e l'espropriazione dell'immobile, tenendo indenne e sollevata l'Amministrazione da ogni eventuale pretesa vantata da terzi.

L'Amministrazione provvede a propria cura e spese alle eventuali operazioni di frazionamento dei suoli, ove non già effettuate dal Concessionario, affidandole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di servizi.

Nelle more dell'approvazione dell'atto di transazione, la Ditta si impegna a sospendere eventuali contenziosi in atto che coinvolgono direttamente o indirettamente

l'Amministrazione e ad estinguere gli stessi ad approvazione avvenuta e, naturalmente, a non attivarne di nuovi.

Ove detta approvazione non intervenisse nel termine di 120 giorni, la Ditta avrebbe facoltà di recedere dagli impegni assunti.

Nel caso l'atto transattivo debba essere soggetto a registrazione in caso d'uso, le relative spese sono a carico della ditta medesima che si avvarrà delle agevolazioni ex artt. 70-74 del T.U. n. 76/90, che si ritengono applicabili.

Alla luce di quanto sopra è stato predisposto uno schema di accordo transattivo sottoposto all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha riscontrato positivamente lo stesso.

Occorre, comunque, sottolineare che la titolarità dell'intera attività espropriativa, per espressa delega di convenzione di concessione apparteneva al Concessionario revocato e che i contenziosi ad oggi attivati sono rivolti nei confronti del medesimo Concessionario.

Tale circostanza non esclude, in caso di soccombenza, la chiamata in causa dell'Amministrazione per legittimazione passiva e ciò rende particolarmente auspicabile ogni ipotesi di transazione.

Per le ditte espropriate che non hanno dato riscontro nei termini stabiliti, ovvero non hanno accettato la proposta transattiva, ovvero si è constatata la loro irreperibilità si procede con l'inviare alla Commissione Provinciale Espropri le stime indennitarie per le valutazioni di competenza.

Nel caso le ditte abbiano già accettato un acconto o abbiano comunque accettato l'indennità proposta dall'Ufficio Commissariale ma non abbiano presentato idonea documentazione a supporto si procederà a depositare la stima definitiva direttamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza.

A seguito del parere della Commissione Provinciale, l'Ufficio Commissariale trasmette lo stesso alle ditte rintracciabili mentre, per le altre, si pubblica all'Albo pretorio dei comuni interessati che le stime sono disponibili presso l'Ufficio commissariale.

Trascorsi i giorni stabiliti dalla data di pubblicazione agli albi comunali senza ricevere alcun riscontro si procede con l'emissione della Determina Commissariale per il deposito

amministrativo delle somme indennitarie c/o la Ragioneria Territoriale dello Stato della Provincia competente.

Tale deposito avviene compilando un modello (Mod. 125) ove vengono inseriti i dati:

1. del soggetto richiedente il deposito;
2. a favore della ditta catastale, inserendo: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di p.lle e foglio, mq. occorsi per i lavori e, se sono più particelle, la verifica se le stesse siano confinanti o meno, n. di progetto, Determina comm.le di riferimento ed importo.

Qualora mancasse un elemento quale potrebbe essere la data di nascita e, pertanto, il codice fiscale, oppure un codice fiscale non validato dall'Agenzia delle Entrate o mancasse l'indirizzo, il soggetto richiedente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Allorché tutti i dati di cui sopra siano completi la Ragioneria Territoriale dello Stato invia il numero di apertura di deposito definitivo e questo Ufficio provvede ad effettuare i versamenti per cui, ad avvenuta quietanza, si procede ad emettere decreto definitivo di esproprio e con la conseguente registrazione, trascrizione, volturazione e notifica dello stesso oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui mancasse un Codice Fiscale o non fosse validato, l'Agenzia delle Entrate non potrà procedere alla registrazione, trascrizione e volturazione del Decreto.

Si rappresenta che la Commissione Provinciale Espropri di Potenza ha restituito le stime richieste dopo circa due anni per cui l'attività è stata notevolmente rallentata mentre la Ragioneria Territoriale di Napoli ancora non ha comunicato i codici di apertura dei depositi richiesti da diversi mesi e, pertanto, non si può procedere al versamento delle stime indennitarie e, di conseguenza, all'emissione del Decreto definitivo di esproprio.

OGGETTO: Trasferimento in proprietà dei lotti, delle aree e delle infrastrutture di cui all'art. 39 del T.U. 76/90

Aree demaniali

La norma è volta ad introdurre una norma di semplificazione dei complessi iter amministrativi necessari al perfezionamento del trasferimento in proprietà dei lotti e delle opere infrastrutturali interessati dalle agevolazioni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante *"Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982"*.

Come è noto, le zone disastrose dai citati eventi sismici sono state oggetto, dai primi anni Ottanta, di una complessa opera di intervento che, nell'intento di coniugare le esigenze della ricostruzione a quelle dello sviluppo industriale delle aree colpite, è stata all'origine di un'ampia legislazione e regolamentazione a tutti i livelli, inaugurata dalla L. 219/81 e caratterizzata sovente dalla sua natura speciale e derogatoria.

Alla particolare articolazione del quadro normativo di riferimento ha, peraltro, contribuito l'evoluzione degli assetti istituzionali e delle attribuzioni di competenze.

In particolare, l'origine degli interventi trova fondamento nell'art. 32 della legge 14 maggio 1981 n.219, in forza del quale veniva programmata la realizzazione di n. 20 aree industriali e relative infrastrutture di collegamento nonché concreti incentivi per la realizzazione di piccole e medie industrie assegnatarie provvisorie dei lotti insistenti nelle 20 aree suddette.

Il trasferimento definitivo in proprietà dei lotti era previsto al raggiungimento di determinati obiettivi occupazionali e produttivi, oltre che di altre condizioni specificamente previste dalle norme.

Con convenzioni stipulate tra il Ministro Segretario di Stato (concedente) ed i Consorzi di imprese (concessionari) è stata affidata ai medesimi Consorzi la realizzazione delle opere di urbanizzazioni dei vari nuclei industriali e delle notevoli infrastrutture pubbliche.

I medesimi Concessionari, ai sensi dell'art.8 delle suddette convenzioni, hanno predisposto i piani particellari grafici e descrittivi delle aree individuate per la realizzazione degli interventi ed attivato le procedure di esproprio, avendo il Ministro designato autorizzato con propri decreti l'esecuzione delle opere relative alla realizzazione dei nuclei industriali ed opere connesse, nonché l'occupazione d'urgenza delle aree individuate nei suddetti piani particellari.

Tra le superfici oggetto di occupazione sono risultate comprese talvolta anche porzioni, pur sovente di estensione molto limitata, di pertinenza del demanio pubblico.

Si tratta, in particolare, nella maggior parte dei casi, di modeste porzioni di demanio idrico le quali, peraltro, nel tempo, hanno perduto le caratteristiche che ne giustificano il vincolo pubblicistico di indisponibilità.

Per quanto concerne la cessazione della destinazione agli specifici scopi pubblici dell'area di accessione fluviale, sui terreni abbandonati da un corso d'acqua per avvenimenti anteriori al 1994, e le opere realizzate ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 76/90, oggi in fase di completamento, rientrano in questo caso, non possono trovare applicazione le disposizioni dettate dalla legge 37/94, sostitutiva degli

artt. 942, 946 e 947 del C.C., le quali, come è noto, escludono la sdemanializzazione dei terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento, sia a seguito di eventi naturali che di fatti artificiali indotti dall'attività dell'uomo, e ciò in quanto tali norme sono prive di efficacia retroattiva (Cass. 14.1.97 n. 300) e, come tali, non possono interferire su situazioni verificatesi in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.

E' opportuno rilevare che nella disciplina dettata dall'art. 942, nella formulazione anteriore alla legge 37/94, la sdemanializzazione dei terreni abbandonati da un corso d'acqua consegue automaticamente e, quindi, indipendentemente da atti formali o taciti della P.A., all'evento verificatosi allorchè questo, come nella specie, assuma carattere non transitorio ma irreversibile, sì da far venire meno la originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la demanialità necessaria del suolo (Cass. 9.10.91 n. 10607; Cass. 12.6.98 n. 5868; sentenza n. 2391/96 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli).

L'articolo unico del D.P.C.M. del 6/3/92 ha individuato nel Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno l'unica autorità competente all'emanazione del provvedimento di trasferimento, su proposta dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, (successivamente soppressi), previa verifica da parte della predetta Agenzia della completa realizzazione dell'iniziativa e l'osservanza delle obbligazioni delle concessioni.

Il citato D.P.C.M. ha previsto che l'Intendenza di finanza competente, oggi Agenzia del Demanio, intervenisse solo successivamente per dare corso all'esecuzione del provvedimento di trasferimento, anche per quanto attiene all'indicazione catastale delle aree in argomento.

Il comma 2 dell'art. 10 della legge 7/8/97, n. 266 ha, quindi, introdotto, per il perfezionamento del trasferimento dei lotti alle imprese, una procedura agevolata ed accelerata in quanto ha ribadito che il trasferimento in proprietà dei lotti alle imprese (ovvero agli Enti pubblici destinatari per legge) è disposto unicamente dal Ministro dell'Industria nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro della richiesta, corredata dei documenti che attengono, esclusivamente, ai requisiti economico-imprenditoriali delle richiedenti.

Il comma 5 dell'art. 10 della medesima legge 7/8/97 n. 266 ha espressamente stabilito, inoltre, che gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della L. 219/81 siano trasferite ai Consorzi di sviluppo Industriale competenti per territorio.

A seguito dell'emanazione della suddetta legge, l'attuale Ministero dello Sviluppo Economico, avendo i Geni Civili già espresso il proprio parere sulla disponibilità delle aree demaniali, rappresentando che le stesse non erano più necessarie agli scopi per cui era sorto il vincolo demaniale, essendosi di fatto verificata un'implicita sdemanializzazione, ha proceduto al trasferimento ai Consorzi di Sviluppo Industriale competenti per territorio degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'articolo 32 della legge 219/81 ed al trasferimento ad altri soggetti pubblici - Anas, Province, Comuni, Enel ecc. - delle opere esterne di collegamento.

Dalla normativa e dai principi generali della contabilità dello Stato, non risulta alcuna indicazione circa la eventualità di un trasferimento di risorse finanziarie tra diverse PP.AA. dello Stato a fronte di un rispettivo passaggio di beni ricadenti nel Demanio statale, né la normativa di riferimento indica che tale trasferimento (dal demanio del Ministero competente da una parte, al patrimonio

provvisorio del Ministero dello Sviluppo Economico dall'altra, nelle more della definitiva assegnazione) possa essere accompagnato da un pagamento a compensazione, trattandosi di due Amministrazioni dello Stato la cui contabilità è "unica" e non tiene conto delle immobilizzazioni, né risulta che le particelle in questione abbiano mai tenuta aperta una partita di debito.

Inoltre, nello specifico, la funzione di trasferimento del bene in oggetto corrisponde ad esigenze di pubblica utilità dettate da una legge straordinaria e di emergenza (L.219/81).

A conferma ulteriore di tale orientamento, il trasferimento a titolo non oneroso tra diverse amministrazioni pubbliche di distinte tipologie di beni, è stato anche affermato dalla L. 5.5.09 n. 42, con l'art. 19, co. 1, lett. a) e dal conseguente D.Lgs. 28.5.10 n. 85, art. 1, co. 1, e art. 2, co. 1 e 5, con cui, nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, beni dello Stato di distinte tipologie, vengono *"attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni"*.

Inoltre, sembra indiscutibile l'assenza di qualsiasi danno erariale emergente dal passaggio di beni tra diverse Amministrazioni dello Stato, in quanto non si configura alcun depauperamento dello Stato, unico detentore dei beni in questione.

A tutt'oggi non risulta avvenuto l'accatastamento di singoli lotti e delle infrastrutture realizzate su aree demaniali, in quanto gli Uffici del Territorio (ex Uffici Tecnici Erariali competenti) ritengono di dover acquisire la formale sdemanializzazione da parte dell'Agenzia del Demanio.

Ciò comporta gravi danni alle imprese nel momento in cui esse decidono di trasferire in tutto o in parte le opere realizzate o quanto commissari fallimentari debbano porre all'asta beni delle imprese.

Si ritiene che si possa pervenire ad una soluzione della questione con l'introduzione di una norma che consenta di risolvere i problemi interpretativi insorti e, soprattutto, di evitare lunghe operazioni amministrative (la sdemanializzazione) e pesanti oneri burocratici ed economici per le imprese, scongiurando, peraltro, il rischio, tutt'altro che remoto, dell'instaurarsi di un'ingente mole di contenzioso.

La norma proposta prevede, infatti, che qualora il trasferimento in proprietà dei lotti, delle aree e delle infrastrutture interessati dalla ricostruzione successiva agli eventi sismici dei primi anni Ottanta ricomprendano nel proprio ambito particelle risultanti di pertinenza del demanio pubblico, queste ultime debbano considerarsi a tutti gli effetti sdemanializzate, cosicchè gli Uffici competenti dovranno provvedere senza alcun ulteriore passaggio amministrativo all'adozione dei conseguenti provvedimenti.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione II - Affari Giuridici e normativi e coordinamento amministrativo /GF

Ministero dello Sviluppo Economico
Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

SEDE

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
DGIAI Div. VIII

SEDE

Ing. Paolo Turi
Coordinatore Ufficio del Commissario
Ad Acta

SEDE DI SALERNO

OGGETTO : Aggiornamento contenzioso
Art. 86 L. 289/02

In riferimento alla richiesta di aggiornamento di contenziosi in essere di cui alla nota Commissariale prot. 0318436 del 16.10.2018, che si riscontra, si fa seguito alla precedente nota prot. 93183 del 3.10.2016 della scrivente Divisione e a quanto già anticipato per le vie brevi, per comunicare che, allo stato attuale, sulla base dei documenti presenti agli atti di questa Divisione, risulta quanto segue .

In relazione al **CT ADS NA 16806/09** – Causa Gervasi Francesca e altri c/Ministero Prog. 39/40/6006 Infrastrutture Nucleo Industriale di Calitri – Concessionario ICLA, con nota prot. 32574 del 27.04.2015 (all. 1) e' stata trasmessa, per il seguito di competenza, a codesto Ufficio Commissariale e alla DGROB, la comunicazione dell' Avvocatura Distrettuale di Napoli prot. 20013 del 12.03.2015 (all. 2) e la Sentenza , depositata il 29.09.2014 (all. 3) con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato il Ministero al pagamento in favore degli attori.



In relazione al **CT ADS SA n. 4099/2005** – Causa Di Menza Mario_Felice e altri c/Ministero Prog. 39/40/6007 Area Industriale di Contursi – Concessionario CO.INFRA, , il giudizio risulta ancora pendente; da ultimo, agli atti risulta la nota prot. 38261 del 28.04.2017 (all. 4) con la quale questa Divisione trasmette alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno la relazione di consulenza di parte redatta dal tecnico incaricato Geom. Filippo Cammarota .

In relazione al **CT ADS SA 14266/99** - Causa promossa dal Comune di Caposele contro il Consorzio INFRAV , Prog. 39/40/ 6055 Fondo Valle Sele Contursi, il giudizio di primo grado si e' concluso con la sentenza n. 46/2015 con la quale il Tribunale di Avellino ha condannato il Consorzio al pagamento in favore del Comune dell' importo di €. 235.233,48 (somma da cui detrarre l' importo già versato di €. 109.524,43) - di cui al parere richiesto dalla scrivente Divisione alla competente Avvocatura Distrettuale di Napoli, reso dalla stessa Avvocatura (CS 11540/15 parere con con il quale si rappresenta che le somme anticipate dal Consorzio potranno essere successivamente legittimamente richieste al Ministero) e trasmesso a codesto Ufficio commissariale con nota prot. 84086 del 6.11.2015 (all. 5).

Avverso la suddetta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso dinanzi la Corte di Appello di Napoli di cui alla comunicazione di questa Divisione con nota prot. 0100939 del 19.10.2018 (all. 6).

In relazione al **CT AGS 143599/2000** - Causa promossa dal Consorzio COINFRA c/ Ministero, Prog. 39/40/6068 , e di cui alle sentenze sfavorevoli per l'Amministrazione (già' trasmesse a codesti Uffici in indirizzo) n. 10465/2006 del Tribunale di Roma e n. 2239/2011 della Corte di Appello di Roma , si rinvia, preliminarmente, alla nota prot. 6196 del 22.07.2011 (all. 7) con la quale questa Divisione comunicava che la competente Avvocatura Generale con nota p. 186388 del 3.06.2011 aveva manifestato che la sentenza di secondo grado non si presta “ *ad utile impugnazione* ” e, da ultimo, alla nota prot. 196532 dell' 8.05.2018 (all. 8).

In relazione al **CT AGS 42056/01** , causa promossa da Pizzarotti c/Ministero , Prog. 39760/6077/02 – Concessionario RTI , si comunica, in via preliminare, che i relativi fascicoli non sono presenti agli atti della scrivente Divisione , ma depositati presso gli archivi generali del Ministero . Al riguardo, sono state richieste notizie per le vie brevi alla competente Avvocatura Generale , che si fa riserva di comunicare non appena perverranno.



In relazione al **CT ADS PZ 1318/13**, causa promossa da Venetucci c/Maltauro, prog. 39/60/6002 Concessionario Maltauro S.p.A., Area Industriale di Baragiano, si comunica che l'Avvocatura Distrettuale di Potenza con nota prot. 0315363 dell' 11.10.2018 (all. 9) ha trasmesso copia dell' autorizzazione del giudice alla proroga dei termini per il deposito della consulenza .

Al riguardo si allegano la nota prot. 1816 del 5.01.2018 (all. 10) e la relazione tecnica (all. 11) redatta dal Geometra Domenico Letizia, Consulente tecnico e funzionario della sede di Napoli del Ministero.

In relazione al **CT ADS NA 16804/09**, causa promossa da Iavarone c/INCOMIR, Prog. 39/40/6055 Concessionario INCOMIR, Area Industriale di Calaggio, , si fa rinvio alla nota di questa Divisione prot. 188267 del 30.11.2017 (all. 12) con la quale veniva richiesto di dare esecuzione alla sentenza n. 3474/2016 della Corte di Appello di Napoli.

In relazione al **CT ADS NA 15192/03** , causa promossa dal Consorzio Melandro Viggiano c/Ministero , Prog. 39/60/6018, si fa seguito alla nota di questa Divisione prot. 67516 del 16.06.2017, con la quale veniva trasmessa la Sentenza n. 7931/2009 del Tribunale di Napoli e si trasmette la sentenza n. 3506/16 (all. 13) della Corte di Appello di Napoli , favorevole per l'Amministrazione.

In relazione al **CT ADS NA 100627/2000**, causa promossa dal Consorzio Melandro Viggiano c/Ministero, la scrivente Divisione con nota prot. 1465 15 del 26.07.2007 aveva richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato valutazioni (mai pervenute) in merito all' impugnazione della sentenza n. 653/2007 della Corte di Appello di Napoli (all. 14), sfavorevole per l'Amministrazione.

In relazione al **CT ADS PZ 233/98**, causa promossa da Di Rago Ettore e Di Rago Domenico c/ANAS e Ministero, si trasmette la sentenza n. 843/2014 del Tribunale di Potenza (all. 14), sfavorevole per l' Amministrazione e non ritenuta impugnabile dalla competente Avvocatura Distrettuale.



In relazione al **CT AGS 32764/13**, causa promossa da Amalia Peccerillo e altri Vallebella c/Ministero, di cui alla nota Commissariale prot. 315913 del 12.10.2018, che si riscontra, si fa presente, anche ai fini di una eventuale transazione, che la prossima udienza del giudizio pendente è stata fissata al 25.11.20120 (come da nota prot. 067877 del 7.02.2018 dell' Avvocatura Generale dello Stato già' trasmessa a questo Ufficio Commissariale).

IL DIRIGENTE
(*dr.ssa Enrica Del Casale*)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.

2. SSV LIONI – CONTURSI (Terzo tratto da Calabritto a Lioni))

I lavori della tratta stradale Lioni – Contursi III° tratto, in concessione al Consorzio INFR.AV., sono stati completati, collaudati, consegnati all'Ente gestore (Anas) ed aperti al traffico nell'anno 2000 (consegna provvisoria) e nel 2006 (consegna definitiva).

Residua, per quanto concerne gli espropri, **un solo contenzioso, attivato dal Comune di Caposele (AV).**

Il contenzioso venne attivato dal Comune di Caposele, nel novembre 2002, a seguito di **opposizione all'indennità espropriativa dell'area denominata "Le Fornaci"**, occorsa per la realizzazione dei lavori dello Svincolo della SSV Contursi – Lioni a servizio dell'abitato di Materdomini (Frazione di Caposele), ed in merito al quale il Consorzio, in virtù degli obblighi di Convenzione, è parte resistente per conto dell'Ente Concedente.

Si riepilogano di seguito i principali passaggi della vicenda:

- a seguito dell'approvazione delle stime e della mancata accettazione da parte del Comune di Caposele, il Consorzio provvede a depositare, nel mese di maggio 2002, presso la Cassa Depositi e Prestiti di Avellino la somma di euro 109.500,00;
- il Consorzio ha poi concluso regolarmente e legittimamente la relativa procedura espropriativa, terminata con l'emissione, sempre nel corso dell'anno 2002, del decreto di esproprio emesso dalla Prefettura di Avellino e con la successiva trascrizione e volturazione;
- il Comune di Caposele incardinò un contenzioso formulando una richiesta iniziale di euro 2.857.000,00;
- il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (AV) emise nel mese di maggio 2011 una sentenza non definitiva (n° 244/2011), disponendo, nel contempo, di rimettere la causa sul ruolo per conferire al CTU un incarico integrativo ai fini della rielaborazione dei conteggi sulla scorta delle decisioni adottate dal Giudice;
- nel mese di settembre 2011, il medesimo Tribunale affidò al CTU l'incarico di effettuare i calcoli per tener conto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n° 181/2011 nel frattempo intervenuta;
- successivamente, il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi è stato soppresso e la causa è proseguita presso il Tribunale di Avellino;
- in data 12 febbraio 2015 il Tribunale di Avellino ha messo la Sentenza definitiva n° 46, che ha ridotto drasticamente le pretese del Comune di Caposele a circa euro 275.000,00 oltre spese legali e di CTU (da cui vanno detratti circa euro 110.000,00 depositati a suo tempo presso la Cassa Depositi e Prestiti di Avellino), a fronte della richiesta iniziale di euro 2.857.000,00;
- il Comune di Caposele, con atto notificato nel mese di marzo 2016, ha proposto appello presso la Corte di Appello di Napoli avverso la Sentenza non definitiva n° 244/2011 emessa dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi ed avverso la Sentenza definitiva n° 46/2015 emessa dal Tribunale di Avellino;
- la prossima udienza presso la **Corte di Appello di Napoli**, per la precisazione delle conclusioni, è prevista per il **19 febbraio 2019**;

- il Comune di Caposele ha inoltre ingiunto al Consorzio nel mese di novembre 2016, con Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, il pagamento della somma di euro 165.000,00 circa, a cui il Consorzio si è opposto;
- la prossima udienza relativa alla opposizione al decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Roma è prevista, per la discussione orale, per il giorno 17 aprile 2020.

Ai fini delle provviste finanziarie eventualmente da appostare, va ricordato che gli oneri connessi agli esiti della sentenza, essendosi la procedura espropriativa riguardante l'area in questione conclusa regolarmente e legittimamente, non sono addebitabili al Concessionario, bensì restano a carico dell'Ente Concedente.

Ciò in virtù di quanto previsto sia nella Convenzione che nell'Atto di Transazione dell'11 luglio 2008, oltre che di quanto disposto dalla Legge n. 144 del 17 maggio 1999, all'art. 42, comma 3, recante disposizioni in merito agli oneri dei contenziosi a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere agli Enti destinatari (casistica in cui ricade il contenzioso in argomento).

Questi oneri, quindi, qualora anticipati dal Consorzio, dovranno essergli rimborsati dall'Ente Concedente.

							TRANSAZIONI		
PROG	Lotto	Comune	RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE		RICHIESTE PRIVATE		NUMERO	PRATICHE ASSISTITE	PRATICHE PRIVATE
			DITTE	IMPORTI RICHIESTI : €. 6.350.513,46 al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione	DITTE	IMPORTI RICHIESTI : €. 7.500.000,00 circa al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria		IMPORTO LORDO	
6057	2	Pescopagano	Comune di Pescopagano (PZ)	342.508,64			1	220.954,87	
6057	1	Pescopagano	Di Napoli Antonia	2.641,00			2	1.690,78	
6057	1	Pescopagano	Borea Pietro	36.737,04			3	15.759,47	
6057	1	Pescopagano	Masini Margherita	3.079,87			4	1.737,77	
6057	2	Muro Lucano	Melucci Antonio	77.150,41			5	26.076,95	
6057	2	Castelgrande	Coppola Teresa	5.797,59			6	5.240,53	
6057	3	Castelgrande	Federici Vito, Muro Angela Maria	20.990,70			7	10.211,38	
6057	1	Pescopagano	Angiolillo Chiara	6.928,24			8	3.477,93	
6057	2	Muro Lucano	Rendina Santo Giovanni	13.563,13			9	5.164,19	
6057	2	Castelgrande	Coppola Vito	10.673,86			10	11.235,64	
6057	2	Castelgrande	Greco Agatina	8.324,41			11	5.458,63	
6062		Muro Lucano	Pepe Franco, Coca Russo Rosaria	686.635,54			12	497.083,04	
6057	2	Pescopagano	Pinto Giuseppina	26.170,23			13	10.673,26	
6057	2	Muro Lucano			Rendina Gerardo	rapporto mesi 231/96*	14		26.759,14
6057	2	Muro Lucano			Tarricone Mario	rapporto mesi 242/96*	15		8.749,65
6057	3	Muro Lucano	Cerone Vita Maria	59.038,04			16	20.267,81	
6057	2	Muro Lucano			Altieri Luigi (Rosario)	rapporto mesi 239/96*	17		4.115,60
6057	1	Pescopagano	Roselli Francesco P., Pinto Teresa	9.738,62			18	6.345,07	
6057	1	Pescopagano	Roselli Arcadio Gerardo	7.302,32			19	2.973,41	
6057	1	Pescopagano	Zarrilli Giuseppe	6.868,94			20	3.223,91	
6057	1	Calitri	Metallo Michelina	18.920,24			21	18.920,64	
6063		Calitri	Maffucci Teresa	30.191,55			22	13.041,80	
6064		Calitri	Maffucci Teresa	15.568,28			23	6.715,00	
6063		Calitri	Pastore Antonio Raffaele	15.909,12			24	15.909,12	
6057	1	Pescopagano	Errico Maria Lucia	45.620,37			25	24.553,42	
6063		Calitri	Zarrilli Vincenzo	4.287,83			26	1.626,45	
6063		Calitri	Santoro Iolanda,Capossela Giusepp	29.087,15			27	10.617,46	
6057	2	Muro Lucano	Rendina Gerardo e Magro Carmela	10.604,04			28	3.366,36	
6057	3	Castelgrande	Gasparrini Maria	14.229,64			29	5.951,79	
6057	3	Muro Lucano	Sarcinella Annunziata Giuseppina	27.120,20			30	16.932,58	

							TRANSAZIONI	
PROG	Lotto	Comune	RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE		RICHIESTE PRIVATE		PRATICHE ASSISTITE	PRATICHE PRIVATE
			DITTE	IMPORTI RICHIESTI : €. 6.350.513,46 al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione	DITTE	IMPORTI RICHIESTI : €. 7.500.000,00 circa al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria	NUMERO	IMPORTO LORDO
6063		Calitri			ditta LANCIERI SNC	rapporto mesi 267/96*	759	1.790,10
6057	2	Muro Lucano			ZAMPINO FELICIA	rapporto mesi 267/96*	760	494,57
6057	2	Muro Lucano			MALPEDE VITO	rapporto mesi 267/96*	761	10.349,56

TOTALI	6.350.513,46	NON QUANTIFICATO ma di importo presuntivo di circa 7.500.000 €
--------	--------------	--

3.849.631,21	4.589.192,66
--------------	--------------

TOTALI GENERALI	Euro 13.850.513,46
-----------------	--------------------

Euro 8.438.823,87

* a fronte dei mesi sopraportati di effettiva occupazione delle particelle sono stati riconosciuti n.96 mesi

COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02

ELENCO TRANSAZIONI DI NATURA NON ESPROPRIATIVA

DATA SOTTOSCRIZIONE	CONTROPARTE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO TRANSATTO
22.03.2006	ING. GRAZIOSI (PROG. 6066)	(1) 822.864,31	219.053,68
28.09.2006	CONSORZIO ASI SALERNO/SERVIZI TECNICI SPA (PROG.6205)	(2) 4.033.681,73	1.200.000,00
02.07.2007	ICAB SPA (PROG. 6003)	//	* 19.946,42
23.10.2007	ING. NAPOLITANO (PROG.6054)	(3) 168.976,23	150.000,00
11.08.2008	CONSORZIO INFRAV (PROG.6055)	(1) 10.646.295,05	1.590.000,00
06.10.2008	COMMISSIONE DI COLLAUDO (PROG. 6055)	(1) 234.355,69	51.000,00
26.02.2009	ING. D'AGOSTINO GIANCARLO (PROG. 6055)	(4) 612.653,35	400.000,00
15.07.2009	ICLA SPA (PROGG.6006-6012-6057-6062-6063-6064-6069)	(5) 29.803.926,74	16.000.000,00
13.08.2009	INFRATERR SRL (PROG. 6057/03-01)	(1) 442.990,99	160.000,00
23.06.2010	COMUNE DI EBOLI/SOC.CON.S.MISTA SPA (PROG.6096-6097)	//	* 1.041,03
27.12.2013	AVV. CAPECE MINUTOLO	(1) 260.525,35	50.000,00
* A FAVORE UFFICIO COMMISSARIO AD ACTA (1) Richiesto dalla controparte (2) Da sentenza (3) Decreto Ingiuntivo (4) Decreto ministeriale (5) Da sentenza con pignoramento esecutivo già in atto			

411.7

Decreti Definitivi di esproprio

27/12/2018

N. decreto	Data Decreto	N Progetto	Esproprio Definitivo
1355	09/04/2015	60/6057/2	☒
1382	22/04/2015	60/6062	☒
1386	04/05/2015	060/6062	☒
1387	11/05/2015	60/6062	☒
1388	26/05/2015	60/6057	☒
1389	08/06/2015	40/6064	☒
1410	21/07/2015	40/6063	☒
1411	27/07/2015	40/6063	☒
1413	28/07/2015	06057/2	☒
1414	04/08/2015	60/6057/1	☒
1417	14/09/2015	40/6006	☒
1420	16/09/2015	40/6006	☒
1438	28/09/2015	60/6057/2	☒
1440	06/10/2015	60/6057/2	☒
1442	14/10/2015	60/6057/2	☒
1443	22/10/2015	060/6057/2	☒
1445	28/10/2015	60/6057/2	☒
1453	16/11/2015	60/6057/2	☒
1456	25/11/2015	60/6057/3/1	☒
1460	15/12/2015	060/6057/1	☒
1469	07/01/2016	60/6057/2	☒
1470	07/01/2016	60/6057/2	☒
1471	11/01/2016	60/6062	☒
1495	13/01/2016	60/6069	☒

N. decreto	Data Decreto	N Progetto	Esproprio Defin
1497	03/02/2016	40/6006	☒
1498	03/02/2016	40/6006	☒
1499	19/02/2016	60/6057/3/1	☒
1502	01/03/2016	60/6057/2	☒
1503	01/03/2016	60/6057/2	☒
1532	02/05/2016	40/6063	☒
1536	12/05/2016	40/6064	☒
1537	18/05/2016	40/6006	☒
1538	18/05/2016	40/6012	☒
1541	06/06/2016	60/6057/1	☒
1547	12/07/2016	60/6057/2	☒
1548	18/07/2016	60/6057/2	☒
1568	12/09/2016	60/6057/1	☒
1569	12/09/2016	60/6062	☒
1571	19/09/2016	60/6057/2	☒
1572	19/09/2016	60/6062	☒
1573	28/09/2016	60/6069	☒
1574	03/10/2016	60/6057/2	☒
1575	03/10/2016	60/6057/2	☒
1576	10/10/2016	60/6057/3	☒
1579	19/10/2016	60/6062	☒
1580	28/10/2016	40/6063	☒
1581	28/10/2016	60/6057/2	☒
1582	28/10/2016	60/6057/1	☒

N. decreto	Data Decreto	N Progetto	Esproprio Defin
1583	02/11/2016	60/6057/2	☒
1617	09/01/2017	60/6057/3/1	☒
1620	07/02/2017	60/6057/3/1	☒
1635	08/03/2017	60/6057/2	☒
1645	11/04/2017	40/6006	☒
1646	11/04/2017	60/6057/1	☒
1647	11/04/2017	60/6057/2	☒
1649	19/04/2017	60/6057/2	☒
1650	19/04/2017	60/6062	☒
1707	28/08/2017	60/6057/2	☒
1713	20/09/2017	60/6057/2	☒
1714	20/09/2017	60/6057/3/1	☒
1715	21/09/2017	60/6057/3/	☒
1717	27/09/2017	060/6057/2	☒
1718	27/09/2017	60/6062	☒
1719	02/10/2017	60/6057/3/1	☒
1730	03/11/2017	60/6057/3/1	☒
1805	15/12/2017	60/6057/2	☒
1810	18/12/2017	60/6057/3/1	☒
1811	18/12/2017	60/6057/1	☒
1814	29/12/2017	60/6057/1	☒
1815	29/12/2017	60/6057/1	☒
1816	29/12/2017	60/6057/3/1	☒
1817	29/12/2017	60/6062	☒

N. decreto	Data Decreto	N Progetto	Esproprio Defin
1820	08/01/2018	040/6012	☒
1821	08/01/2018	040/6063	☒
1822	12/01/2018	60/6057/2	☒
1823	12/01/2018	60/6069	☒
1824	12/01/2018	40/6006	☒
1825	12/01/2018	40/6064	☒
1829	30/01/2018	60/6057/2	☒
1831	30/01/2018	60/6062	☒
1832	30/01/2018	040/6063	☒
1834	12/02/2018	60/6069	☒
1835	12/02/2018	60/6062	☒
1844	15/02/2018	40/6006	☒
1849	19/03/2019	60/6057/2	☒
1850	19/03/2018	60/6057/3/1	☒
1856	20/04/2018	40/6003	☒
1857	20/04/2018	40/6006	☒
1859	26/04/2018	40/6006	☒
1860	26/04/2018	40/6012	☒
1874	15/05/2018	40/6063	☒
1877	18/05/2018	60/6057/3/1	☒
1878	18/05/2018	60/6057/3/1	☒
1891	30/05/2018	60/6057/1	☒
1892	01/06/2018	60/6057/2	☒
1897	04/06/2018	40/6063	☒

N. decreto	Data Decreto	N Progetto	Esproprio Defin
1898	04/06/2018	60/6057/2	☒
1903	11/06/2018	60/6069	☒
1909	04/07/2018	40/6063	☒
1910	04/07/2018	60/6069	☒
1911	04/07/2018	60/6057/3/1	☒
1926	13/07/2018	40/6006	☒
1928	18/07/2018	60/6069	☒
1935	31/07/2018	60/6057/1	☒
1951	18/09/2018	60/6062	☒
1952	20/09/2018	60/6057/2	☒
1953	01/10/2018	60/6057/2	☒
1961	15/10/2018	60/6062	☒
1962	16/10/2018	60/6057/2	☒
1988	13/11/2018	60/6069	☒
1990	15/11/2018	40/6064	☒
1991	15/11/2018	60/6057/1	☒
1993	19/11/2018	60/6057/1	☒
1994	19/11/2018	60/6057/1	☒
2003	20/11/2018	60/6062	☒
2014	14/12/2018	60/6057/2	☒
2015	14/12/2018	60/6057/2	☒
2016	14/12/2018	60/6057/3/1	☒
2017	14/12/2018	40/6006	☒
2018	14/12/2018	40/6063	☒



Ministero dello Sviluppo Economico

Il Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

ELENCO DEPOSITI EFFETTUATI C/O LA RTS DI PZ E NA (PERFEZIONATI CON DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO)

c/o Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli:

**Prog. 39/60/COM/6063 – Strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401
"Ofantina"**

Determina commissariale prot.n.1828 del 16/01/2018

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Calitri (AV)	ZABATTA Lucia nata a Calitri (AV) il 20/06/1913 - C.F. ZBTLCU13H60B415V	48	705 (ex 291)	115	48,10
Calitri (AV)	TOGLIA Costantino nato a Calitri (AV) il 23/02/1929 - C.F. TGLCTN29B23B415W TOGLIA Vincenza nata a Calitri (AV) il 04/01/1935 - C.F. TGLVCN35A44B415J TOGLIA Vito	59	1357 (ex 111) 1369 (ex 112)	105 165	219,68
Calitri (AV)	SCOCA Rosina nata a Calitri (AV) il 27/05/1929 - C.F. SCCRSN29E67B415B	48	713 (ex 276) 347 (ex 276)	80 2	15,54
Calitri (AV)	LEONE Angelo Mario nato a Calitri (AV) il 12/12/1928 - C.F. LNENLM28T12B415I	34	454 (ex 89) 452 (ex 89)	425 25	1.030,09
Calitri (AV)	DE NICOLA Giovanna nata a Calitri (AV) il 28/06/1928 - C.F. DNCGNN28H68B415N	59	1174 (ex 469) 1173 (ex 469)	415 83	502,60
Calitri (AV)	PANNIELLO Donatella nata a Calitri (AV) il 20/07/1941 - C.F. PNNDTL41L65B415R ZARRILLI Antonio nato a Calitri (AV) il 17/03/1936 - C.F. ZRRNTN36C17B415S ZARRILLI Canio nato a Calitri (AV) il 07/06/1934 - C.F. ZRRCNA34H07B415J ZARRILLI Concetta nata a Calitri (AV) il 08/09/1925 - C.F. ZRRCC25P48B415E ZARRILLI Giuseppe nato a Calitri (AV) il 11/10/1960 - C.F. ZRRGPP60R11B415Q DE NICOLA Maria nata a Calitri (AV) il 14/02/1904 - C.F. DNCMRA04B54B415K ZARRILLI Maria Incoronata nata a Calitri (AV) il 03/05/1968 - C.F. ZRRMNC58E43B415T ZARRILLI Michele Antonio nato a Calitri (AV) il 24/01/1963 - C.F. ZRRMHL63A24B415M ZARRILLI Raffaele nato a Calitri (AV) il 25/01/1919 - C.F. ZRRRFL19A25B415I ZARRILLI Rosa nata a Calitri (AV) il 11/03/1930 - C.F. ZRRRSO30C51B415C ZARRILLI Teresa nata a Calitri (AV) il 03/06/1942 - C.F. ZRRTRS42H43B415A ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il 27/04/1927 - C.F. ZRRVCN27D27B415T	59	1113 (ex 587) 1115 (ex 589) 1461 (ex 587)	195 40 40	604,04

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02

c/o Ministero dello Sviluppo Economico

Viale America, 201 - 00144 ROMA

Tel. 06.54927818-7763 - fax 06.54927828

filippo.dambrosio@sviluppoeconomico.gov.it

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Calitri (AV)	VALLARIO Antonietta nata a Varese (VA) il 22/08/1966 - C.F. VLLNNT66M62L682K VALLARIO Canio Antonio nato a Calitri (AV) il 18/03/1927 - C.F. VLLCNT27C18B415X VALLARIO Giuseppe nato a Calitri (AV) il 01/02/1943 - C.F. VLLGPP43B01B415H VALLARIO Leonardo nato a Calitri (AV) il 05/06/1963 - C.F. VLLLRD63H05B415P VALLARIO Lorenzo nato a Calitri (AV) il 21/01/1934 - C.F. VLLLNZ34A21B415P VALLARIO Michele nato a Calitri (AV) il 21/06/1940 - C.F. VLLMHL40H21B415N VALLARIO Rosa nata a Calitri (AV) il 06/05/1929 - C.F. VLLRSO29E46B415E VALLARIO Salvatore nato a Calitri (AV) il 15/08/1936 - C.F. VLLSVT36M15B415L	59	1148 (ex 235) 1427 (ex 235)	900 260	888,94
Calitri (AV)	METALLO Vito nato a Calitri (AV) il 16/02/1938 - C.F. MTLVTI38B16B415J	59	1058 (ex 290) 1059 (ex 291) 1409 (ex289)	320 250 610	1.583,66
Calitri (AV)	MAFFUCCI Mario nato a Calitri (AV) il 19/10/1952 - C.F. MFFMRA52R19B415V	59	1187 (ex 639) 1443 (ex 639)	450 90	948,42
Calitri (AV)	GERVASI Benedetta nata a Calitri (AV) il 27/12/1949 - C.F. GRVBDT49T67B415S GERVASI Giovanna nata a Calitri (AV) il 16/01/1949 - C.F. GRVGNN49A56B415O GERVASI Giuseppe nato a Calitri (AV) il 01/03/1958 - C.F. GRVGPP58C01B415M GERVASI Teresa nata a Calitri (AV) il 10/11/1946 - C.F. GRVTRS46S50B415O	59	1364 (ex 109) 1374 (ex 523)	10 100	154,90

Prog. 36/40/6006 – Nucleo Industriale di Calitri
Determina Commissariale prot.n.1826 del 16/01/2018

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Calitri (AV)	CAPOSSELA Francesca nata a Calitri (AV) il 07/04/1963 - C.F. CPSFNC63D47B415Z CAPOSSELA Lucia nata a Calitri (AV) il 10/08/1957 - C.F. CPSLCU57M50B415G	61	1106 (ex647) 1112 (ex 650)	150 1250	27,77
Calitri (AV)	DI CAIRANO Rosa nata a Calitri (AV) il 02/12/1911 - C.F. DCRRSO11T42B414A	64	642	600	504,03

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Calitri (AV)	DI GUGLIELMO Luigi nato in Venezuela (EE) il 04/02/1962 C.F. DGGLGU62B04Z614U DI GUGLIELMO Margherita nata in Venezuela (EE) il 05/09/1970 C.F. DGGMGH70P45Z614T TUOZZOLO Rosa nata a Calitri (AV) il 27/10/1934 - C.F. TZZRSO34R67B415P	61	857 (ex 435) 859 (ex 435)	1700 128	2.058,28
Calitri (AV)	DI MILIA Nicola nato a Calitri (AV) il 01/02/1947 - C.F. DMLNCL47B01B415O DI MILIA Rosa Maria nata a Calitri (AV) il 27/03/1941 - C.F. DMLRMR41C67B415H	64	641	520	219,85
Calitri (AV)	GALGANO Attilio nato a Calitri (AV) il 17/12/1927 - C.F. GLGTTL27T17B415X	61	1116 (ex 367)	550	306,64
Calitri (AV)	LUCREZIA Franca nata a Calitri (AV) il 11/12/1953 - C.F. LCRFNC53T51B415W LUCREZIA Maria Concetta nata a Calitri (AV) il 22/12/1964 C.F. LCRMCN64T62B415I LUCREZIA Raffaele nato a Calitri (AV) il 30/01/1956 - C.F. LCRRFL56A30B415Z LUCREZIA Antonio nato a Calitri (AV) il 09/10/1960 - C.F. LCRNTN60R09B415S	61	1120 (ex 364)	960	171,90
Calitri (AV)	LUONGO Giovanni nato a Cairano (AV) il 14/08/1910 C.F. LNGGNN10M14B367A LUONGO Santa Incoronata nata a Calitri (AV) il 31/07/1928 C.F. LNGSTN28L71B415V	61	525	100	1.328,42
Calitri (AV)	ROSANIA Canio nato a Calitri (AV) il 26/03/1934 - C.F. RSNCNA34C26B415V ROSANIA Vincenzo nato a Calitri (AV) il 06/06/1936 - C.F. RSNVCN36H05B415W	64	188	280	842,72
Calitri (AV)	COMUNE DI CALITRI C.F. 00218950640 (Concedente) RUSSO Gianbattista nato a Calitri (AV) il 16/11/1914 C.F. RSSGBT14S16B414L (livellario)	61	290 291	770 2400	159,28

Prog. 39/40/6012 – Nucleo Industriale di Nerico
Determina Commissariale prot.n.1826 del 16/01/2018

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Calitri (AV)	DE NICOLA Maria nata a Calitri (AV) il 14/02/1904 - C.F. DNCMRA04B54B415K PANNIELLO Donatella nata a Calitri (AV) il 20/07/1941 - C.F. PNNDTL41L65B415R ZARRILLI Antonio nato a Calitri (AV) il 17/03/1936 - C.F. ZRRNTN36C17B415S ZARRILLI Canio nato a Calitri (AV) il 07/06/1934 - C.F. ZRRCNA34H07B415J ZARRILLI Concetta nata a Calitri (AV) il 08/09/1925 - C.F. ZRRCCT25P48B415E ZARRILLI Giuseppe nato a Calitri (AV) il 11/10/1960 - C.F. ZRRGPP60R11B415Q ZARRILLI Maria Incoronata nata a Calitri (AV) il 03/05/1968 - C.F. ZRRMNC58E43B415T ZARRILLI Michele Antonio nato a Calitri (AV) il 24/01/1963 - C.F. ZRRMHL63A24B415M ZARRILLI Raffaele nato a Calitri (AV) il 25/01/1919 - C.F. ZRRRFL19A25B415I ZARRILLI Rosa nata a Calitri (AV) il 11/03/1930 - C.F. ZRRRSO30C51B415C ZARRILLI Teresa nata a Calitri (AV) il 03/06/1942 - C.F. ZRRTRS42H43B415A ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il 27/04/1927 - C.F. ZRRVCN27D27B415T	59	1340 (ex 850) 1326 (ex 122)	17 410	427,00
Calitri (AV)	ZARRILLI Concetta nata a Calitri (AV) il 27/04/1925 - C.F. ZRRCCT25D67B415I ZARRILLI Rocco nato a Calitri (AV) il 20/02/1932 - C.F. ZRRRCC32B20B415E ZARRILLI Rosa nata a Calitri (AV) il 04/10/1922 - C.F. ZRRRSO22R44B415N ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il 01/01/1928 - C.F. ZRRVCN28A01B415V	59	1338 (ex 849 ex 375)	8	8,00
Calitri (AV)	ZARRILLI Concetta nata a Calitri (AV) il 27/04/1925 - C.F. ZRRCCT25D67B415I ZARRILLI Rocco nato a Calitri (AV) il 20/02/1932 - C.F. ZRRRCC32B20B415E ZARRILLI Rosa nata a Calitri (AV) il 04/10/1922 - C.F. ZRRRSO22R44B415N ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il 01/01/1928 - C.F. ZRRVCN28A01B415V	59	1329 (ex 360)	141	423,00
Calitri (AV)	DI MAIO Mariangela nata a Saracena (CS) il 02/01/1941 - C.F. DMIMNG41A42I423S DI MAIO Vincenza nato a Calitri (AV) il 01/04/1933 - C.F. DMIVCN33D41B415S GALGANO Maria Teresa nata a Calitri (AV) il 09/03/0937 - C.F. GLGMTR37C49B415W GALGANO Maria Vincenza nata a Calitri (AV) il 09/04/1948 - C.F. GLGMVN48D49B415T DI MAIO Pasquale nato a Calitri (AV) il 23/06/1950 - C.F. GLFPQL50H23B415G	59	1336 (ex 376)	10	30,00

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Calitri (AV)	ZARRILLI Canio	59	1331 (ex 373)	90	270,00
Calitri (AV)	ZARRILLI Maria Concetta	59	1333 (ex 374)	90	570,00

c/o Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza:

**Prog. 39/60/COM/6057 III lotto 1° Stralcio I perizia di variante
Determina Commissariale prot.n.1851 del 27/03/2018**

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Muro Lucano	ANGELICCHIO Felice nato a Muro Lucano il 07/02/1950 C.F. NGLFLC50B07F817J	29	43	144	15,30
Muro Lucano	ANGELICCHIO Nunziata nata a Muro Lucano il 01/01/1935 C.F. NGLNZT35A41F817O DI NICOLA Carmine nato a Muro Lucano il 22/01/1935 C.F. NCCMN35A22F817Q	29	846 (ex 658) 848 (ex 659)	328 110	507,51

Per le ditte sotto riportate è avvenuto il deposito e si è provveduto ad emettere il relativo decreto definitivo ma non si è potuto dare seguito alla registrazione trascrizione e volturazione in quanto soggetti con dati anagrafici incompleti.

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Muro Lucano	CARDILLO Maria; di GIUSEPPE Mar. Masi	29	646 840 (ex 647)	27 444	325,17
Muro Lucano	CARDILLO Domenico;FU Vito CARDILLO Grazia;FU Vito CARDILLO Maria;FU Vito CARDILLO Nicola;FU Vito CARDILLO Rosa;FU Vincenzo GIORGIO Vita; Maria fu Francesco Ved Cardillo	29	654 842 (ex 655) 778 779	487 210 782 40	1.760,07

Muro Lucano	MURO Mariantonia nata a Castelgrande il 04/11/1920	29	780	180	839,08
	MURO Rosa nata a CASTELGRANDE il 29/12/1924 C.F. MRURSO24T69C120T		852 (ex 781)	544	

**ELENCO DEPOSITI EFFETTUATI
(CON DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO IN FASE DI PERFEZIONAMENTO)**

**Prog. 39/60/COM/6057 II lotto 2^ perizia di variante
Determina Commissariale prot.n.1942 del 30/08/2018**

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Muro Lucano 6057/II - 2^ Perizia Piano 2	CERONE FILOMENA nata a MURO LUCANO (PZ) il 07/04/1916 C.F.: CRNFMN16D47F817Y propr.1/1	45	1396 (ex 198)	50	55,62
Muro Lucano 6057/II - 2^ Perizia Piano 6	MANGONE LUCIA nata a MURO LUCANO (PZ) il 20/10/1910 C.F.: MNGLCU12R60F817L propr.1/1	45	1414 (ex 275)	41	50,18
Muro Lucano 6057/II - 2^ Perizia Piano 8	CRUSCO ANDREA nato a MURO LUCANO (PZ) il 01/07/1946 C.F.: CRSNDR46L01F817C Proprieta' 1/12 CRUSCO DOMENICO nato a MURO LUCANO (PZ) il 11/12/1941 C.F.: CRSDNC41T11F817W Proprieta' 1/12; CRUSCO FRANCESCO nato a MURO LUCANO (PZ) il 01/05/1939 C.F.: CRSFNC39E01F817Y Proprieta' 1/12; CRUSCO MICHELE nato a MURO LUCANO (PZ) il 31/01/1914 C.F.: CRSMHL14A31F817U Proprieta' 1/12 FARENGA ANTONIETTA nata a MURO LUCANO (PZ) il 24/12/1959 C.F.: FRNNNT59T64F817NProprieta'3/12 FARENGA DOMENICO nato a MURO LUCANO (PZ) il 21/09/1965 C.F.:FRNDNC65P21F817MProprieta'3/12 FARENGA MARIA LUCIA nata a MURO LUCANO (PZ) il 22/04/1925 C.F.:FRNMLC25D62F817I Proprieta'2/12	45	620	108	42,55

Prog. 39/60/COM/6057 II lotto
Determina Commissariale prot.n.1943 del 30/08/2018

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Pescopagano 6057/II Lotto Piano 9	ALTERA Andrea nato a Pescopagano (PZ) il 21/09/1899; LTRNDR99P21G496M; Proprieta'; 72/360 ALTERA Angela Lina nata a Pescopagano (PZ) il 01/05/1957; LTRNLL57E41G496B; Proprieta'; 8/360 ALTERA Francesco nato a Pescopagano (PZ) il 16/10/1925; LTRFNC25R16G496B; Proprieta'; 24/360 ALTERA Francesco nato a Pescopagano (PZ) il 16/10/1964; LTRFNC64R16G496K; Proprieta'; 8/360 ALTERA Gerardo nato a Pescopagano (PZ) il 01/10/1906; LTRGRD06R01G496Y; Proprieta'; 72/360 ALTERA Giuseppina nata a Pescopagano (PZ) il 12/03/1953; LTRGPP53C52G496V; Proprieta'; 8/360 ALTERA Michele nato a Pescopagano (PZ) il 17/12/1902; LTRMHL02T17G496P; Proprieta'; 72/360 ALTERA Pasquale nato a Paterno (PZ) il 16/03/1911; LTRPQL11C16M269Z; Proprieta'; 72/360 MASINI Marco nato a Pescopagano (PZ) il 18/03/1956; MSNMRC56C18G496F; Proprieta'; 3/360 MASINI Marco nato a Pescopagano (PZ) il 18/03/1956; MSNMRC56C18G496F; Proprieta'; 6/360 MASINI Rosa nata a Pescopagano (PZ) il 19/02/1953; MSNRSO53B59G496Y; Proprieta'; 1/40 ROSELLI Mauro Nicola nato a Pescopagano (PZ) il 27/05/1946; RSLMNC46E27G496Q; Proprieta'; 6/360	24	64	505	474,70
Pescopagano 6057/II Lotto Piano 17	Araneo Maria Giuseppa nata a Pescopagano il 05/02/1957 C.F.: RNAMGS57B45G496N; Iacoviello Elisabetta nata a Barletta il 05/11/1941 C.F.: CVLLBT41S45A669L; Iacoviello Giovanni nato a Lavello il 03/01/1956 C.F.: CVLGNN56A03E493V Iacoviello Mauro nato a Pescopagano il 19/11/1945 C.F.: CVLMRA45S19G496H Via Giovanni nato a Pescopagano il 24/12/1952 C.F.: VIAGNN52T24G496H; Via Mauro nato a Pescopagano il 30/07/1936 C.F.: VIAMRA36L30G496V; Via Michele nato a Lavello il 26/07/1924 C.F.: VIAMHL24L26E493O Via Pietro nato a Pescopagano il 14/04/1927 C.F.: VIAPTR27D14G496D COMUNE DI PESCAPAGANO diritto del concedente C.F.: 00222420762	44	225 (ex 6) 254 (ex 6) 253 (ex 6)	4544 888 4288	4.781,20

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Pescopagano 6057/II Lotto Piano 24	PETRUZZO Anna Rosaria Palmira nata a NAPOLI (NA) il 17/12/1956; PTRNRS56T57F839Q; Proprieta'; 1/1	44	1	4280	2.226,80
Castelgrande 6057/II lotto Piano 61	Cardillo Domenico nato a Castelgrande il 26/04/1882 livellario per 1/8 Cardillo Grazia nata a Castelgrande il 29/09/1894 livellario per 1/8 Cardillo Maria nata a Castelgrande il 05/05/1991 livellario per 1/8 Cardillo Nicola con sede in Castelgrande livellario per 1/8 Comune di Castelgrande diritto del concedente Giorgio Vita Maria usufruttuario parziale di livello	40	163	900	282,00
Castelgrande 6057/II lotto Piano 44	DE SANCTIS Angelo fu Santo; Livellario in parte DE SANCTIS Donato fu Pietro Antonio; Livellario in parte DE SANCTIS Pietro, Antonio fu Santo; Livellario in parte DE SANCTIS Rosa, fu Santo; Livellario in parte MASI Giovanni, Berardino fu Vincenzo; Diritto del concedente	31	115	990	930,60
Castelgrande 6057/II lotto Piano 17	Lisanti Giuseppe nato a Salerno il 18/06/1974 C.F.: LSNGPP74H18H703Z Lisanti Guglielmo Giuseppe nato a Castelgrande il 01/08/1945 C.F.: LSNGLL45M01C120W Lisanti Michele nato a Salerno il 07/02/1973 C.F.: LSNMHL73B07H703U	7	29	607	279,22
Castelgrande 6057/II lotto Piano 24	COLONNA Alba Maria nata a Castelgrande (PZ) il 29/12/1957; CLNLMR57T69C120S; Proprieta'; 1/6 COLONNA Angiola nata a Castelgrande (PZ) il 08/03/1938; CLNNG138C48C120T; Proprieta'; 1/6 COLONNA Carmina nata a Castelgrande (PZ) il 07/06/1935; CLNCMN35H47C120U; Proprieta'; 1/6 COLONNA Felice nato a Castelgrande (PZ) il 24/01/1950; CLNFLC50A24C120Z; Proprieta'; 1/6 COLONNA Mariano nato a Castelgrande (PZ) il 30/12/1939; CLNMRN39T30C120E; Proprieta'; 1/6 COLONNA Vito Modesto nato a Castelgrande (PZ) il 15/07/1944; CLNVMD44L15C120K; Proprieta'; 1/6	21	6	285	131,10
Castelgrande 6057/II lotto Piano 59	Gonnella Luigi nato a Castelgrande il 28/09/1927 C.F.: GNNLGU27P28C120F Gonnella Pasqualino Mario nato a Castelgrande il 10/01/1970 C.F.: GNNPQL70A10C120B	40	434 435 (ex 55)	824 76	843,40

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Castelgrande 6057/II lotto Piano 46	GIANNI Anna fu Giuseppe vedova Masi MASI Angelo, Antonio fu Felice	31	301	90	84,60
Castelgrande 6057/II lotto. Piano 4	Coppola Pietro nato a Castelgrande (PZ) il 01/07/1902 c.f.: CPPPTR02L01C120D	7	1332 (ex 33) 1378 (ex 33) 1336 (ex 33) 1338 (ex 58)	3591 335 330 (mq.459 solo occ.ne)	6.140,97
Castelgrande 6057/II lotto. Piano 5	Cristiano Nicola nato a Castelgrande il 10/06/1910 c.f.: CRSNCL10H10C120J	7	1335 (ex 49) 1379 (ex 1334)	10 251	249,06
Muro Lucano 6057/II lotto Piano 15	RENDINA Luigi Pietro nato a Muro Lucano il 29/07/1934 C.F.: RNDLPT34L29F817L RENDINA Annunziata nata a Muro Lucano il 29/05/1969 C.F.: RNDNNZ69E69F817G Rendina Beatrice nata a Muro Lucano il 30/12/1957 C.F.: RNDBRC57T70F817T	29	174 175 176	32 52 146	248,95

Prog. 39/60/COM/6057 III lotto 1° Stralcio
Determina Commissariale prot.n.1944 del 30/08/2018

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Castelgrande 6057/III lotto 1° S. Piano 13	Giuliana Maria fu Vincenzo	20	418 (ex 18) 18	300 790	1.478,69
Castelgrande 6057/III lotto 1° S. Piano 17	Cianci Assunta nata a Castelgrande il 10/09/1906 C.F.: CNCSTNT06PC120X Federici Maria nata a Castelgrande il 09/09/1927 C.F.: FDRMRA27P49C120L Federici Pasquale nato a Castelgrande il 20/05/1929 C.F.: FDRPQL29E20C120J Masi Giovanni Diritto del concedente	20	507 (ex 46) 46	347 190	476,57
Castelgrande 6057/III lotto 1° S. Piano 26	Colonna Alba Maria nata a Castelgrande il 29/12/1957 C.F.: CLNLMR57T69C120S Colonna Angiola nata a Castelgrande il 08/03/1938 C.F.: CLNNGI38C48C120T Colonna Carmina nata a Castelgrande il 07/06/1935 C.F.: CLNCMN35H47C120U Colonna Felice nato a Castelgrande il 24/01/1950 C.F.: CLNFLC50A24C120Z Colonna Mariano nato a Castelgrande il 30/12/1939 C.F.: CLNMRN39T30C120E Colonna Rosa nata a Castelgrande il 17/03/1907 C.F.: CLNRSO07C57C120P Colonna Vito Modesto nato a Castelgrande il 15/07/1944 C.F.: CLNVMD44L15C120K Masi Francesco nato a Castelgrande il 27/04/1931 C.F.: MSAFNC31D27C120Z	21	170 (ex 108) 173 (ex 110) 174 (ex 110) 169 (ex 108)	37 49 23 18	61,08

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Muro Lucano 6057/III lotto 1° S. Piano 1	Cardillo Antonio nato a Muro Lucano il 13/04/1938 C.F.: CRDNTN38D13F817L Cardillo Antonio fu Giuseppe Cardillo Felicia di Antonio nata a Muro Lucano il 08/02/1907 Cardillo Filomena nata a Muro Lucano il 03/03/1942 C.F.: CRDFMN42C43F817E Cardillo Gerardo nato a Muro Lucano il 01/04/1950 C.F.: CRDGRD50D01F817E Cardillo Giovanni di Antonio nato a Muro Lucano il 27/09/1903 Cardillo Pasquale nato a Muro Lucano il 19/10/1952 C.F.: CRDPQL52R19F817S Cardillo Salvatore nato a Muro Lucano il 28/06/1959 C.F.: CRDSVT59H28F817W Cardillo Vito nato a Muro Lucano il 24/08/1956 C.F.: CRDVTI56M24F817G	28	26	72	42,84
Muro Lucano 6057/III lotto 1° S. Piano 9	Cardillo Antonio fu Pasquale Cardillo Antonio fu Pietro Cardillo Giovanni fu Pasquale nato a Muro Lucano il 25/11/1922 C.F.: CRDGNN22S25F817O Cardillo Giuseppe fu Pietro Cardillo Pietro nato a Muro Lucano il 02/07/1906 C.F.: CRDPTR06L02F817D Cardillo Rosa Maria fu Pasquale	29	230	85	18,63
Muro Lucano 6057/III lotto 1° S. Piano 21	De Nicola Teresa fu Vincenzo nata Muro Lucano il 13/10/1908 Rendina Antonio fu Vincenzo nato a Muro Lucano 19/12/1908 Rendina Carmela nata a Muro Lucano il 25/10/1969 C.F.: RND CML69R65817W Rendina Domenico fu Pietro nato a Muro Lucano il 28/03/1882 Rendina Francesco fu Vincenzo nato a Muro Lucano il 11/08/1911 Rendina Giuseppe fu Pietro nato a Muro Lucano il 24/09/1975 Rendina Maria fu Francesco nata a Muro Lucano il 11/08/1906 Rendina Pasquale fu Vincenzo nato a Muro Lucano il 04/04/1915 Rendina Pasquale fu Pietro Rendina Pietro fu Francesco nato a Muro Lucano il 14/02/1897 Rendina Pietro fu Vincenzo nato a Muro Lucano il 22/08/1894 Rendina Vincenzo fu Pietro nato a Muro Lucano il 02/03/1966 Selvaggi Angela di Vincenzo nata a Muro Lucano il 20/12/1885	41	317 (ex 35)	25	13,22

Prog. 39/60/COM/6057 III lotto 1° Stralcio
Determina Commissariale prot.n.1987 del 12/11/2018

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Muro Lucano 6057/III lotto 1° Stralcio	ALOISIO Domenico nato a Muro Lucano il 11/05/1943 C.F. LSADNC43E11F817I Prop. per 1/5	45	166	2786	610,24

Prog. 39/60/COM/6057 III lotto 1° Stralcio
Determina Commissariale prot.n.2009 del 30/11/2018

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Pescopagano 6057/III lotto I stralcio	RENDINA Giuseppe nato a Muro Lucano (PZ) il 21/01/1968 C.F.: RNDGPP68A21F817Q Prop. per 1/1	22	539 (ex 512-68-18) ex 68	3.450 1.250 (occ.ne)	8.723,95
Muro Lucano 6057/III lotto I stralcio	RENDINA Giuseppe nato a Muro Lucano (PZ) il 21/01/1968 C.F.: RNDGPP68A21F817Q Prop. per 1/1	41	51	265 (occ.ne)	301,66

Prog. 39/60/COM/6057 II lotto
Determina Commissariale prot.n.2008 del 30/11/2018

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità depositata
Pescopagano 6057/II lotto	RENDINA Giuseppe nato a Muro Lucano (PZ) il 21/01/1968 C.F.: RNDGPP68A21F817Q Prop. per 1/1	22	542 (ex 513-68-18) 521 (ex 28) 519 (ex 29) 541 (ex 513-68-18) 543 (ex 513-68-18) ex 18 ex 28 473 (ex 19) 31	19.269 893 3.327 2.244 6.620 32.981(occ.ne) 5.067 (occ.ne) 920 (occ.ne) 3.440 (occ.ne)	23.709,05

**ELENCO RICHIESTA DI APERTURA DI DEPOSITO C/O LA RTS DI NAPOLI
A CUI LA STESSA NON HA DATO SEGUITO**

Prog. 39/40/COM/6063

Determina Commissariale prot.n.1900 del 05/06/2018

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità da depositare
Calitri (AV)	ZARRILLI Maria	48	701 (ex 533 ex 126)	170	255,00
Calitri (AV)	GALGANO Vincenzo nato a Calitri (AV) il 24/09/1924 - C.F. GLGVCN24P24B415X	31	1121 (ex 851 ex 416)	270	594,00
Calitri (AV)	ZARRILLI Antonio nato a Calitri (AV) il 14/08/1932 - C.F. ZRRNTN32M14B415T ZARRILLI Canio nato a Calitri (AV) il 13/06/1930 - C.F. ZRRCNA30H13B415W ZARRILLI Maria; ZARRILLI Vincenza nata a Calitri (AV) il 16/07/1936 C.F. ZRRVCN36L56B415S ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il 19/11/1923 C.F. ZRRVCN23S19B415X	59	1168 (ex 395) 1169 (ex 395)	57 180	237,00
Calitri (AV)	CAPUTO Giuseppe nato a Calitri (AV) il 09.10.1923 - C.F. CPTGPP23R09B415P	48	733 (ex 578 ex 1)	275	357,50
Calitri (AV)	DE NICOLA Agnese; DE NICOLA Antonio; DE NICOLA Pasquale; DE VITO Rocco; DI NAPOLI Canio; DI NAPOLI Lucia; DI NAPOLI Michele; DI NAPOLI Rocco; RABASCA Grazia nata a Calitri (AV) il 11.11.1911 - C.F. RBSGRZ11S51B415Y	59	1371 (ex 1220 ex 13)	250	500,00
Calitri (AV)	MAFFUCCI Giuseppe	48	731 (ex 576 ex 146) 729 (ex 574 ex 145)	30 30	78,00
Calitri (AV)	MANCASSOLA Caterina nata il 24.11.1931; VALLARIO Antonietta nata a Calitri (AV) il 13.06.1939 - C.F. VLLNNT39H53B415Q; VALLARIO Franca nata in Svizzera (EE) il 15.06.1968 - C.F. VLLFNC68H55Z133P; VALLARIO Lorenzo nato a Calitri (AV) il 22.01.1933 - C.F. VLLLNZ33A22B415T; VALLARIO Lucia nata a Calitri (AV) il 13.10.1924 - C.F. VLLLCU24R53B415K ; VALLARIO Maria nata a Calitri (AV) il 27.06.1928 - C.F. VLLMRA28H67B415S; VALLARIO Pietro nato a Calitri (AV) il 04.02.1923 - C.F. VLLPTR23B04B415I; VALLARIO Roberto nato in Svizzera (EE) il 10.05.1964 - C.F. VLLRRT64E10Z133E	31	1117 (ex 845 ex 201)	600	1.320,00

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità da depositare
Calitri (AV)	MAFFUCCI Matteo nato a Forlimpopoli (FG) il 21/04/1983 – C.F. MFFMTT83D21D705P	59	1431 (ex 247) 1153 (ex 247)	65 120	185,00
Calitri (AV)	VALLARIO Maria	59	1180 (ex 507) 1439 (ex 507)	465 105	741,00
Calitri (AV)	MAFFUCCI Lucia nata a Calitri (AV) il 21/02/1964 – C.F. MFFLCU64B61B415R	59	1413 (ex 1089 ex 452)	160	480,00
Calitri (AV)	GERMANO Giovanni nato a Cairano (AV) il 15.09.1938 – C.F. GRMGNN38P15B367W; GERMANO Pasquale nato a Cairano (AV) il 09.01.1936 – C.F. GRMPQL36A09B367S; GERMANO Michele nato a Calitri (AV) il 05.02.1926 – C.F. GRMMHL26B05B415I; GERMANO Sabina nata a Calitri (AV) il 23.01.1928 – C.F. GRMSBN28A63B415C	59	1417 (ex 1120 ex 613)	1980	1.980,00
Calitri (AV)	DE NICOLA Irene nata a Roma il 02/06/1977 - C.F. DNCRNI77H42H501K; MAFFUCCI Vincenzo nato in Germania (EE) il 13.12.1972 – C.F. MFFVCN72T13Z112R	36	1242 (ex 667 ex 605 ex 159)	50	75,00
Calitri (AV)	DANIELE Assunta nata a Aquilonia (AV) il 15.08.1949 – C.F. DNLSNT49M55A347H; RUSSO Pasquale nato a Calitri (AV) il 17.08.1942 – C.F. RSSPQL42M17B415L	31	1127 (ex 857 ex 432)	25	55,00
Calitri (AV)	CESTONE Alfredo nato a Calitri (AV) il 13.07.1952 – C.F.: CSTLRD52L13B415G; CESTONE Giovanni nato a Calitri (AV) il 12.07.1944 - C.F.: CSTGNN44L12B415T; CESTONE Leonardo nato a Calitri (AV) il 25.04.1947 - C.F.: CSTLRD47D25B415R; CESTONE Maria Rosa nata a Calitri (AV) il 01.11.1945 - C.F.: CSTMRS45S41B415Z COMUNE DI CALITRI con sede in CALITRI (AV) - C.F.: 00218950640	36	1246 (ex 414 ex 159)	800	1.200,00
Calitri (AV)	CESTONE Alfredo nato a Calitri (AV) il 13.07.1952 - C.F.: CSTLRD52L13B415G; CESTONE Giovanni nato a Calitri (AV) il 12.07.1944 - C.F.: CSTGNN44L12B415T; CESTONE Leonardo nato a Calitri (AV) il 25.04.1947 - C.F.: CSTLRD47D25B415R; CESTONE Maria Rosa nata a Calitri (AV) il 01.11.1945 - C.F.: CSTMRS45S41B415Z	36	1248 (ex 415 ex 159)	540	810,00
Calitri (AV)	DE NICOLA Agnese; DE NICOLA Antonio; DE NICOLA Pasquale; DE VITO Rocco; DI NAPOLI Canio; DI NAPOLI Lucia; DI NAPOLI Michele; DI NAPOLI Rocco; RABASCA Grazia nata a Calitri (AV) il 11.11.1911 C.F.: RBSGRZ11S51B415Y	48	722 (ex 349) 720 (ex 348) 350 130 709 (ex 129)	150 120 24 160 115	833,50
Calitri (AV)	DE BLASI Assunta nata a Pisciotta (SA) il 25.04.1939 - C.F.: DBLSNT39D65G707V MAFFUCCI Giovanni nato a Calitri (AV) il 22.01.1942 C.F.: - MFFGNN42A22B415O	59	1049 (ex 284) 1407 (ex 285)	248 90	140,72

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità da depositare
Calitri (AV)	VAN TIEL Claudia nata Paesi Bassi (EE) il 30/12/1966 C.F.: VNTCLD66T70Z126B; VAN TIEL Sergio nato Paesi Bassi (EE) il 08/03/1964 C.F.: VNTSRG64C08Z126Y VAN TIEL Simona nata Pesi Bassi (EE) il 29/02/1968 C.F.: VNTSMN68B69Z126W	48	696 (ex 125)	730	1.606,00

Prog. 39/40/COM/6057 I lotto
Determina Commissariale prot.n.1901 del 05/06/2018

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità da depositare
Calitri (AV)	DELLA BADIA Rosamaria	67	369 (ex174)	780	1.014,00
Calitri (AV)	COPPOLA Chiara	64	979 (ex 627) 977 (ex 626) 955 (ex 503)	50 45 30	162,00

Prog. 39/40/6006
Determina Commissariale prot.n.1930 del 27/07/2018

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità da depositare
Calitri (AV)	DI CECCA Berardino nato a Calitri (AV) il 03/04/1922 c.f.: DCCBRD22D03B415T	64	189 204	660 355	1.587,76
Calitri (AV)	DEL VENTO Maria Luisa nata a Calitri (AV) il 03/09/1932 c.f.: DLVMLS32P43B415F	61	388	940	940,15
Calitri (AV)	GALGANO Agnese; GALGANO Angelomaria	61	1128 (ex 500) 1130 (ex 500) 337	830 450 180	819,26
Calitri (AV)	CESTONE Giovanna	61	1126 (ex 499) 1127 (ex 499)	320 557	4.195,08
Calitri (AV)	CERRETA Maria nata a Calitri (AV) il 01/11/1930 c.f.: CRRMRA30S41B415T	64	223	2520	1.322,25

Prog. 39/60/COM/6057 1° lotto
Determina Commissariale prot.n.1931 del 27/07/2018

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità da depositare
Calitri (AV)	ZAMPAGLIONE Lorenzo nato a Napoli (NA) il 29/09/1913 c.f.: ZMPLNZ13M29F839E	67	380 (ex38) 379 (ex38) 378 (ex38)	480 240 350	930,37
Calitri (AV)	MAFFUCCI Angelo Maria nato a Calitri (AV) il 10/12/1928 c.f.: MFFNLM28T10B415O; MAFFUCCI Antonio nato a Calitri (AV) il 16/03/1964 c.f.: MFFNTN64C16B415K MAFFUCCI Benito Gerardo nato a Pescopagano (PZ) il 01.04.1936 c.f.MFFBTG36D01G496M; MAFFUCCI Giacomo Michele nato a Calitri (AV) il 10.12.1923 c.f. MFFGMM23T10B415Q; MAFFUCCI Michele n.a Venezuela (EE) il 4.11.54 c.f. MFFMHL54S04Z614I	67	367 (ex 16)	250	288,06
Calitri (AV)	CESTONE Gaetano nato a Calitri il 01.01.1938 c.f.: CSTGTN38A01B415G; CESTONE Maria Francesca nata a Calitri (AV) il 21/09/1932 c.f.: CSTMFR32P61B415R; CESTONE Raffaele nato a Calitri il 10.01.1935 c.f.: CSTRFL35A10B415N; DI CARLO Angela - DI CARLO Concetta; DI CECCA Giuseppe nato a Calitri (AV) il 25.02.1939 c.f.: DCCGPP39B25B415P; GALGANO Angela nata a Calitri (AV) il 15.02.1915 c.f.: GLGNGL15B55B415X; GALGANO Vito nato a Calitri (AV) il 15/02/1915 c.f.: GLGVTI15B55B415B; GERMANO Italia nata a Calitri (AV) il 20/07/1953 c.f.: GRMTLI53L60B415C; GERMANO Maria nata a Calitri (AV) il 07/07/1952 c.f.: GRMMRA52L47B415E; GERMANO Michele nato a Calitri (AV) il 25/07/1946 c.f.: GRMMHL46L25B415S	64	968 (ex 510)	800	171,64
Calitri (AV)	VALLARIO Canio nato a Calitri (AV) il 18/05/1928 c.f.: VLLCNA28E18B415J	65	1103 (ex1072) 1078 (ex315) 316 1075 (ex303)	1050 593 170 4635	220,41
Calitri (AV)	DI CARLO Erberto nato a Calitri (AV) il 10/02/1940 c.f. DCRRT40B10B415S DI CARLO Michele nato a Calitri (AV) il 17/02/1948 c.f. DCRMHL48B17B415M (Ditta proprietaria effettiva) DI CECCA Lucia (Ditta intestataria catastale)	64	966 (ex 509) 970 (ex 512)	30 900	63,48

Prog. 39/60/COM/6063**Determina Commissariale prot.n.1932 del 27/07/2018**

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità da depositare
Calitri (AV)	GERMANO Italia nata a Calitri (AV) il 20/07/1953 c.f.: GRMTLI53L60B415C	59	1216 (ex 299)	60	91,80
Calitri (AV)	CODELLA Pasquale nato a Calitri (AV) il 16.10.1920 c.f.: CDLPQL20R16B415T	34	450 (ex 385 ex 88) 447 (ex 383 ex 87)	310 470	1.596,04
Calitri (AV)	ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il 10/11/1937 C.F. ZRRVCN37S10B415J	59	1224 (ex 454) 1499 (ex 454)	72 30	40,67

Prog. 39/60/COM/6064**Determina Commissariale prot.n.1933 del 27/07/2018**

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità da depositare
Calitri (AV)	DE NICOLA Agnese n a CALITRI (AV) il 11/11/1911 c.f. DNCGNS11S51B415H; DE NICOLA Angela nata a CALITRI (AV) il 19/11/1959 c.f. DNCNGL59S59B415S; DE NICOLA Gaetana Fulvia nata a CALITRI (AV) il 22/07/1966 c.f. DNCGNF66L62B415M; DE NICOLA Giuseppe nato a CALITRI (AV) il 25/08/1963 c.f. DNCGPP63M25B415U; DE NICOLA Pasquale; LOTRECCHIANO Maria nata a AQUILONIA (AV) il 29/03/1940 c.f. LTRMRA40C69A347Q; RABASCA Grazia nata a CALITRI (AV) il 11/11/1911 c.f. RBSGRZ11S51B415Y; DE NICOLA Angela nata a CALITRI (AV) il 30/11/1952 c.f. DNCNGL52S70B415T	59	101	40	4.000,00

Comune	Ditta intestataria catastale	Foglio	Particella	Superficie esproprio (mq)	Indennità da depositare
Calitri (AV)	DE NICOLA Agnese n. a Calitri (AV) il 11/11/1911 c.f. DNCGNS11S51B415H; DE NICOLA Antonio; DE NICOLA Pasquale; RABASCA Grazia nata a Calitri il 11.11.1911 c.f. RBSGRZ11S51B415Y	59	99	920	900,00
Calitri (AV)	DE NICOLA Agnese n. a Calitri (AV) il 11/11/1911 c.f. DNCGNS11S51B415H; DE NICOLA Antonio; DE NICOLA Pasquale; RABASCA Grazia nata a Calitri il 11.11.1911 c.f. RBSGRZ11S51B415Y	59	761 (ex 100)	700	700,00

Per i progetti sopra richiamati, in data 14/11/2018 con commissariale prot.32.761, veniva trasmessa via pec, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, richiesta di emissione codici al fine di permettere a questo Ufficio di poter effettuare i relativi versamenti e pertanto predisporre i successivi decreti definitivi di esproprio.

All'attualità 18/12/2018 nessuna risposta di riscontro è pervenuta dalla suddetta Ragioneria.

COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02

D.M. 21.12.2005 E D.M. 2.8.2017

ELENCO PROGETTI CON ATTIVITA' DA CONCLUDERE

	reggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	NOTE
1	39	40		6006	AV	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	N.I. Calitri	In corso completamento espropri
2	39	40		6007	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	N.I. Contursi	In corso contenzioso Di Menza Mario c/MISE
3	39	40		6012	AV	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	N.I. Nerico	In corso completamento espropri
4	39	40		6016	AV	CONSORZIO INCOMIR	N.I. S.Mango sul Calore	In corso completamento espropri
5	39	40		6053	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada Fondo Valle Sele 1° lotto	Collaudo dichiarato inidoneo con Sentenza Tribunale di Roma - Pagamento competenze professionali per collaudo - Contenzioso COINFRA c/MISE
6	39	40		6055	AV	CONSORZIO IN.FRAV.	Fondo Valle Sele 3° lotto	In corso contenzioso Comune di Caposele c/MISE
7	39	40		6068	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada Fondo Valle Sele-Oliveto Citra	In corso contenzioso COINFRA c/MISE
8	39	60		6069	PZ	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	Strada Rapone-Ofantina-Muro Lucano	In corso completamento espropri
9	39	40		6071	AV	CONSORZIO INCOMIR	Svincolo ferroviario S.Mango sul Calore	In corso completamento espropri
10	39	40		6075	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada FVS-Ospedale di Oliveto Citra	In corso restituzione saldo a debito del Concessionario
11	39	60		6077	02 PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Isca-Polla 2° lotto	In corso contenzioso Pizzarotti c/MISE -Pagamento saldo lavori sospeso per inadempienza contributiva Concessionario
12	39	40		6104	AV	CONSORZIO GI.IT	Impianto depurazione N.I.Conza	In corso verifica per eventuale trasferimento suoli al Consorzio ASI di Avellino

COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02

D.M. 21.12.2005 e D.M. 2.8.2017

ELENCO PROGETTI CON ATTIVITA' CONCLUSE (CHIUSURA PROGETTI E CONCESSIONI)

	reggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	PROVVEDIMENTI	
								CHIUSURA PROGETTO	CHIUSURA CONCESSIONE
1	39	60		6001	PZ	CONS. DI BALVANO	N.I.Balvano e Acquedotto	Decreto Commissariale n. 580 del 7.10.2009	Decreto Commissariale n. 542 del 16.6.2009
2	39	60		6002	PZ	IMPRESA MALTAURO	N.I.Baragiano e Depuratore	Decreto Commissariale n. 1457 del 30.11.2015	Decreto Commissariale n. 1449 del 9.11.2015
3	39	40		6003	SA	Consorzio Buccino S. Gregorio Magno	N.I. Buccino	Decreto Commissariale n. 1543 del 9.6.2016	Decreto Commissariale n. 1535 del 11.5.2016
4	39	40		6003	2 SA	Consorzio Buccino S. Gregorio Magno	Campo pozzi Buccino	Decreto Commissariale n. 1053 del 13.4.2012	Decreto Commissariale n. 1008 del 22.12.2011
5	39	40		6004	AV	CONSORZIO CO.IN.SUD	N.I. Calabritto	Decreto Commissariale n. 583 del 9.10.2009	Decreto Commissariale n. 547 del 30.6.2009
6	39	40		6005	AV	Consorzio INCOMIR	N.I. Calaggio	Decreto Commissariale n. 1461 del 15.12.2015	Decreto Commissariale n. 1454 del 18.11.2015
7	39	40		6008	AV	CONSORZIO GL.IT	N.I.Morra de Sanctis/Conza	Decreto Commissariale n. 638 del 16.2.2010	Decreto Commissariale n. 633 del 19.1.2010 (v.prog. 6011)
8	39	60		6009	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	N.I. Isca Pantanelle	Decreto Commissariale n.324 del 20.12.06	
9	39	40		6010	AV	CONSORZIO IN.FRAV.	N.I. Lioni Nusco S.Angelo	Decreto Commissariale n. 479 del 16.10.2008	Decreto Commissariale n.307 dell'1.12.2006
10	39	40		6011	AV	CONSORZIO GL.IT	N.I.Morra de Sanctis/Conza	Decreto Commissariale n. 639 del 16.2.2010	Decreto Commissariale n. 633 del 19.1.2010 (v.prog. 6008)

	reggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	PROVVEDIMENTI	
								CHIUSURA PROGETTO	CHIUSURA CONCESSIONE
11	39	40		6013	SA	CONSORZIO CO.IN.SUD	N.I. Oliveto Citra	Decreto Ministeriale n.38 del 7.4.2003	Decreto Commissariale n. 481 del 29.10.2008
12	39	40		6014	SA	CONSORZIO CO.IN.PA.	N.I. Palomonte	Decreto Ministeriale n. 20 del 24.2.2004	Decreto Commissariale n. 377 del 18.9.2007
13	39	40		6015	AV	CONSORZIO INFRASUD	N.I. Porrara	Decreto Commissariale n. 640 del 18.2.2010	Decreto Commissariale n. 630 dell'8.1.2010 sostituito da Decreto Commissariale n. 635 del 27.1.2010
14	39	60		6017	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	N.I. S.Nicola di Melfi+F.Z.	Decreto Commissariale n. 842 del 28.2.2011	Decreto Commissariale n. 817 del 7.2.2011
15	39	60		6018	PZ	CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO	N.I. Tito	Decreto Commissariale n. 1496 del 19.1.2016	Decreto Commissariale n. 1462 del 18.12.2015
16	39	60		6019	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	N.I. Valle Vitalba	Decreto Commissariale n.1332 del 26.1.2015	Decreto Commissariale n. 1326 del 22.12.2014
17	39	60		6020	PZ	CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO	N.I. Viggiano	Decreto Commissariale n. 1463 del 18.12.2015	Concessionario decaduto dalla Convenzione D.M. n. 233 del 30.11.1995
18	39	40		6021	AV	CONSORZIO GI.IT	N.I. Morra de Sanctis	Decreto Commissariale n. 657 del 28.4.2010	Decreto Commissariale n. 651 del 31.3.2010
19	39	60		6051	PZ	IMPRESA MALTAURO	Basentana-Baragiano	Decreto Commissariale n. 1078 del 4.7.2012	Decreto Commissariale n. 1001 del 22.12.2011
20	39	40		6052	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Contursi-Stazione FF.SS.	Decreto Commissariale n. 1172 del 18.6.2013	Decreto Commissariale n. 1157 del 28.3.2013
21	39	40		6054	SA	CONSORZIO CO.IN.SUD	Fondo Valle Sele 2° lotto	Decreto Commissariale n. 440 del 28.4.2008	
22	39	60		6056	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Isca-Tito/Brienza	Decreto Commissariale n. 839 del 25.2.2011	Decreto Commissariale n. 810 del 19.1.2011
23	39	60		6057	PZ	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	Ofantina-Muro Lucano	Decreto Commissariale n. 1047 del 21.3.2012	Revocata
24	39	40		6058	AV	Consortio INFRASUD	Bretella N.I. Lioni Porrara-S. Angelo	Decreto Commissariale n. 1087 del 3.9.2012	Decreto Commissariale n. 1500 del 26.2.2016
25	39	60		6059	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada N.I. Melfi-Superstrada Candela/PZ	Decreto Commissariale n. 677 del 13.7.2010	Decreto Commissariale n. 659 del 28.4.2010
26	39	60		6062	PZ	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	Strada Muro Lucano-Baragiano	Decreto Commissariale n. 1048 del 22.3.2012	Revocata
27	39	40		6063	AV	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	StradaCalliri-Ofantina	Decreto Commissariale n. 1412 del 27.7.2016	Revocata

	raggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	PROVVEDIMENTI	
								CHIUSURA PROGETTO	CHIUSURA CONCESSIONE
28	39	40		6064	AV	LC.LA COSTR.GENERALI SPA	Strada Calitri-Ofantina (Svincolo)	Decreto Commissariale n. 1051 del 3.4.2012	Revocata
29	39	40		6066	AV	CONSORZIO INCOMIR	Strada Ofantina-S.Mango	Decreto Commissariale n. 824 dell'11.2.2011	Decreto Commissariale n. 808 del 10.1.2011
30	39	60		6067	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Valle di Vitalba-Ofantina	Decreto Commissariale n. 896 del 19.7.2011	Decreto Commissariale n. 880 del 24.5.2011
31	39	60		6070	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Rapone-Ofantina-Valle di Vitalba	Decreto Commissariale n. 1349 del 20.2.2015	Decreto Commissariale n.1333 del 26.1.2015
32	39	60		6076	PZ	IMPRESA MALTAURO	Strada Balvano-Basentana-Baragiano-1°lotto	Decreto Commissariale n. 658 del 28.4.2010	Decreto Commissariale n. 652 del 31.3.2010
33	39	60		6076	02 PZ	IMPRESA MALTAURO	Strada Balvano-Basentana-Baragiano-2°lotto	Decreto Commissariale n.1385 del 4.5.2015	Decreto Commissariale n. 1353 del 13.3.2015
34	39	60		6077	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Isca-Polla 1° lotto	Decreto Commissariale n. 654 del 12.4.2010	Decreto Commissariale n. 648 del 22.3.2010
35	39	40		6080	SA	Consorzio Buccino S. Gregorio Magno	Svincolo ferroviario N.I. Buccino	Decreto Commissariale n. 1809 del 18.12.2017	Decreto Commissariale n. 1771 del 24.11.2017
36	39	40		6091	AV	SNAM PROGETTI	Acquedotto principale Alta Irpinia	Decreto Commissariale n. 1075 del 21.6.2012	Decreto Commissariale n. 661 del 10.5.2010
37	39	40		6094	SA	CONSORZIO CO.IN.SUD	Acquedotto A.I. di Buccino	Decreto Commissariale n. 500 del 14.1.2009	Decreto Commissariale n. 491 dell'1.12.2008
38	39	40		6095	AV	SNAM PROGETTI	Acquedotto Irpinia Vallata/Monteleone	Decreto Commissariale n. 665 del 31.5.2010	Decreto Commissariale n. 655 del 28.4.2010
39	39	40		6096	SA	SNAM PROGETTI	Condotta reflui Palomonte-Buccino	Decreto Ministeriale n. 36 del 7.4.2003	
40	39	40		6097	SA	SNAM PROGETTI	Condotta reflui Calabritto-Battipaglia	Decreto Ministeriale n. 40 del 7.4.2003	
41	39	60		6101	PZ	CONS. DI BALVANO	Impianto depurazione N.I. Balvano	Decreto Commissariale n. 581 del 7.10.2009	Decreto Commissariale n. 552 del 10.7.2009
42	39	40		6102	AV	CONSORZIO CO.IN.SUD	Impianto depurazione N.I. Calabritto	Decreto Commissariale n. 553 del 10.7.2009	Decreto Commissariale n. 541 del 15.6.2009
43	39	40		6103	SA	CONSORZIO CO.INFRA	Impianto depurazione N.I. Contursi	Decreto Ministeriale n. 39 del 7.4.2003	Delibera ex Agensud n. 2350 del 17.3.1993
44	39	40		6105	AV	SNAM PROGETTI	Impianto depurazione N.I. Lioni	Decreto Commissariale n. 840 del 25.2.2011	Decreto Commissariale n. 809 del 10.1.2011

	raggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	PROVVEDIMENTI	
								CHIUSURA PROGETTO	CHIUSURA CONCESSIONE
45	39	40		6106	AV	CONSORZIO GLIT	Impianto depurazione N.L.Morra	Decreto Commissariale n. 1128 del 31.12.2012	Decreto Commissariale n. 1117 del 14.11.2012
46	39	40		6107	SA	CONSORZIO CO.IN.PA.	Impianto depurazione N.L.Palomonte	Decreto Ministeriale n. 31 del 20.3.2003	Decreto Commissariale n. 378 del 18.9.2007
47	39	40		6108	AV	Consorzio INFRASUD	Impianto depurazione N.L.Porrara	Decreto Commissariale n. 637 del 16.2.2010	Decreto Commissariale n. 631 dell'8.1.2010
48	39	60		6109	PZ	CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO	Impianto depurazione N.L.Viggiano	Decreto Commissariale n. 1458 del 7.12.2015	Concessionario decaduto dalla Convenzione D.M. n. 233 del 30.11.1995
49	39	99		6150		ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI		Decreto Commissariale n. 374 del 18.9.2007	Decreto Commissariale n. 308 del 1.12.2006
50	39	99		6151		ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI		Decreto Commissariale n. 375 del 18.9.2007	Decreto Commissariale n. 309 del 1.12.2006
51	39	60		6202	PZ	CONSORZIO A.S.I. POTENZA	Invaso Pignola	Decreto Commissariale n. 679 del 13.7.2010	///////
52	39	40		6203	SA	CONSORZIO A.S.I. SALERNO	Condotta forzata Battipaglia	Decreto Ministeriale n. 138 del 18.12.2000 Decreto Commissariale n. 361 del 9.5.2007	Decreto Ministeriale n. 26 del 15.2.2000
53	39	40		6205	SA	CONSORZIO A.S.I. SALERNO	Adeguamento depuratore di Battipaglia	Decreto Commissariale n.340 del 26.3.2007	
54	39	40		6207	SA	CONSORZIO DESTRA SELE	Collett.reflui acque alte Sele/Tuscano	Decreto Ministeriale n. 92 del 16.5.1995 Decreto Commissariale n. 341 del 26.3.2007	Decreto Commissariale n. 341 del 26.3.2007
55	39	40		6208	SA	ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE	By-pass Ponte Canale	Decreto Commissariale n. 664 del 26.5.2010	///////
56	39	60		6209	PZ	CONSORZIO A.S.I. POTENZA	Lavori idrici Melfi	Decreto Commissariale n. 680 del 13.7.2010	Decreto Commissariale n.817 del 7.2.2011 (Lavori eseguiti nell'ambito A.L. di Melfi - Prog. 6017)
