


## SCHEMI IDRICI

**PUG - Completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in agro di Lavello**

### SCHEDA N. 164

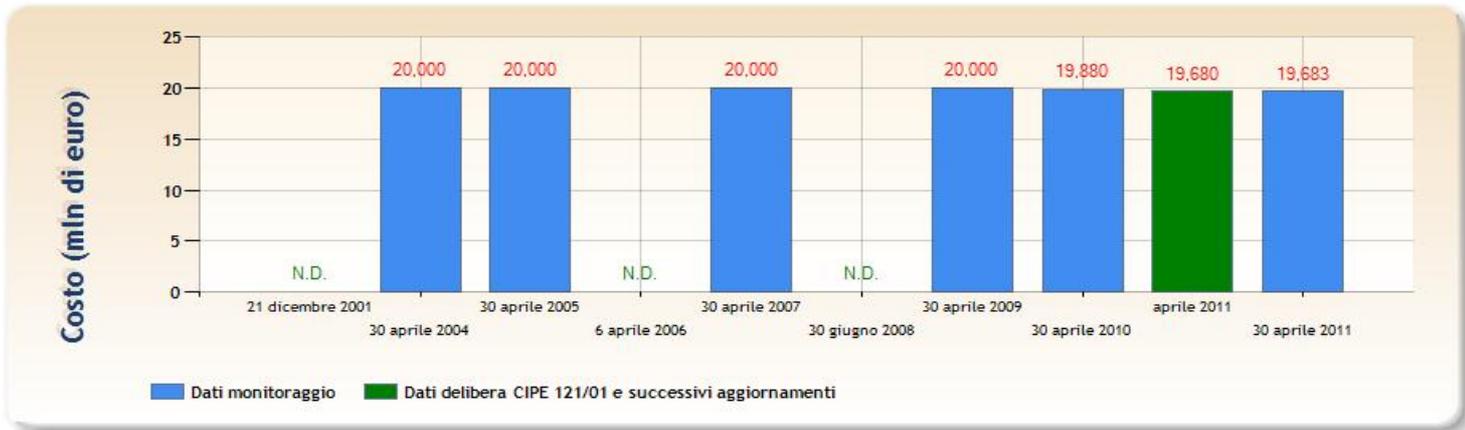

### LOCALIZZAZIONE



**CUP:**

**TIPOLOGIA OPERA:**

**SOGGETTO TITOLARE:**

Rete idrica

Consorzio di Bonifica del Vulture e Alto Bradano

**STATO DI ATTUAZIONE**

Lavori in corso

**DELIBERE CIPE**

140/2002

**ULTIMAZIONE LAVORI**

2011

---

## DESCRIZIONE

L'intervento riguarda l'ammodernamento del sistema irriguo gestito dal Consorzio di Bonifica e permette di recuperare le risorse dell'Ofanto per destinarle all'esigenza potabile dell'ATO Puglia.

---

## DATI STORICI

### 1999

L'opera è inclusa nell'Accordo di Programma sottoscritto il 5 agosto tra le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei Lavori Pubblici. Nello stesso accordo vengono individuate le risorse idriche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni potabili, irrigui ed industriali delle due Regioni e le infrastrutture da realizzare per conseguire tale risultato.

### 2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare".

### 2002

Le OPCM nn. 3187 e 3188 del 22 marzo stabiliscono che gli interventi inseriti negli Accordi di Programma e nelle Intese Istituzionali Stato-Regioni, nonché gli interventi inclusi nella programmazione regionale o statale in materia idrica devono essere compresi in un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica redatto dal commissario delegato - Presidente della Regione Basilicata e dal commissario delegato - Presidente della Regione Puglia.

La Regione Puglia, con nota del 28 ottobre, individua l'intervento come prioritario.

In data 11 dicembre viene perfezionato l'Accordo di Programma del 1999 con un Accordo attuativo per il "Completamento del riordino e dell'ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio destra Ofanto e destra Rendina in agro di Lavello", individuando quale soggetto aggiudicatore il Consorzio di bonifica del Vulture e Alto Bradano.

Il Consorzio, con nota al MIT del 16 dicembre, dichiara che il progetto è disponibile a livello esecutivo e, l'iter approvativi, fa presente che il progetto dispone di SIA e che sono state rilasciate le autorizzazioni necessarie. Il MIT trasmette la relazione istruttoria dell'opera, proponendo un finanziamento di 20 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002.

Il CIPE, con delibera n. 140, assegna all'opera l'importo complessivo di 20 Meuro a valere sui fondi di cui alla legge n. 166/2002, articolato in 10 Meuro per l'anno 2003 e 10 Meuro per l'anno 2004.

### 2004

Il Consorzio di Bonifica Vulture-Alto Bradano pubblica il bando di gara per un importo di 11,7 Meuro, soggetto a ribasso.

### 2005

L'opera viene aggiudicata all'Impresa Opere Pubbliche Spa per 7,9 Meuro. Il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è 1.080 gg. dalla consegna.

### 2006

L'intervento è compreso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

### 2009

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

Il 6 novembre viene sottoscritto Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Puglia ove, però, non si fa riferimento agli schemi idrici.

### 2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Completamento impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto dx Rendina in agro di Lavello" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche –

Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

## 2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Completamento impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto dx Rendina in agro di Lavello" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 58%).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta un avanzamento lavori del 86,78 %. L'ultimazione è prevista per il 15 settembre 2011.

---

## COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	20,000 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 140/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2005	20,000 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 140/2002
Costo al 6 aprile 2006	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	20,000 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 140/2002
Costo al 30 giugno 2008	N.D. <b>Fonte:</b> DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	20,000 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	19,880 <b>Fonte:</b> DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	19,680 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	19,683 <b>Fonte:</b> Consorzio di bonifica del Vulture e Alto Bradano

---

## QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

### Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	19,880 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014
<b>Disponibilità al 30 aprile 2011:</b>	<b>19,877</b>
Fondi Legge Obiettivo	19,877 <b>Fonte:</b> Consorzio di bonifica del Vulture e Alto Bradano
<b>Fondi residui:</b>	<b>-0,194</b>

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

<b>Livello di progettazione raggiunto:</b>	Progettazione esecutiva
<b>Conferenza di servizi:</b>	Conclusa
<b>Note:</b>	1) Si disponeva già di progetto, esecutivo per gli standard richiesti nel 1998. 2) L'importo lavori riportato comprende gli oneri per la sicurezza. 3) Non è stato necessario tenere una conferenza dei servizi; la si è comunque indicata come conclusa

## Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	11.707.528,86
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	319.662,03
Data inizio:	15/01/2002
Data fine:	22/05/2002

## AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio di Bonifica del Vulture e Alto Bradano
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	128 giorni
Lavori:	1080 giorni
Data bando:	08/04/2004
CIG/CUI:	24911165F3
Data aggiudicazione:	29/03/2005
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Opere Pubbliche S.p.A. Via Guidubaldo del Monte, 13 Roma
Codice fiscale aggiudicatario:	00600890925
Data contratto:	26/04/2005

### Quadro economico:

Importo a base gara:	11.421.055,11
Importo oneri per la sicurezza:	286.473,75
Importo complessivo a base di gara:	11.707.528,86
Importo aggiudicazione:	7.910.446,79
Somme a disposizione:	7.975.269,81
Totale:	15.885.716,60
% Ribasso di aggiudicazione:	33,25
% Rialzo di aggiudicazione:	

### Note:

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	06/06/2005
Data presunta fine lavori:	15/09/2011
Stato avanzamento importo:	6.943.056,73
Stato avanzamento percentuale:	86,78
Data effettiva inizio lavori:	27/02/2006
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	15/09/2011
Tempi realizzazione:	In ritardo - Iniziale indisponibilità delle aree. Successivamente rapporto estremamente conflittuale con l' impresa.
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	

**Note:** Commissione di collaudo in corso d' opera. Collaudo tecnico-amministrativo previsto entro 180 gg. dalla ultimazione; per lo statico nulla è previsto nel C.S.A.

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:** 8  
**Importo totale riserve definite:** 5.752.852,18  
**Totale riserve da definire:** 7  
**Note:** Con nota a parte, a mezzo mail, sarà meglio chiarita la situazione "riserve"

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:** 12  
**Totale giorni sospensione:** 268  
**Note:** Molte sospensioni hanno durata di 5 - 10 gg.

#### **Varianti:**

**Numero totale:** 2  
**Giorni proroga totali:** 0  
**Motivi:** Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006  
**Altri motivi:** Motivi di cui all' art. 132 c. 3 del D. Lgs. n. 163/2006, che però non è chiaro come inserire nel pannello.  
**Importo:** 7.711.904,96  
**Importo oneri sicurezza:** 288.798,03  
**Somme a disposizione:** 11.682.094,93  
**Totale:** 19.682.797,92  
**Note:** Nelle somme a disposizione è stata fatta confluire la voce "economie", rideterminata in € 3.394.582,63 a seguito accordo ai sensi art. 240 del 163/2006 e riconoscimento aumento dei costi ai sensi art. 133 del medesimo decreto.

---

## **NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Legge n. 36/1994

del 5 Gennaio 1994

Accordo di Programma Regioni Puglia e Basilicata e Ministero dei Lavori Pubblici del 5 Agosto 1999

Accordo attuativo Regioni Puglia e Basilicata e Ministero dei lavori pubblici del 11 Dicembre 2002

Delibera CIPE 140/2002

del 19 Dicembre 2002

Bando di gara Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano del 1 Aprile 2004

Avviso di aggiudicazione Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano del 27 Aprile 2005

Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Puglia del 6 Novembre 2009
