
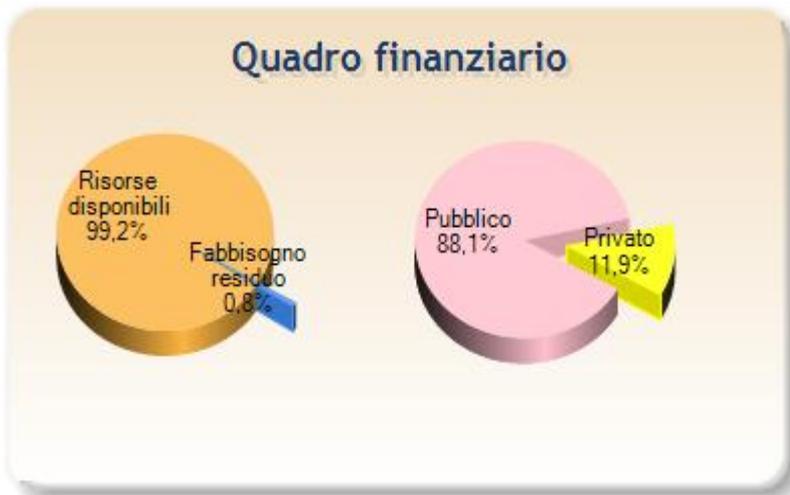


# SCHEMI IDRICI

## SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona

### SCHEDA N. 168

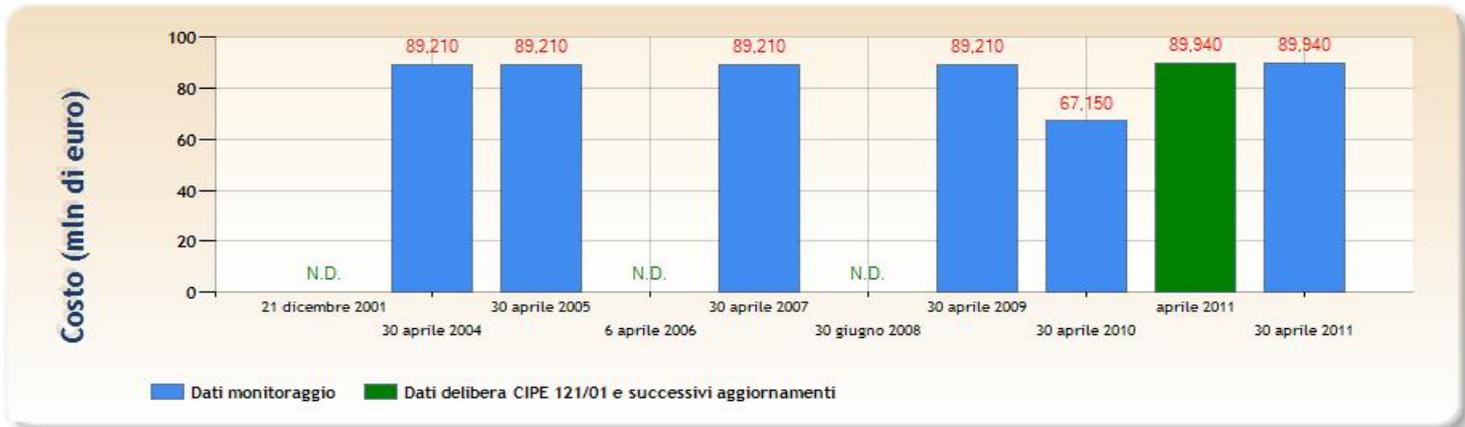

#### LOCALIZZAZIONE



#### CUP:

J17H02000080004

#### TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

#### SOGGETTO TITOLARE:

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana

#### STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

#### DELIBERE CIPE

136/2002  
52/2007  
75/2010

#### ULTIMAZIONE LAVORI

2011

---

## DESCRIZIONE

L'acquedotto "Dissalata Gela-Aragona", di Km 90, già ricostruito negli anni 70, consente il trasferimento di risorse idriche dall'impianto di dissalazione gestito dall'Agip nel comune di Gela (CI) al comprensorio di Agrigento ed alla stessa città di Agrigento, beneficiando, nel contempo, 5 comuni (Gela, Niscemi, Licata, Palma di Montechiaro, Agrigento, Aragona) per un bacino di utenza di 205.000 abitanti. Una volta completato il serbatoio Blufi sul fiume Imera meridionale, l'acquedotto potrà convogliare sullo stesso percorso le risorse idriche provenienti anche da tale serbatoio.

L'intervento consiste in opere di adduzione, adeguamento di alcuni serbatoi e stazioni di sollevamento esistenti, realizzazione di due nuovi serbatoi di linea aventi funzione di compenso e di disconnessione, collegamento con i serbatoi comunali e con l'acquedotto Favara di Burgio, al fine di rendere possibile l'interscambio di portate fra i due sistemi.

---

## DATI STORICI

### 2000

Con OPCM n. 3052 l'intervento per l'acquedotto Gela-Aragona viene dichiarato prioritario ed urgente per il superamento dello stato di emergenza idrica ed inserito nel programma straordinario.

### 2001

In data 5 ottobre viene firmato l'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione siciliana, nel quale l'acquedotto Gela Aragona è compreso tra gli interventi prioritari con un fabbisogno finanziario stimato di 35,6 Meuro.

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare".

### 2002

Il progetto definitivo viene trasmesso all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica in data 14 settembre. Il Commissario delegato convoca la CdS per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e i nulla-osta, dichiarando conclusi i lavori in data 16 dicembre.

Lo stesso giorno, la Commissione regionale dei lavori pubblici approva il progetto definitivo.

Il 18 dicembre il MIT trasmette la relazione istruttoria sull' "Acquedotto Gela-Aragona" proponendo un finanziamento di 53,6 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002.

Il CIPE, con delibera n. 136, prende atto che esiste il progetto definitivo con le richieste approvazioni e che è in preparazione il progetto esecutivo. Il nuovo costo indicato dal progetto definitivo è di 89,2 Meuro, dei quali 35,6 già disponibili nell'APQ Risorse idriche. Il CIPE assegna quindi all'opera un contributo di 53,6 Meuro, a valere sulla legge n. 166/2002, articolati in 27 Meuro per l'anno 2003 e 26,6 per il 2004.

### 2003

L'OPCM n. 3299 dispone che Il Presidente della regione Siciliana, in qualità di Commissario delegato, provveda alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di alcuni interventi, tra cui l'acquedotto Gela Aragona. Il Commissario delegato può inoltre affidare, in deroga alla disciplina ordinaria, la progettazione delle opere per il superamento dell'emergenza.

### 2004

La Società Siciliacque Spa (Società mista che sostituisce l'Ente Acquedotti Siciliani) bandisce la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'Acquedotto Gela-Aragona, per complessivi 69,5 Meuro. La scadenza è fissata al 29 novembre.

### 2006

Il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio attribuisce al Commissario delegato le competenze relative all'acquedotto.

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

L'OPCM n. 3533 delega il Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Commissario straordinario, all'attuazione e al completamento delle iniziative programmate, entro il 31 dicembre 2006. Dopo tale termine il Commissario trasferirà beni e attrezzature alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Il 31 dicembre, a seguito della scadenza dell'ordinanza n. 3533, le competenze attribuite al Commissario delegato vengono trasferite, in regime ordinario, all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana.

## **2007**

L'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, con nota del 20 aprile, chiede di essere individuata come soggetto aggiudicatore dell'opera.

Il 26 giugno Siciliacque aggiudica l'opera all'Ati Tecnis Spa, Si.Gen.Co. Spa per un importo totale dell'appalto di 47,45 Meuro.

Il MIT, con nota del 27 giugno, trasmette al CIPE la proposta di variazione del soggetto aggiudicatore esprimendosi favorevolmente sull'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

Il CIPE, con delibera n. 52, individua il nuovo soggetto aggiudicatore nell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana. L'opera dovrà essere ultimata ed essere posta in esercizio entro la fine del 2009.

## **2009**

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

## **2010**

Il CIPE, con delibera n. 75, prende atto che i lavori, il cui termine era stato fissato al 31 dicembre 2009, non sono stati ultimati e che dal 1 gennaio 2010 è stata soppressa l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Le funzioni e compiti dell'Agenzia sono stati trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, che viene quindi individuato quale nuovo soggetto aggiudicatore per l'opera.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Acquedotto Gela - Aragona" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

## **2011**

Nell'Allegato Infrastrutture alla DEF 2012-2014 l'opera "Acquedotto Gela - Aragona" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta un avanzamento dei lavori dell'84%. L'ultimazione è prevista per luglio 2011.

---

## **COSTO PRESUNTO (milioni di euro)**

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	89,210 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 136/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2005	89,210 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 136/2002
Costo al 6 aprile 2006	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	89,210 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 136/2002
Costo al 30 giugno 2008	N.D. <b>Fonte:</b> DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	89,210 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 136/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2010	67,150 <b>Fonte:</b> DPEF 2010-2013

Costo ad aprile 2011 89,940 **Fonte:** DEF 2012-2014  
Previsione di costo al 30 aprile 2011 89,940 **Fonte:** DEF 2012-2014

---

## QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

### Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001 N.D. **Fonte:** Delibera CIPE 121/2001  
Risorse disponibili ad aprile 2011 89,200 **Fonte:** DEF 2012-2014

---

<b>Disponibilità al 30 aprile 2011:</b>	<b>89,210</b>
Fondi Pubblici	25,000 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 136/2002
Fondi Legge Obiettivo	53,570 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 136/2002
Fondi Privati	10,640 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 136/2002

---

**Fabbisogno residuo:** **0,730**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** l'importo della prestazione è definito applicando alle Tariffe Professionali vigenti, le percentuali di ribasso offerte;

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Sì  
**Importo lavori:** 69.514.243,65  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** A.T.I studio Altieri S.p.A. (capogruppo); Technital S.p.A.; Omniservice Engineering S.r.l.; Ingegneria e Servizi S.r.l.; Ing. Manno Zagarella Diego  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 03100790249  
**Data inizio:** 22/08/2002  
**Data fine:** 11/04/2003

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia-Presidente della Regione siciliana, ex ordinanze ministeriali n. 3189/02 e n. 3224/02  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Prezzo più basso  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 24 mesi  
**Data bando:** 22/10/2004  
**CIG/CUI:** 24082842D3  
**Data aggiudicazione:** 26/06/2007

**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** TECNIS S.p.A. (capogruppo) - SI.GEN.CO. (cooptata)  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 02766640870  
**Data contratto:** 20/09/2007

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 67.214.000,00  
**Importo oneri per la sicurezza:** 2.300.000,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 69.514.000,00  
**Importo aggiudicazione:** 47.454.365,20  
**Somme a disposizione:** 19.691.000,00  
**Totale:** 67.145.365,20  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 32,82  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** L'ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia ha individuato (nel 2004) in SICILIACQUE S.p.A. il soggetto attuatore dell'intervento demandando alla stessa anche l'espletamento delle procedure di affidamento.  
Quadri finanziario: delibera CIPE 136/2002 € 53570000+ delibera CIPE 84/00 € 24944868;

**ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** In corso  
**Data presunta inizio lavori:** 15/10/2007  
**Data presunta fine lavori:** 01/07/2011  
**Stato avanzamento importo:** 39.969.693,53  
**Stato avanzamento percentuale:** 84,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 15/10/2007  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:**  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**

**Note:** in corso di nomina da parte della Regione Siciliana

**Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

**Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

**Varianti:**

**Numero totale:**  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:**

**Importo oneri sicurezza:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**Note:**

---

## **NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 3052 del 31 Marzo 2000

Accordo di Programma Quadro Stato-Regione siciliana del 5 Ottobre 2001

Ordinanze ministeriali n.3189/02 e n.3224/02

del 2002

Delibera CIPE 136/2002

del 19 Dicembre 2002

Ordinanza n.3299 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Luglio 2003

Bando di gara Siciliacque Spa del Ottobre 2004

Avviso di aggiudicazione Siciliacque Spa del Luglio 2007

Delibera CIPE 52/2007 del 20 Luglio 2007

Bando Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque del 11 Luglio 2008

Delibera CIPE 75/2010 del 22 Luglio 2010
