



SISTEMA VALICHI
Traforo del Frejus
Galleria di sicurezza (parte italiana)

SCHEDA N. 1

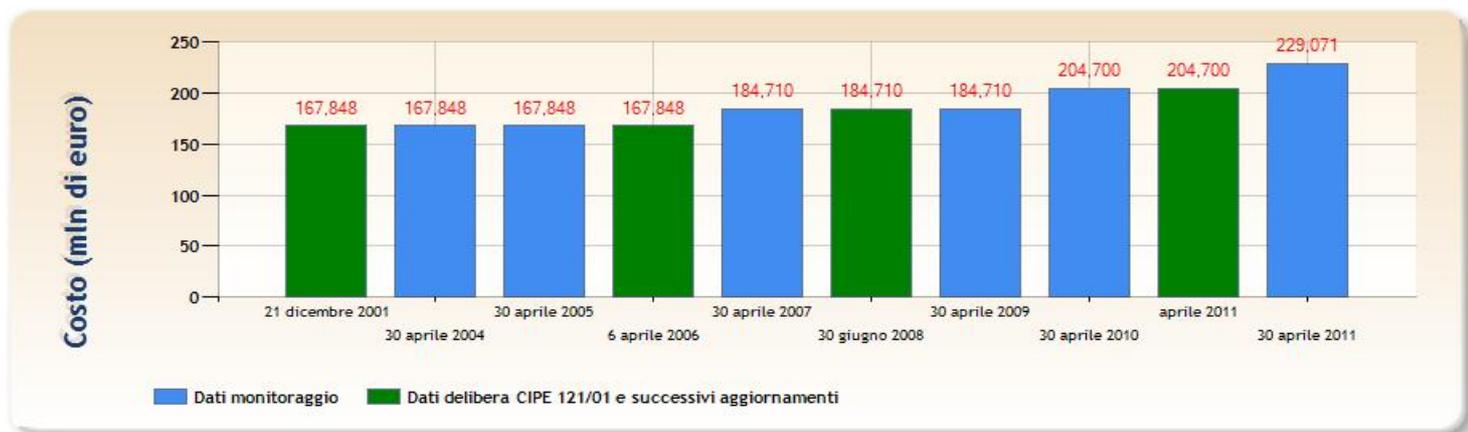

LOCALIZZAZIONE

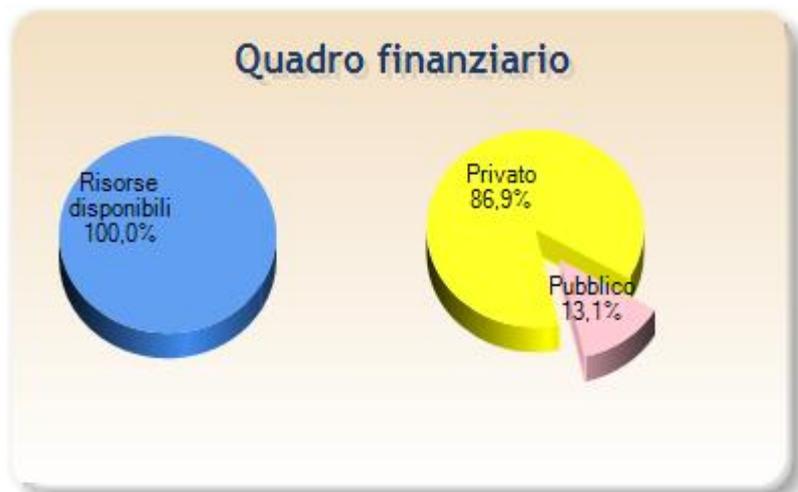

CUP:

H31B01000250008

TIPOLOGIA OPERA:

Rete stradale

SOGGETTO TITOLARE:

SITAF Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Opere con esecutore individuato

DELIBERE CIPE

43/2009

ULTIMAZIONE LAVORI

2016

DESCRIZIONE

Il progetto prevede la realizzazione di una galleria di sicurezza in affiancamento all'attuale galleria esistente: essa avrà una lunghezza di 12,87 chilometri, disterà circa 50 metri dall'esistente galleria ed avrà un diametro interno di 8 metri. Fra le opere funzionali della nuova galleria è prevista anche la costruzione di alcuni manufatti in corrispondenza del piazzale esistente.

DATI STORICI

2001

La delibera CIPE n. 121 include la voce "Traforo di sicurezza del Frejus" con un costo di 167,8 Meuro. nel "Sistema Valichi".

2002

Il progetto preliminare ottiene il parere favorevole dal Comitato di Sicurezza italo-francese e dalla Commissione intergovernativa.

2003

Il Cda Anas approva il progetto preliminare.

L'opera è inserita nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Piemonte dell'11 aprile.

Il 22 aprile viene presentata domanda di valutazione ambientale sul progetto preliminare.

Il 28 luglio la Regione approva il progetto preliminare, che prevede un diametro interno della larghezza di 4 metri.

2006

Il Ministro italiano e quello francese chiedono alla Commissione intergovernativa per il tunnel transfrontaliero del Frejus (CIG) di individuare "un diametro adatto della galleria di sicurezza che dovrà permettere in ogni evenienza la circolazione dei veicoli di soccorso in tutta sicurezza e agio".

La società SITAF Spa trasmette a tutte le amministrazioni ed enti interessati il progetto definitivo dell'opera, corredato dal SIA e dal programma di risoluzione delle interferenze, rivisto in base alle indicazioni della Commissione intergovernativa e del Comitato di sicurezza italo-francese.

Il progetto definitivo viene approvato dalla CIG-Frejus l'11 dicembre.

2007

Il 14 giugno il MIT indice la CdS i cui lavori si concludono il 29 agosto.

Il Ministero per i beni culturali si pronuncia positivamente, con prescrizioni, sul progetto.

Il Comando Logistico dell'Esercito esprime parere favorevole alla realizzazione dell'infrastruttura.

La Regione Piemonte esprime parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.

2008

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici trasmette al CIPE il voto reso dalle Sezioni riunite nella seduta del 17 gennaio.

Il Ministero dell'ambiente trasmette al MIT il parere favorevole con prescrizioni della Commissione VIA sul progetto definitivo.

2009

L'opera è compresa nel 1° Atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Piemonte, sottoscritto il 23 gennaio. Il costo complessivo previsto è di 369 Meuro di cui la parte italiana, a carico del concessionario, è pari a 184 Meuro.

Nell'ambito del vertice italo-francese del 24 febbraio, vengono sottoscritti alcuni accordi riguardanti anche il traforo di sicurezza.

Il MEF segnala che la copertura finanziaria dell'intervento dovrà essere assicurata attraverso l'utilizzo della leva tariffaria anche oltre il quinquennio considerato nel piano economico-finanziario.

Il CIPE, con delibera n.43, approva il progetto definitivo, per un costo di 204,7 Meuro e assegna 30 Meuro a valere sui 7.356 Meuro destinati con delibera n. 112/2008 a favore del Fondo infrastrutture. Tale contributo sarà erogato

dall'ANAS a stato di avanzamento dei lavori, con contributi annuali medi per 5 Meuro dal 2010 al 2015, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS. Il Piano finanziario si articola su 43 anni, di cui otto di costruzione e prevede, per cinque anni, un incremento tariffario del 3,5 per cento superiore al tasso di inflazione.

Il 22 dicembre viene siglato lo schema di convenzione unica tra ANAS e SITAF Spa, che sostituisce la convenzione stipulata in data 28 gennaio 2003.

2010

Il 15 febbraio SITAF Spa invia alla G.U. della UE il bando di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dello scavo della galleria di sicurezza dal km. 12,875 (imbocco in naturale lato Italia) al km. 6,495 (termine camerone di smontaggio TBM), per complessivi mt. 6 380, del tunnel del Frejus.

Il CIPE, con delibera n.22, prende atto dei contenuti dello schema di "convenzione unica" siglata tra ANAS e SITAF Spa.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Traforo di sicurezza del Frejus (parte italiana)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013 "; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Il 26 ottobre SITAF Spa aggiudica l'appalto integrato all'ATI composto da Itinera Spa, Razel Sas e Mattioda Pierino & Figli Spa.

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Traforo di sicurezza del Frejus (parte italiana)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013 " ;"5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta completata la progettazione definitiva ed aggiudicati, mediante appalto integrato, i lavori relativi al lotto "opere di genio civile della galleria". Restano da affidare i lotti relativi alle "opere impiantistiche galleria" e "opere fabbricato e sistemazione piazzale T4".

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	167,848 Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	167,848 Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2005	167,848 Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Costo al 6 aprile 2006	167,848 Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	184,710 Fonte: Rapporto MI, Infrastrutture Prioritarie
Costo al 30 giugno 2008	184,710 Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	184,710 Fonte: 1° Atto aggiuntivo IGQ Governo e Regione Piemonte
Previsione di costo al 30 aprile 2010	204,700 Fonte: Delibera CIPE 43/2009
Costo ad aprile 2011	204,700 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	229,071 Fonte: SITAF Spa

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	204,700 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	229,071
Fondo Infrastrutture	30,000 Fonte: Delibera CIPE 43/2009
SITAF Spa	199,071 Fonte: SITAF Spa

Fabbisogno residuo: 0,000

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E' DA INTENDERSI 50% LATO ITALIA
 E 50% LATO FRANCIA
 - IMPORTO DI PROGETTO LATO ITALIA

Progettazione definitiva

CIPE: Si
Importo lavori: 184.708.315,50
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 1.444.000,00
Nome aggiudicatario: LOMBARDI S.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 0041917446030
Data inizio: 23/08/2004
Data fine: 24/11/2006

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Definitivo

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

SI COMUNICA CHE LA SITAF SPA IPOTIZZA DI PROCEDERE A
REALIZZARE 3 LOTTI:
LOTTO OPERE GENIO CIVILE GALLERIA
LOTTO OPERE IMPIANTISTICHE GALLERIA
LOTTO OPERE FABBRICATO E SISTEMAZIONE PIAZZALE T4

SI PRECISA CHE I DATI INSERITI SONO RIFERITI ALLA GARA "LOTTO
OPERE GENIO CIVILE GALLERIA" MENTRE NEL QUADRO
FINANZIARIO E' RIPORTATO L'INTERO IMPORTO DELL'OPERA
"GALLERIA DI SICUREZZA T4"

ESECUZIONE LAVORI:**Stato avanzamento lavori:****Data presunta inizio lavori:****Data presunta fine lavori:****Stato avanzamento importo:****Stato avanzamento percentuale:****Data effettiva inizio lavori:****Data effettiva fine lavori:****Data presunta fine lavori varianti:****Tempi realizzazione:****Data collaudo statico:****Data collaudo tecnico-
amministrativo:****Note:****Contenzioso:****Totale riserve definite:****Importo totale riserve definite:****Totale riserve da definire:****Note:****Sospensione lavori:****Numero totale:****Totale giorni sospensione:****Note:****Varianti:****Numero totale:****Giorni proroga totali:****Motivi:****Altri motivi:****Importo:****Importo oneri sicurezza:****Somme a disposizione:****Totale:** 0,00**Note:**

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

IGQ tra il Governo e la Regione Piemonte del 11 Aprile 2003

Delibera di Giunta Regione Piemonte n. 62-10120 del 28 Luglio 2003

Decreto legislativo n. 264 del 5 Ottobre 2006
Delibera di Giunta Regione Piemonte n. 2 – 7520 del 20 Novembre 2007
Decreto legge n. 112 (art. 6-quinquies) del 25 Giugno 2008
Decreto legge n. 185 (art. 18) del 29 Novembre 2008
1° Atto aggiuntivo IGQ Governo e Regione Piemonte del 23 Gennaio 2009
Delibera CIPE 43/2009 del 26 Giugno 2009
Bando di gara SITAF Spa del 15 Febbraio 2010
Delibera CIPE 22/2010 del 13 Maggio 2010
Avviso aggiudicazione SITAF Spa del 14 Ottobre 2010

Opere genio civile galleria

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione definitiva
CIPE: Si
Importo lavori: 152.171.207,76
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 1.444.000,00
Nome aggiudicatario: LOMBARDI S.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 0041917446030
Data inizio: 23/08/2004
Data fine: 24/11/2006

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: SITAF Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura ristretta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 90 giorni
Lavori: 1350 giorni
Data bando: 15/02/2010
CIG/CUI: 044266852F
Data aggiudicazione: 26/10/2010
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ITINERA SPA - RAZEL SAS - MATTIODA PIERINO & FIGLI SPA
Codice fiscale aggiudicatario: 01668980061
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:	110.414.109,72
Importo oneri per la sicurezza:	5.261.929,20
Importo complessivo a base di gara:	115.676.038,92
Importo aggiudicazione:	94.600.973,51
Somme a disposizione:	33.653.461,52
Totale:	128.254.435,03
% Ribasso di aggiudicazione:	21,12
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
 Data presunta inizio lavori:
 Data presunta fine lavori:
 Stato avanzamento importo:
 Stato avanzamento percentuale:
 Data effettiva inizio lavori:
 Data effettiva fine lavori:
 Data presunta fine lavori varianti:
 Tempi realizzazione:
 Data collaudo statico:
 Data collaudo tecnico-amministrativo:
 Note:

IL CONTENZIOSO IN CORSO SI RIFERISCE AL RICORSO
PRESENTATO AVANTI AL TAR PIEMONTE DALLA II IN GRADUATORIA

Contenzioso:

Totale riserve definite:
 Importo totale riserve definite:
 Totale riserve da definire:
 Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
 Totale giorni sospensione:
 Note:

Varianti:

Numero totale:
 Giorni proroga totali:
 Motivi:
 Altri motivi:
 Importo:
 Importo oneri sicurezza:
 Somme a disposizione:
 Totale: 0,00
 Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Opere impiantistiche galleria

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: L'IMPORTO DEI LAVORI INDICATO NEL PROGETTO E' DA CONSIDERARE COMPRENSIVO DEI 3 LOTTI

Progettazione definitiva

CIPE: Si
Importo lavori: 184.708.315,50
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 1.444.000,00
Nome aggiudicatario: LOMBARDI S.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 0041917446030
Data inizio: 23/08/2004
Data fine: 24/11/2006

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

**Data collaudo tecnico-
amministrativo:**

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2016

Opere fabbricato e sistemazione piazzale T4

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: L'IMPORTO DEL PROGETTO E' RIFERITO AI 3 LOTTI
Progettazione definitiva
CIPE: Si
Importo lavori: 184.708.315,50
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 1.444.000,00
Nome aggiudicatario: LOMBARDI S.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 0041917446030
Data inizio: 23/08/2004
Data fine: 24/11/2006

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2016
