


SISTEMI URBANI

Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli

Consolidamento dei costoni e dei versanti della Collina dei Camaldoli - lato Soccavo

SCHEDA N. 116

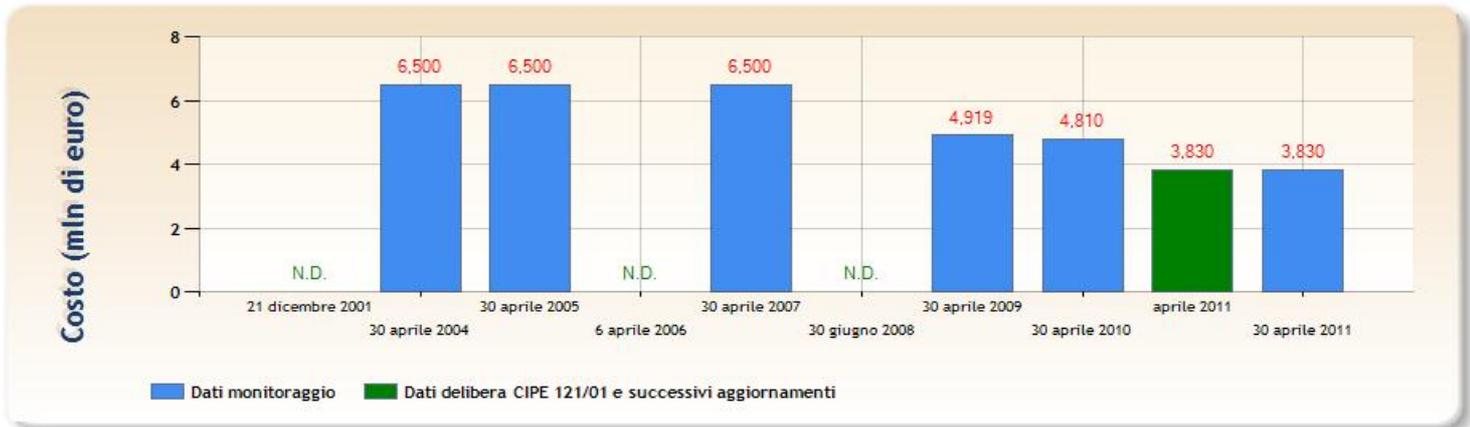

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Altre opere

Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori conclusi

DELIBERE CIPE

112/2002

ULTIMAZIONE LAVORI

2007

DESCRIZIONE

L'intervento complessivo di risanamento della collina dei Camaldoli prevede sia la progettazione ed esecuzione del sistema fognario che la messa in sicurezza del lato Soccavo e la sistemazione idrogeologica e regimazione delle acque provenienti dalla collina. L'intervento in questione riguarda solo il risanamento della pendice rocciosa del versante Soccavo.

DATI STORICI

1999

L'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 25 febbraio include la collina dei Camaldoli tra gli interventi prioritari di risanamento ambientale-sanitario-idrogeologico.

2001

La delibera CIPE n. 121, nel sottosistema "Sistemi Urbani" include "Napoli risanamento del sottosuolo", per un costo di 206,583 Meuro e una previsione di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 37,701 Meuro.

2002

Il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria relativa al "Consolidamento dei costoni e dei versanti della Collina dei Camaldoli-lato Soccavo".

Il CIPE (Delibera n.112 del 29 novembre) prende atto che per l'intervento esiste la progettazione esecutiva, approvata dal Comitato Tecnico Struttura Commissariale Sottosuolo, e che non è necessaria la VIA. Il progetto è in attesa del parere definitivo della Commissione edilizia integrata del Comune di Napoli, dell'Autorità di bacino, della Soprintendenza ai beni culturali e dei competenti enti erogatori dei servizi. E' previsto l'affidamento in appalto e il soggetto attuatore è il Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli. Il CIPE quindi assegna 6,5 Meuro da erogare successivamente all'approvazione del progetto esecutivo. L'onere, a carico della L. 166/02, è articolato in 3,25 Meuro per il 2003 e 3,25 Meuro per il 2004. Il commissario straordinario dovrà individuare ulteriori fonti di finanziamento.

2003

Il Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. del 25 febbraio 1999 pubblica i bandi di gara per l'appalto dei lavori.

In settembre il Commissario Straordinario aggiudica i lavori.

2006

L'intervento è contemplato dalla delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2009

L'intervento è contemplato dalla delibera CIPE n.10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera " Consolidamento costoni collina dei Camaldoli - lato Soccavo", articolata in due interventi (Zona A e B), è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera " Consolidamento costoni collina dei Camaldoli - lato Soccavo", articolata in due interventi (Zona A e B), è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 100%).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta che i lavori della Zona A e della Zona B sono stati conclusi e collaudati.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	6,500 Fonte: Delibera CIPE 112/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2005	6,500 Fonte: Delibera CIPE 112/2002
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	6,500 Fonte: Delibera CIPE 112/2002
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	4,919 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	4,810 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	3,830 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	3,830 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	4,920 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	4,920
Fondi Legge Obiettivo	4,920 Fonte: DEF 2012-2014

Fondi residui:	-1,090
-----------------------	---------------

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2948 del 25 Febbraio 1999

IGQ tra Governo e Regione Campania del 18 Dicembre 2001

Delibera CIPE 112/2002 del 29 Novembre 2002

Zona A

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:**Note:****Progettazione esecutiva**

CIPE: Si
Importo lavori: 3.173.192,42
Servizio: Interno
Costo progettazione interno:
Data inizio:
Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 540 giorni
Data bando: 18/07/2003
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 02/09/2003
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI
Codice fiscale aggiudicatario: 00586730251
Data contratto: 28/04/2005

Quadro economico:

Importo a base gara: 3.173.192,42
Importo oneri per la sicurezza: 149.522,16
Importo complessivo a base di gara: 3.322.714,58
Importo aggiudicazione: 2.427.207,95
Somme a disposizione: 650.353,66
Totale: 3.077.561,61
% Ribasso di aggiudicazione: 28,22
% Rialzo di aggiudicazione:

Note:**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 29/12/2004
Data presunta fine lavori: 22/06/2006
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori: 29/12/2004
Data effettiva fine lavori: 14/02/2007
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 04/01/2008

Data collaudo tecnico-
amministrativo:

23/11/2009

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

6

Totale giorni sospensione:

69

Note:

Varianti:

Numero totale:

1

Giorni proroga totali:

170

Motivi:

Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006

Altri motivi:

Importo:

2.277.684,06

Importo oneri sicurezza:

149.522,04

Somme a disposizione:

572.802,69

Totale:

3.000.008,79

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

2007

Previsione al 30/04/2009

2007

Previsione al 30/04/2010

2007

Previsione al 30/04/2011

2007

Zona B

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	360 giorni
Data bando:	18/07/2003
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	18/09/2003
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	CESI s.r.l.-GEO s.a.s.
Codice fiscale aggiudicatario:	01117520666
Data contratto:	28/04/2005
Quadro economico:	
Importo a base gara:	2.008.119,82
Importo oneri per la sicurezza:	90.365,39
Importo complessivo a base di gara:	2.098.485,21
Importo aggiudicazione:	1.460.600,93
Somme a disposizione:	464.060,09
Totale:	1.924.661,02
% Ribasso di aggiudicazione:	28,55
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	06/11/2005
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	11/11/2004
Data effettiva fine lavori:	13/06/2006
Data presunta fine lavori varianti:	13/06/2006
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	28/08/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo:	28/08/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale: 15
Totale giorni sospensione: 159
Note:

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 60
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:
Importo: 1.370.198,18
Importo oneri sicurezza: 90.365,39
Somme a disposizione: 464.097,43
Totale: 1.924.661,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007 2007
Previsione al 30/04/2009 2007
Previsione al 30/04/2010 2006
Previsione al 30/04/2011 2006
