



## SCHEMI IDRICI

### MOL - Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento

#### SCHEMA N. 150

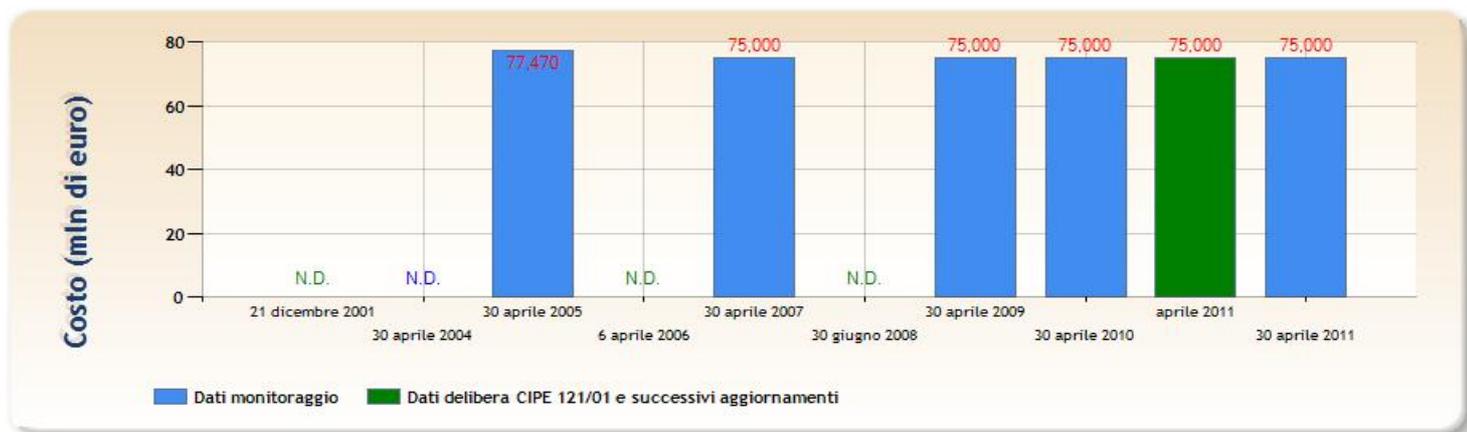

#### LOCALIZZAZIONE

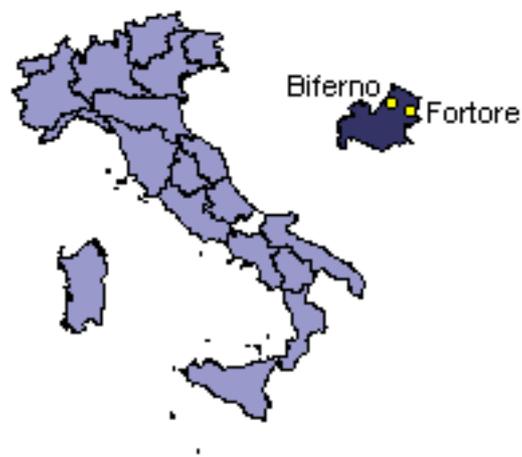

#### CUP:

G57H04000050001

#### TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

#### SOGGETTO TITOLARE:

Consorzio di Bonifica Integrale  
Larinense

#### STATO DI ATTUAZIONE

Opere con bando di gara per la realizzazione pubblicato

#### DELIBERE CIPE

153/2005  
75/2006  
99/2006  
147/2006

#### ULTIMAZIONE LAVORI

---

## DESCRIZIONE

Il progetto prevede l'irrigazione, mediante l'utilizzo delle acque del fiume Biferno invasate dalla diga di Ponte Liscione, del comprensorio irriguo del Basso Molise ricadente nei Comuni di Ururi e San Martino in Pensilis tra le quote 200 e 120 metri s.l.m., nonché l'alimentazione di comprensori irrigui già eserciti ed alimentati con sollevamenti gestiti da questo Consorzio di bonifica (Piane Alte di Larino) e da quello di Termoli (contrada Saccione). In particolare, le opere previste nel 1° intervento consistono nel sifone di derivazione, nella condotta premente ed in quella adduttrice che alimenta i due distretti di nuova realizzazione ed i quattro già esistenti in agro di Larino e San Martino in Pensilis.

---

## DATI STORICI

### 2001

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 121 nel sottosistema "Schemi Idrici.

### 2003

Il Corpo Forestale dello Stato, con nota del 16 luglio, emette il nulla osta alla realizzazione dell'intervento.

In data 4 dicembre si avvia il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità.

### 2004

La Regione Molise, sentiti i Comuni interessati, esprime parere favorevole ai fini dell'intesa sulla localizzazione.

Il 12 gennaio si svolge la CdS. Lo stesso giorno, la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Regione Molise esprime parere favorevole all'attraversamento dei suoli fratturali con alcune osservazioni e prescrizioni. Il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (CTAR), nella seduta del 28 gennaio, esprime parere favorevole sul progetto definitivo per un importo di 77,5 Meuro, subordinatamente ad alcune prescrizioni.

Il RUP comunica che il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si è concluso con la scadenza dei termini di legge, senza osservazioni e opposizioni.

L'Assessorato all'ambiente della Regione Molise esprime parere favorevole sulla compatibilità ambientale.

Il MIT trasmette la relazione istruttoria sul progetto definitivo e l'integrazione alla relazione istruttoria, proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto dell'opera, con prescrizioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilità del FAS.

L'opera è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Molise del 3 giugno.

Con la delibera n. 21, il CIPE destina i 1.130 Meuro della delibera n. 19/2004 – al netto di 23 Meuro destinati alla premialità – ed ulteriori 200 Meuro posti a disposizione dal MIT, al finanziamento di una serie di interventi tra cui figura (al decimo posto della graduatoria) l'opera "Irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore" con un costo previsto di 77,5 Meuro. La delibera prevede inoltre che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta con successive delibere che dovranno definire il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende defianziato, nonché tempi e modalità di erogazioni.

L'opera, pur essendo stata inserita nell'elenco del Pre-CIPE del 20 dicembre, non figura esaminata né nella seduta del CIPE del 20 dicembre, né in quelle successive (18 marzo e 27 maggio 2005).

### 2005

Il Direttore generale Reti del MIT ed il Commissario ad acta per la gestione attività ex Agensud del Ministero delle politiche agricole, in data 20 luglio, convengono che l'intervento è coerente con l'attuale programmazione del Ministero delle politiche agricole e chiedono alla Regione Molise di eseguire gli approfondimenti tecnici necessari in sede di progettazione esecutiva, con particolare riguardo all'ottenimento di possibili economie gestionali. Chiedono, inoltre, alla stessa regione di costituire un'adeguata struttura tecnico amministrativa di supporto al soggetto

aggiudicatore. La delibera CIPE n. 98, ai fini dell'ammissione al finanziamento FAS, prevede che le prescrizioni formulate dal Ministero delle politiche agricole siano recepite nel progetto esecutivo entro il 31 ottobre 2005.

Il Ministero delle politiche agricole, con nota del 15 settembre, formula una serie di prescrizioni.

Il CIPE, con delibera n. 153, approva in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento del costo complessivo di 77,5 Meuro.

## **2006**

Il CIPE, con delibera n. 75, esclude l'intervento dal finanziamento a carico dei fondi FAS, ai sensi della delibera n. 98/2005.

Il CIPE, con delibera n. 99, prende atto che il soggetto aggiudicatore è il Consorzio Bonifica Integrale Larinese e che il costo complessivo è di 77,5 Meuro. Assegna, quindi, in via programmatica al soggetto aggiudicatore un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 76 Meuro. L'effettiva assegnazione del contributo è vincolata alla presentazione da parte del soggetto aggiudicatore, entro due mesi dalla data di pubblicazione nella GU della delibera, "della rimodulazione del progetto, coerentemente con le disponibilità comprensive dell'assegnazione programmatica disposta".

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Il CIPE, con delibera n. 147, ridetermina il "limite di spesa" in 75 Meuro e assegna in via definitiva il finanziamento dell'intervento.

## **2009**

Nel 1° Atto aggiuntivo all'intesa generale quadro tra il Governo e Regione Molise, sottoscritto il 23 gennaio, le parti concordano che "il Governo, con riferimento al periodo 2009-2013, dia impulso alle procedure approvative e individui le coperture finanziarie per complessivi 435,8 Meuro verificando i casi in cui è possibile il ricorso a strumenti finanziari che prevedano il coinvolgimento di capitali privati (Partenariato Pubblico Privato, Project Financing ecc.)" per la realizzazione del completamento irrigazione del Basso Molise, con le acque dei Fiumi Biferno e Fortore, per 120 Meuro.

L'intervento è compreso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

Dalla Relazione del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese sullo stato del Procedimento dell'opera "Irrigazione del Basso Molise con le Acque dei Fiumi Biferno e Fortore - 1° Intervento" al 30 dicembre 2009" si rileva, tra l'altro, che a seguito della chiusura della fase di validazione del progetto esecutivo e del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione consortile, con deliberazione del Comitato Esecutivo del 29 novembre, ha approvato il progetto esecutivo e sta predisponendo il bando di gara e i relativi allegati. Si rileva inoltre che è in fase di determinazione la procedura per l'individuazione dell'Istituto di credito erogatore del mutuo per il finanziamento dei lavori.

## **2010**

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Irrigazione del basso Molise acque fiumi Biferno e Fortore" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

## **2011**

Il 24 febbraio, il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese pubblica il bando di gara per l'affidamento dei lavori di "irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento". Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato al 21 aprile 2011.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Irrigazione del basso Molise acque fiumi Biferno e Fortore" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, si rileva che l'avvio dei lavori è previsto per il 15 settembre 2011 e l'ultimazione, dopo 3 anni,

il 15 settembre 2014.

---

## COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. <b>Fonte:</b>
Previsione di costo al 30 aprile 2005	77,470 <b>Fonte:</b> Corte dei Conti
Costo al 6 aprile 2006	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	75,000 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 147/2006
Costo al 30 giugno 2008	N.D. <b>Fonte:</b> DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	75,000 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 147/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2010	75,000 <b>Fonte:</b> DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	75,000 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	75,000 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 147/2006

---

## QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

### Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	75,000 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014

---

<b>Disponibilità al 30 aprile 2011:</b>	<b>75,000</b>
Fondi Legge Obiettivo	29,003 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 147/2006
Fondi Legge Obiettivo	45,997 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 147/2006

---

<b>Fabbisogno residuo:</b>	<b>0,000</b>
----------------------------	--------------

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

<b>Livello di progettazione raggiunto:</b>	Progettazione esecutiva
<b>Conferenza di servizi:</b>	Conclusa
<b>Note:</b>	Progettazione esecutiva affidata allo Studio FERRAUTO in data 24/11/2004.

### Progettazione esecutiva

<b>CIPE:</b>	Si
<b>Importo lavori:</b>	54.345.779,76
<b>Servizio:</b>	Esterno
<b>Importo a base gara:</b>	
<b>Importo di aggiudicazione:</b>	
<b>Nome aggiudicatario:</b>	
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data inizio:</b>	
<b>Data fine:</b>	

### AFFIDAMENTO LAVORI:

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Consorzio di Bonifica Integrale Larinese
--------------------------------	------------------------------------------

<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Procedura aperta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo più basso
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	923 giorni
<b>Data bando:</b>	24/02/2011
<b>CIG/CUI:</b>	069824305A
<b>Data aggiudicazione:</b>	
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	
<b>Nome aggiudicatario:</b>	
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	51.983.171,38
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	2.362.608,38
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	54.345.779,76
<b>Importo aggiudicazione:</b>	
<b>Somme a disposizione:</b>	20.654.220,24
<b>Totale:</b>	75.000.000,00
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	Legge 21/12/2001 n. 443 - Primo programma delle infrastrutture strategiche - Schemi idrici della Regione Molise: Irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° Intervento (del CIPE n. 147/2006)

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	15/09/2011
<b>Data presunta fine lavori:</b>	15/09/2014
<b>Stato avanzamento importo:</b>	
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	
<b>Tempi realizzazione:</b>	
<b>Data collaudo statico:</b>	
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	

**Note:**

**Varianti:**

**Numero totale:**

**Giorni proroga totali:**

**Motivi:**

**Altri motivi:**

**Importo:**

**Importo oneri sicurezza:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**Note:**

---

## **NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

IGQ tra Governo e Regione Molise del 4 Giugno 2004

Delibera CIPE 19/2004

del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 21/2004

del 29 Settembre 2004

Pre-CIPE del 20 Ottobre 2004

Delibera CIPE 98/2005

del 29 Luglio 2005

Delibera CIPE 153/2005

del 2 Dicembre 2005

Delibera CIPE 75/2006

del 29 Marzo 2006

Delibera CIPE 99/2006

del 29 Marzo 2006

Delibera CIPE 147/2006

del 17 Novembre 2006

1° Atto aggiuntivo IGQ Governo e Regione Molise del 23 Gennaio 2009

Relazione del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese sullo stato del Procedimento dell'opera "Irrigazione del Basso Molise con le Acque dei Fiumi Biferno e Fortore - 1° Intervento" del 30 Dicembre 2009

Bando di gara Consorzio di Bonifica Integrale Larinese del 24 Febbraio 2011
