



ILVA in A.S.

Gestione Patrimonio Destinato e
avanzamento interventi Aree Escluse

Audizione alla Camera del 24 Maggio 2022

L' Art. 3, comma 1 del D.L. 1/2015 identifica il Patrimonio Destinato ad interventi di risanamento e bonifica dello stabilimento di Taranto

In data 24 maggio 2017 la gestione commissariale di ILVA in A.S. ha sottoscritto un [accordo transattivo](#) con esponenti della famiglia Riva, che ha consentito:

- [la rimozione degli ostacoli](#) frapposti al trasferimento in Italia di somme e titoli già sottoposti a sequestro preventivo penale, appartenenti ad azionisti e gestori delle società del Gruppo Ilva, per circa € 1.1 miliardi, da destinare all'esecuzione degli interventi di disinquinamento, in applicazione del principio «chi inquina paga». Il trasferimento a favore dell'Amministrazione Straordinaria è stato regolato attraverso l'emissione di obbligazioni nominative da parte di Ilva in A.S., per un [controvalore complessivo pari ad oltre € 1.1 miliardi](#), intestate al F.U.G. e, per esso, a Equitalia Giustizia S.p.A. (art. 3, comma 1 del D.L. 1/2015);
- [l'acquisizione dalla famiglia Riva di ulteriori fondi per un valore di € 230 milioni](#), di cui € 145 milioni da destinare a supporto della gestione corrente di ILVA in A.S.
- Nell'ambito della transazione gli esponenti della famiglia Riva hanno rinunciato ad ogni pretesa anche in caso di proscioglimento per i reati ad essi ascritti.

Come previsto dal citato articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, tali risorse finanziarie sono utilizzate dalla gestione commissariale di ILVA in A.S. per finanziare [interventi di risanamento e bonifica ambientale](#) tramite il patrimonio destinato appositamente costituito.

La Commissione Europea, con la decisione CE n. 1498/2018, rilevando la natura privata delle somme del patrimonio destinato (essendo derivate da una transazione stipulata con i precedenti proprietari e gestori dello stabilimento, ha escluso che la disciplina italiana circa la forma giuridica del trasferimento di queste somme a favore di Ilva in A.S. potesse configurare un aiuto di Stato.

Nel giugno 2017 le somme del patrimonio destinato hanno cominciato ad entrare nella disponibilità di Ilva in A.S., secondo le modalità individuate dal legislatore. Le operazioni per il trasferimento si sono completate a dicembre 2018.

L'Art. 10 D.L. 21/2022 reindirizza 150 M€ di Patrimonio Destinato ad interventi per decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto

D.L. 21 marzo 2022, n. 21, Articolo 10, comma 2

«All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo e' sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente, **nonche' per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro**, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo' avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalita' di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo.»

La Comfort Letter CE (Mag 2016) identifica i budget originari per gli interventi di bonifica nelle Aree Escluse

Le somme necessarie secondo il Piano Ambientale agli interventi di bonifica nelle "Aree Escluse" in capo ad ILVA in A.S., sono state originariamente individuate dalla Commissione Europea, d'intesa con il Governo Italiano, precedentemente all'approvazione del DPCM del 29 settembre 2017.

Tali importi, rinvenibili dalla Comfort Letter CE (4 maggio 2016) e concordate sulla base di una prima e sommaria valutazione, fanno riferimento ad interventi di decontaminazione degli inquinamenti accumulati per effetto di attività precedenti al Commissariamento di ILVA, e sono stati doverosamente considerati dall'Area Tecnica di Ilva in A.S. come base per la determinazione dei budget.

Su queste basi, ulteriori interventi di bonifica e risanamento ambientale, con relativi budget, sono stati individuati da Ilva in A.S. per le aree di propria competenza.


Principali somme per interventi di bonifica nelle Aree Escluse identificate dalla Comfort Letter CE di Maggio 2016

Area Intervento	Ammontare	Note
Gravina Leucaspidi	206.0 M€	
Fanghi AFO-ACC	50.0 M€	Ammontare include anche Polverino d'altoforno (OAF) (gestione non ILVA in A.S.)
Suolo fanghi AFO-ACC	21.4 M€	Ammontare include anche suolo Polverino Polverino d'altoforno (OAF) (gestione non ILVA in A.S.)
Discarica ex Cava Due Mari	2.8 M€	
Discarica ex Cementir	7.0 M€	
Discarica NW e Area Fintecna	8.6 M€	Ammontare include anche altre discariche (gestione non ILVA in A.S.) ⁴

1,157M€ di Patrimonio Destinato ad interventi di decontaminazione, bonifica e decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto

Aggiornamento al 20.05.2022


Allocazione fondi Patrimonio Destinato (M€)

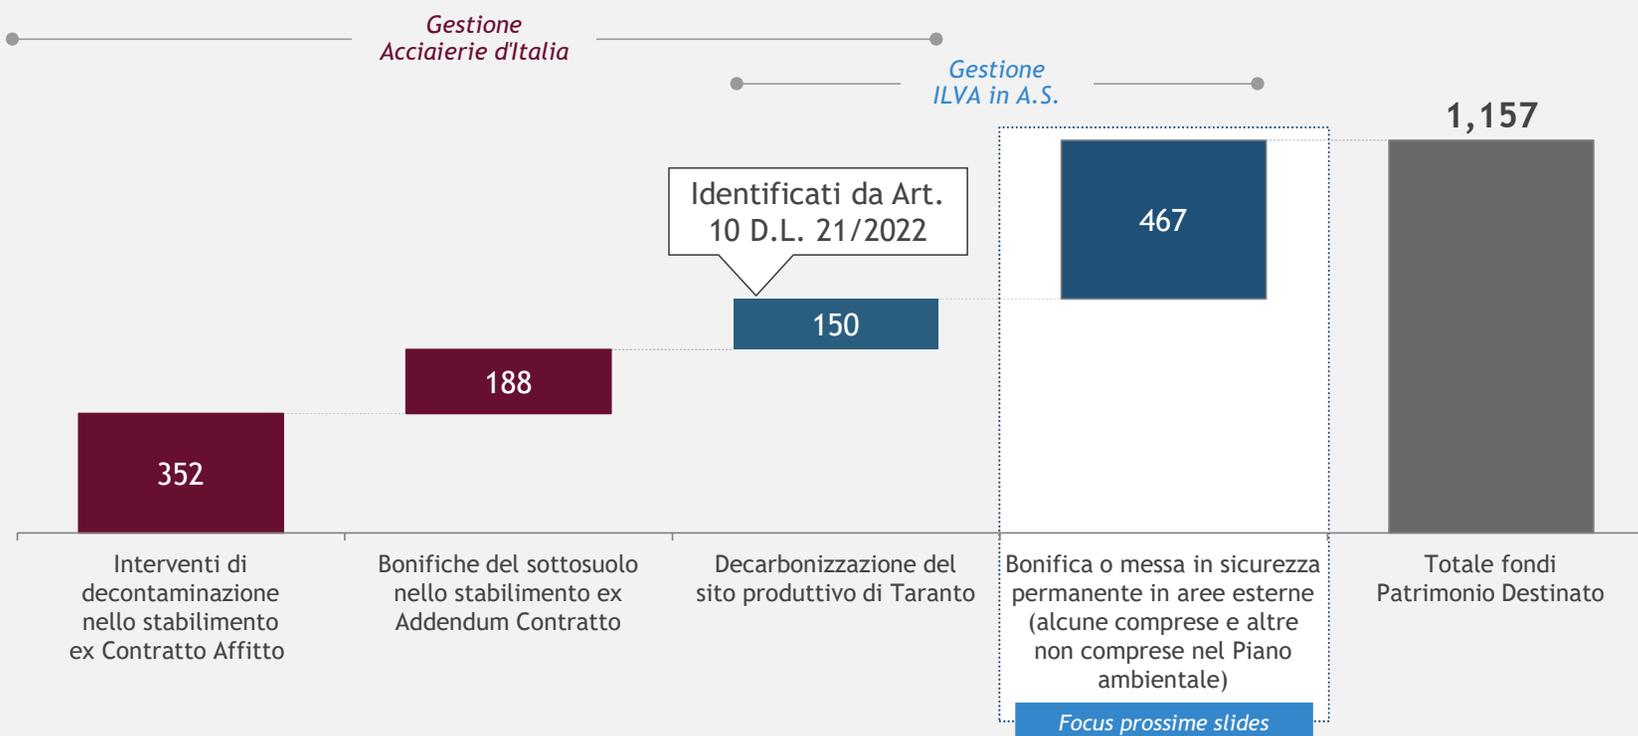

467M€ di Patrimonio Destinato per la bonifica e messa in sicurezza delle "aree escluse" in perimetro Ilva in A.S.

Aggiornamento al 20.05.2022

Stato utilizzo fondi Patrimonio Destinato in gestione ad Ilva in A.S. (M€)

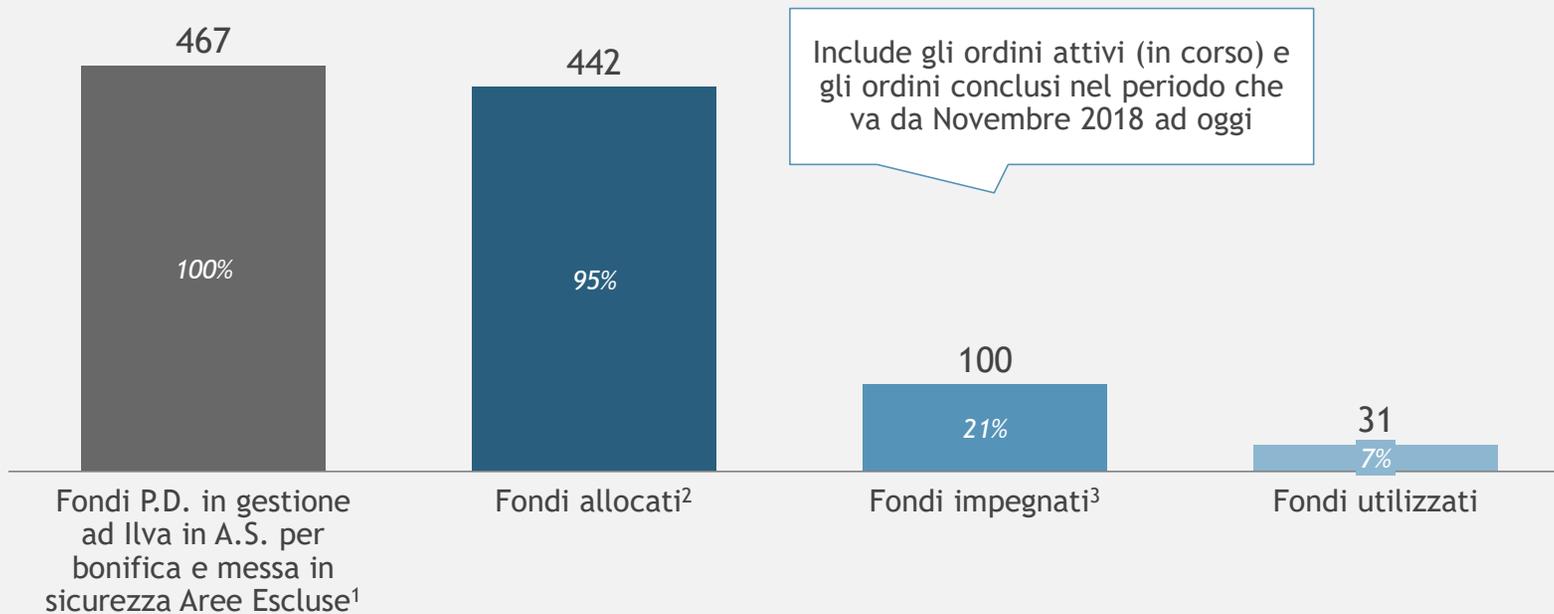


1. Non include i 150 M€ che l'Art. 10 D.L. 21/2022 reindirizza alla decarbonizzazione dello Stabilimento di Taranto 2. Include fondi allocati per siti di Taranto (comuni di Taranto, Statte e Crispiano) e per i siti di Varzi, Torino e Patrica 3. Include pagato e ordini effettuati ancora da pagare
Nota: I numeri sono arrotondati

93 M€ rimborsati ad AdI da Ilva in A.S. per interventi consuntivati e 8.5 M€ spesi da Ilva in A.S. precedentemente al subentro (1.11.2018)

Aggiornamento al 20.05.2022


Stato utilizzo fondi Patrimonio Destinato in gestione ad Acciaierie d'Italia (AdI) (M€)

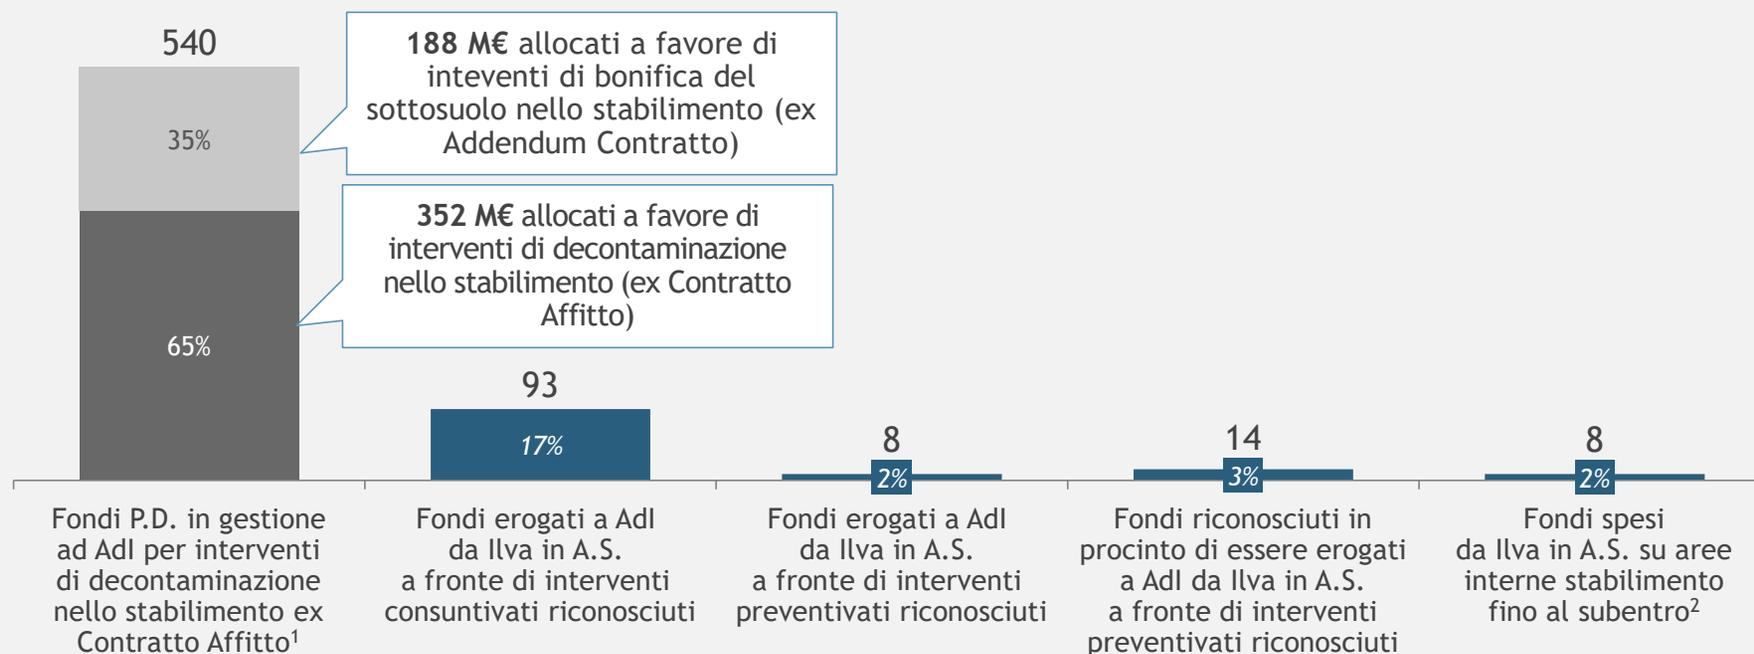

1. Non include i 150 M€ che l'Art. 10 D.L. 21/2022 reindirizza alla decarbonizzazione dello Stabilimento di Taranto 2. Al 1.11.2018

Nota: I numeri potrebbero non sommare perfettamente a causa degli arrotondamenti; Include rimborsi da Nov 2018 ad oggi

18 aree escluse dal perimetro di cessione ad AdI classificate in 4 gruppi

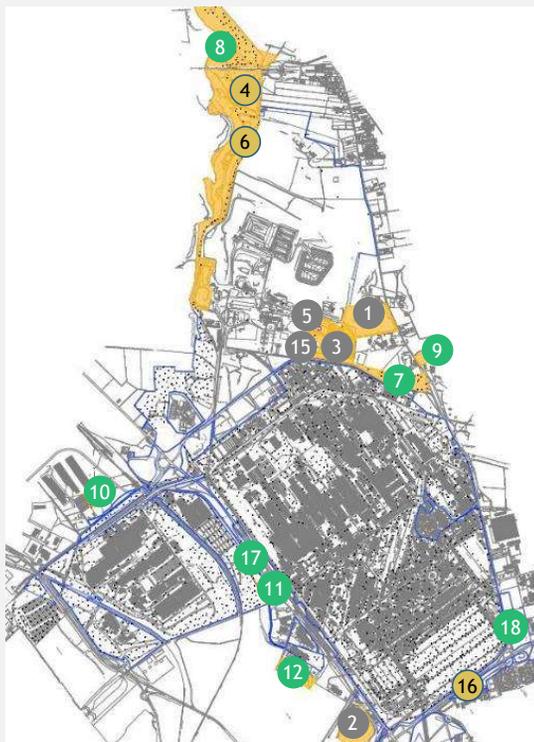

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  1 | Discarica Ex Cava Due Mari |  10 | Land C - Area a verde adiacente a stabilimento |
|  2 | Discarica Ex Cava Cementir |  11 | Land D1 - Area a verde adiacente a stabilimento |
|  3 | Stoccaggio Fanghi AFO ed ACC |  12 | Land E - Sito industriale non attivo ex Sidercomit |
|  4 | Discarica NordOvest & Area Fintecna | 13 | Land I - Area a verde adiacente ad Ospedale Nord |
| 5 | Discarica Nuove Vasche |  14 | Land L - Cava L'Amastuola |
|  6 | Gravina Leucaspidi | 15 | Aree limitrofe stoccaggio fanghi |
|  7 | Aree a verde lungo SP Statte lato ovest |  16 | Collinette ecologiche Tamburi |
|  8 | Aree a verde NORD |  17 | Land D2 - Area a verde con chiesetta |
|  9 | Land A - Area a verde adiacente a stabilimento |  18 | Area Pozzo 25 |

	Aree sottoposte a Sequestro con Interventi in corso		Aree con interventi in corso		Aree in manutenzione e con procedimento da definire		Aree cedibili e prive di pendenze
---	---	---	------------------------------	---	---	---	-----------------------------------



Area in Perimetro Sito Interesse Nazionale (SIN) di Taranto



Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN di Taranto

Nota: Non rappresentate aree non adiacenti allo stabilimento produttivo (Voce 13 - Land I e Voce 14 - Land L) con superficie complessiva di 128.4 ettari

Fonte: ILVA

Recap interventi in corso o pianificati (I/IV)

Fondi (M€)

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Allocati	Impegnati ¹	Pagato	Fatturato	Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
 1 Due Mari	UA5	Adeguamento copertura sommitale (d.lgs. 36/03) Copertura scarpata nord - Opere accessorie e impianti - Monitoraggi ex DL 1/2015 (fino al 28/08/2023)	10/01/2022	5.05	5.95 + 898 k€ vs budget	5.39 + 342 k€ vs budget	5.47 + 422 k€ vs budget	14.0	<ul style="list-style-type: none"> Attività completata Ricevuti Elenco elaborati progetto esecutivo e Relazione stato di avanzamento lavori da Ing. Basile (D.L.)
 2 Cementir	UA25	Adeguamento copertura sommitale - Rifacimento diaframma plastico perimetrale - Opere accessorie e impianti - Smaltimento percolato - Monitoraggi ex DL 1/2015 - Bonifica falda - Presentata al MITE variante di progetto con Fondo Allocato soggetto a revisione	08/02/2023	16.75	17.37 + 618 k€ vs budget	5.40	6.47	8.6	<ul style="list-style-type: none"> Approvata variante di progetto il 15/02/2022 in Conferenza dei Servizi ed emesso ordine per sua esecuzione. Formalizzata con Cemitaly la concessione di nuove aree incluse nella variante progetto. In fase di emissione nuovo ordine per smaltimento percolato quale rifiuto pericoloso
 3 Fanghi AFO/ACC	UP3	Rimozione di circa 490.000 t fanghi AFO e fanghi ACC - Caratterizzazione ambientale - Monitoraggi falda - Bonifica suolo superficiale e ripristino ambientale	23/08/2023	75.03	69.18	7.89	9.19	7.0	<ul style="list-style-type: none"> Presentato piano di caratterizzazione: MiTE ha deciso di rimandare suo esame al termine dell'attività rimozione fanghi. Smaltimento fanghi operato da 3 Società. Esteso tempo operativo cantiere a 2 turni giorno
 4 Nord Ovest ed Ex Area Fintecna	UP4-UP7	Copertura per superficie totale (ex UP4-UP7) - Indagini integrative - Monitoraggi ex DL 1/2015 (fino al 28/08/2023)	23/08/2023	12.00	0.10	0.03	0.05	12.9	<ul style="list-style-type: none"> In corso indagini classificazione pericolosità rifiuti. Pianificato ripristino di un piezometro di falda profonda Emessa RdA per aggiornamento progetto di messa in sicurezza permanente
5 Discarica Nuove Vasche	UP8	Gestione post-operativa e controlli (30 anni)	31/07/2048	3.00	1.35	0.87	0.95	3.6	<ul style="list-style-type: none"> Campionamenti e rilievi eseguiti in base al piano di post-gestione In esecuzione progetto potenziamento rete raccolta acque meteoriche Nessuna criticità evidenziata

 Aree cedibili e prive di pendenze
  Aree con interventi in corso
  Aree in manutenzione e con procedimento da definire
  Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso
  Area in Perimetro SIN² di Taranto
  Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN² di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

Recap interventi in corso o pianificati (II/IV)

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Fondi (M€)				Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
				Allocati	Impegnati ¹	Pagato	Fatturato		
 6 Gravina Leucaspidie	-	Messa in sicurezza del rilevato (erosione)	<i>Da definire</i>	226.60	0.31	0.12	0.16	46.5	<ul style="list-style-type: none"> Attività integrativa con georadar completata Attività di indagini ambientali «Piano Onofrio» completate. Relativa documentazione(report e allegati) consegnata al MiTE ed alla Procura della Repubblica Taranto Indetta CdS decisoria dal MiTE in merito al PDC in data 15/07/2022 Trasmesso ad Arpa Puglia per condivisione piano indagini ambientali «Vecchie Vasche». Individuato esecutore speciale (impiego di elicottero per accesso area)
		Indagini ambientali in zone con moderate difficoltà di accesso (Piano Onofrio)	28/02/2022						
		Indagini ambientali e geotecniche in zone attualmente non accessibili	31/12/2022						
		Monitoraggio in continuo del rilevato	31/12/2022						
		Eventuale intervento di bonifica/ messa in sicurezza permanente (dopo esecuzione piano delle indagini ambientali - Monitoraggio annuale falda 31/12/2022)	<i>Da definire</i>						
 7 Aree a verde lungo SP Statte lato ovest	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino delle condizioni ambientali	31/12/2021 (In proroga)	4.88	0.17	0.09	0.13	6.9	<ul style="list-style-type: none"> Analisi di rischio in corso Interlocuzioni con Provincia Taranto in corso, emessa polizza fideiussoria Attuato da SNAM esproprio porzione di area per passaggio metanodotto.
 8 Aree a verde NORD	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino delle condizioni ambientali	31/12/2021 (In proroga)	18.40	0.80	0.29	0.34	26.7	<ul style="list-style-type: none"> Indagini integrative di caratterizzazione in corso A valle, esecuzione analisi di rischio
 9 Land A	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino delle condizioni ambientali	31/12/2021 (In proroga)	2.16	0.42	0.02	0.02	3.0	<ul style="list-style-type: none"> Conclusa rimozione cumuli rifiuti esogeni abbandonati ma rinvenuti ulteriori rifiuti esogeni compattati: in emissione informativa Enti competenti e rimozione. Esecuzione PdC, già autorizzato, rinviata a valle della totale rimozione rifiuti

 Aree cedibili e prive di pendenze
  Aree con interventi in corso
  Aree in manutenzione e con procedimento da definire
  Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso
  Area in Perimetro SIN² di Taranto
  Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN² di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

Recap interventi in corso o pianificati (III/IV)

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Fondi (M€)				Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
				Allocati	Impegnati ¹	Pagato	Fatturato		
 10 Land C	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino ambientale	31/12/2021 (In proroga)	1.29	0.07	0.04	0.04	1.8	<ul style="list-style-type: none"> Indagini di caratterizzazione terminate In esecuzione analisi rischio
 11 Land D1	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino ambientale	31/12/2021 (In proroga)	2.30	0.17	0.09	0.15	3.1	<ul style="list-style-type: none"> Indagine di caratterizzazione in corso Ritardo dovuto a definizione nuove 2 posizioni di sondaggio a causa di interferenza con sottoservizi del Consorzio ASI ed inerenti canale di scarico oggi AdI
 12 Land E (Sidercomit)	-	Caratterizzazione suoli e falda, compresi controlli e prestazioni accessorie - Bonifica falda - MSP terreni (pavimentazione)	22/07/2022 (In proroga)	3.65	0.11	-	0.02	4.3	<ul style="list-style-type: none"> Assegnato ordine per indagine caratterizzazione integrativa, piano operativo in fase di trasmissione a ARPA Puglia con inizio attività 30/05/2022 Emessa e approvata RdA per smaltimento residui di amianto e vecchio serbatoio in disuso rinvenuti nell'area
13 Land I	-	Gestione generale (verde, manutenzione, rifiuti, ...)	23/08/2023	0.01	-	-	-	0.2	<ul style="list-style-type: none"> Possibile cessione dell'area vista l'assenza di criticità ambientali.
 14 Land L (cava L'Amastuola)	-	Chiusura cava - Caratterizzazione suolo, sottosuolo e falda - Ripristino ambientale	Da definire	3.35	<0.01	<0.01	<0.01	128.2	<ul style="list-style-type: none"> In definizione Specifica Tecnica ed RdA per assegnazione incarico per studio di fattibilità discarica rifiuti non pericolosi; In fase la valutazione della presenza rifiuti e loro caratteristiche

 Aree cedibili e prive di pendenze
  Aree con interventi in corso
  Aree in manutenzione e con procedimento da definire
  Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso
  Area in Perimetro SIN² di Taranto
  Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN² di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

Recap interventi in corso o pianificati (IV/IV)

Fondi (M€)

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Allocati	Impegnati ¹	Pagato	Fatturato	Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
Aree limitrofe a stoccaggio fanghi	-	Caratterizzazione suoli e falda, compresi controlli e prestazioni accessorie - Monitoraggi falda - Bonifica e ripristino suolo superficiale	23/08/2023	12.90	-	-	-	8.1	<ul style="list-style-type: none"> Area utilizzata come base logistica per esecuzione rimozione fanghi Nessuna attività in corso e in agenda Al termine operazione fanghi si eseguirà PdC
Collinette ecologiche Tamburi (1)	-	Caratterizzazione e messa in sicurezza - Monitoraggi	Da definire	37.50	0.84	0.79	0.79	9.6	<ul style="list-style-type: none"> In attesa autorizzazione ANAS per esecuzione manutenzione verde lungo S.S.7 Realizzato nuovo impianto di irrigazione sulle 3 collinette. In corso Intervento per miglioramento stato vegetativo collinette Eseguite indagini ambientali e analisi di rischio autorizzate da Autorità giudiziaria Attività di campionamento acqua di falda verrà entro fine maggio 2022.
Land D2 (chiesetta)	-	Gestione generale (verde, manutenzione, rifiuti)- Caratterizzazione suolo/sottosuolo compresi controlli e prestazioni accessorie Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo, ripristino condizioni ambientali	31/12/2021 (In proroga)	0.10	0.05	0.05	0.05	0.1	<ul style="list-style-type: none"> Analisi di rischio in corso Il 15/5/2022 svolto sopralluogo con Sovrintendenza Beni culturali Emessa RdA per elaborazione progetto finalizzato al restauro strutturale e recupero architettonico.
Area Pozzo 25	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino ambientale - Ripristino impianto emungimento acqua per irrigazione «Collinette ecologiche»	09/09/2022 (In proroga)	0.39	0.15	<0.01	<0.01	0.5	<ul style="list-style-type: none"> Ricevuta proroga da MITE indagini caratterizzazione, fissata al 09/09/2022 (da Decreto) Emesso ordine per impianto desalinizzazione per produzione di acqua a scopo irriguo.

Aree cedibili e prive di pendenze
 Aree con interventi in corso
 Aree in manutenzione e con procedimento da definire
 Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso
 Area in Perimetro SIN² di Taranto
 Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN² di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

Recap interventi in corso o pianificati (V/V)

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Fondi (M€)				Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
				Allocati	Impegnati ¹	Pagato	Fatturato		
Aree Comuni	-	Costi di cantiere comuni a più interventi	-	8.51	1.14	0.64	0.73	n.d.	-
G&A	-	Spese relative al personale e Spese amministrative di diretta imputazione	-	-	-	7.36	-	n.d.	-
Sito di Torino	-	Interventi per rimozione di rifiuti necessari alla messa in sicurezza del sito	n.d.		0.01	0.01	0.01	n.d.	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna attività attualmente in corso Sito in predicato di essere venduto
Sito di Varzi	-	Monitoraggio ambientale - Smaltimento rifiuti - Rimozione coperture in amianto e abbattimento opere verticali - Indagine ambientale preliminare - Messa in sicurezza area - Piano di caratterizzazione - Analisi di rischio e valutazione attività di bonifica	23/06/2022	8.50	1.68	1.58	1.60	n.d.	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio ambientale, smaltimento rifiuti, rimozione coperture e abbattimento opere verticali completati Indagine ambientale e messa in sicurezza sito in corso Nessuna criticità evidenziata, le attività proseguono come da cronoprogramma concordato con Arpa
Sito di Patrica	-	Interventi per rimozione di rifiuti necessari alla messa in sicurezza del sito	n.d.		0.03	-	0.03	n.d.	<ul style="list-style-type: none"> Il sito è stato venduto
Totale				442	100	31	26		

57 Risorse
(totalmente o parzialmente)
dedicate alle bonifiche

⊗ Aree cedibili e prive di pendenze
 ⊗ Aree con interventi in corso
 ⊗ Aree in manutenzione e con procedimento da definire
 ⊗ Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso
  Area in Perimetro SIN² di Taranto
  Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN² di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

La struttura commissariale resta doverosamente a disposizione per ogni ulteriore informazione
