



Camera
dei
deputati

SERVIZIO STUDI

Infrastrutture strategiche e prioritarie 2025

RAPPORTO ANNUALE – STATO DI ATTUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 2025





01

Programmazione e realizzazione infrastrutture strategiche e prioritarie

Costo infrastrutture strategiche prioritarie



I DATI

Valori in euro

483mld

Rilevazione
31/08/2024

522mld

Rilevazione
30/11/2025

+8%

su rilevazione
precedente

Il costo delle infrastrutture strategiche e prioritarie al 30 novembre 2025 ammonta a 522,021 miliardi di euro, in aumento di 38,615 miliardi (+8%) rispetto alla precedente rilevazione aggiornata al 31 agosto 2024, che individuava una spesa di 483,406 miliardi.

Aumento dovuto a:

- aggiornamento del costo delle infrastrutture strategiche e prioritarie monitorate al 31 agosto 2024 (incremento dei costi degli interventi dovuto all'avanzamento progettuale e all'aggiornamento dei quadri economici per adeguamenti tariffari connessi all'aumento dei prezzi).
- L'ingresso nel perimetro delle infrastrutture strategiche e prioritarie con il commissariamento della diga di Vetto nell'Appennino Reggiano il cui costo è stimato in 519 milioni di euro.

Costo programmi e interventi strategici e prioritari



I DATI

Valori in euro

522mld

Rilevazione 30/11/2025

210mld

Il costo delle opere commissariate o PNRR-PNC

312mld

Il costo delle altre infrastrutture programmate dal 2001

210.082
Commissariate
o inserite nella
programmazione
PNRR-PNC

311.939
Altre strategiche
e prioritarie

Importi in milioni di euro

Commissariate
non PNRR-PNC
138.258

Commissariate
e PNRR-PNC
43.962


PNRR-PNC non
Commissariate
27.862

Altre prioritarie
267.361

Strategiche
non prioritarie
44.578

Commissariate
182.220

PNRR-PNC
71.824

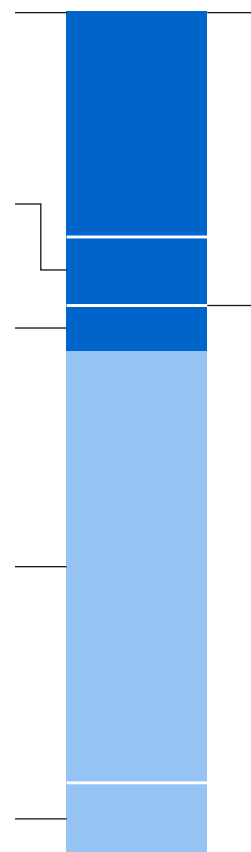

I DATI

Valori in euro

522mld

Rilevazione 30/11/2025

352mld

Il totale delle risorse disponibili

67%

La copertura finanziaria al 30 novembre 2025

Importi
in milioni
di euro

67%

Disponibilità ●
351.994

33%

● Fabbisogno
170.027

88%

Risorse pubbliche
311.071

12%

Risorse private
40.922

Fonte di
finanziamento

522mld €
Costo
complessivo

La destinazione dei costi per settore



I DATI


Valori in euro

522mld

Rilevazione
30/11/2025

417mld

Ferrovie, strade
e Ponte sullo Stretto

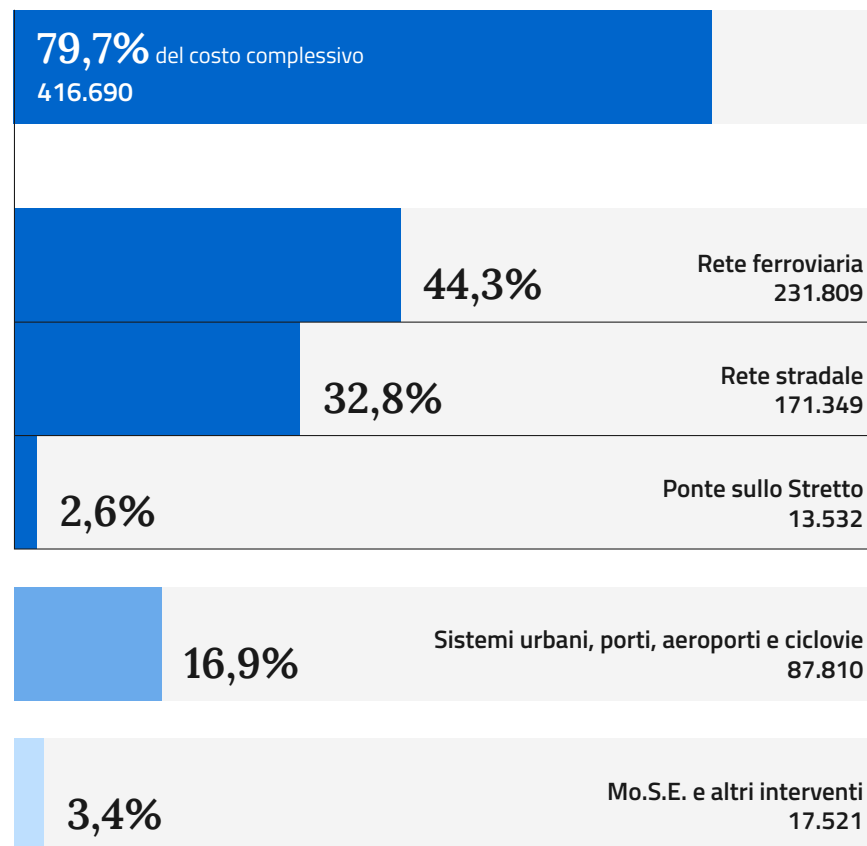

Importi
in milioni
di euro

Costi per stato di avanzamento dei lavori



I DATI

Valori in euro

522mld

Rilevazione
30/11/2025



Lavori ultimati
75mld €
+9,5% rispetto al 08/2024

13%

Lavori con contratto sottoscritto e lavori da avviare
33mld €
-9,4% rispetto al 08/2024

7%

Lavori in corso
174mld €
+19% rispetto al 08/2024

35%

Lavori in gara o aggiudicati
20mld €
+78,4% rispetto al 08/2024


4%

Al netto dei lotti con stato
di avanzamento misto

Lavori in fase di progettazione da affidare
189,5mld €
+4,1% rispetto al 08/2024


39%

Lo stato di avanzamento dei lavori

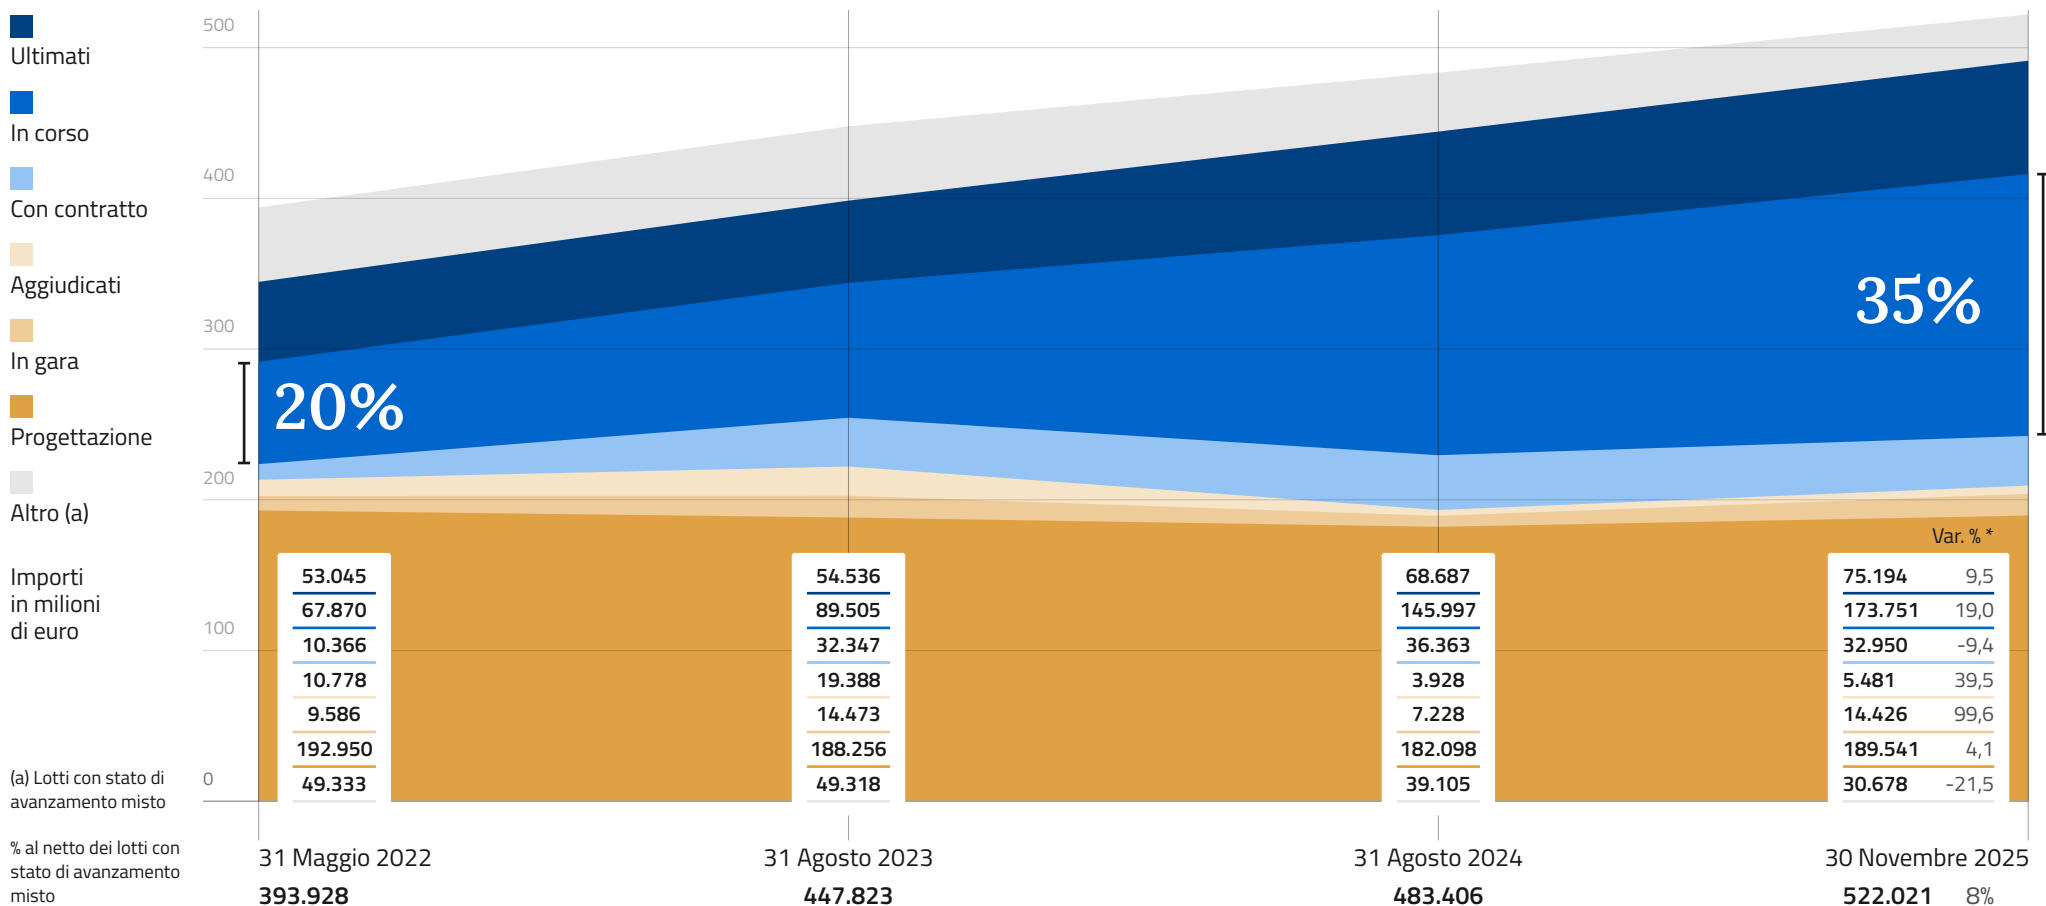


Costi, disponibilità e fabbisogno per macro area geografica

■ Disponibilità ■ Fabbisogno Importi in milioni di euro

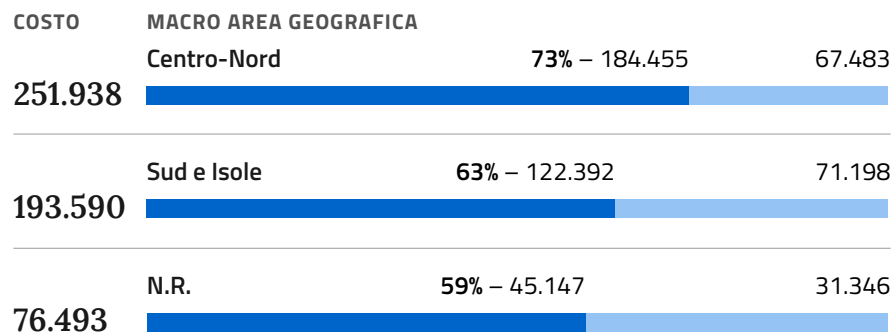

Composizione % sul totale nazionale

■ Centro-Nord ■ Sud e Isole Importi in milioni di euro

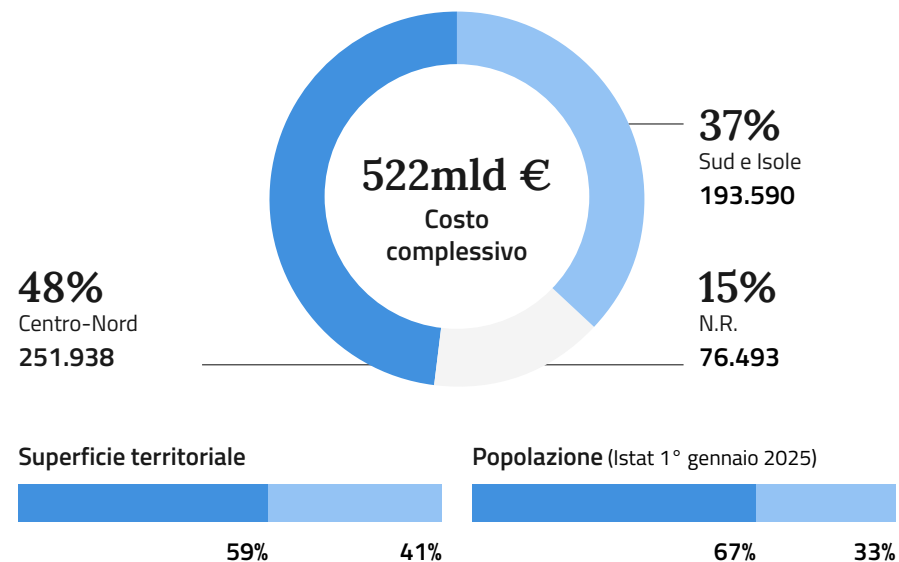



02

Infrastrutture commissariate
o inserite nella programmazione
PNRR-PNC

Costo opere commissariate o PNRR-PNC



I DATI

Valori in euro

522mld


Rilevazione 30/11/2025

210mld

Opere commissariate
o PNRR-PNC

40%

L'incidenza sul costo
complessivo

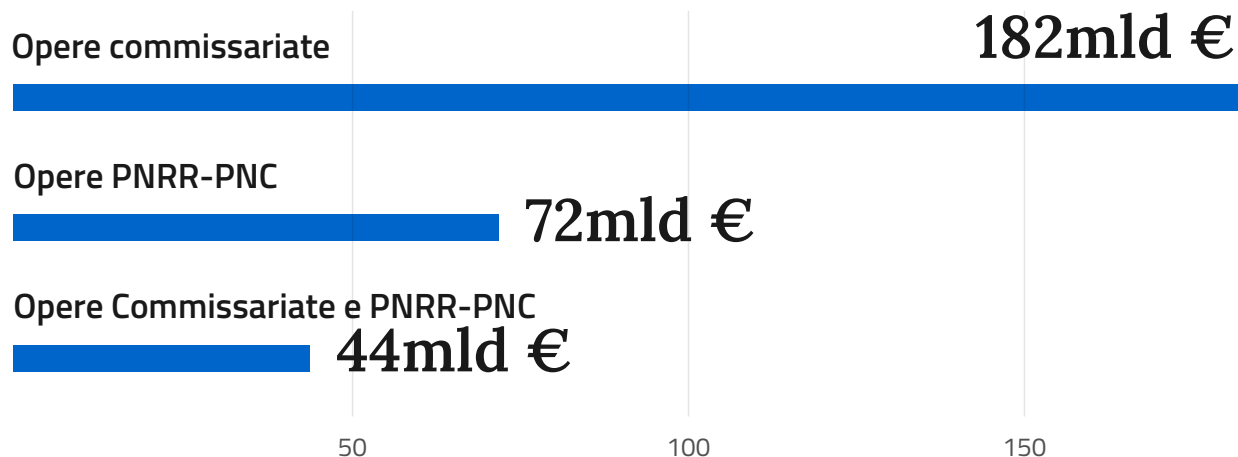

I DATI

Valori in euro

210mld

Opere commissariate
o PNRR-PNC

140mld

La disponibilità finanziaria
su 210 mld €

67%

La copertura finanziaria
al 30 novembre 2025

67%

Disponibilità ●
140.361

33%

● Fabbisogno
69.721

210mld €
Costo
complessivo

98%

Risorse pubbliche
137.024

2%

Risorse private
3.337

Fonte di
finanziamento

Importi
in milioni
di euro

Destinazione dei costi per settore



I DATI

Valori in euro


210mld

Opere commissariate
o PNRR-PNC

167mld

Ferrovie e strade

Importi
in milioni
di euro

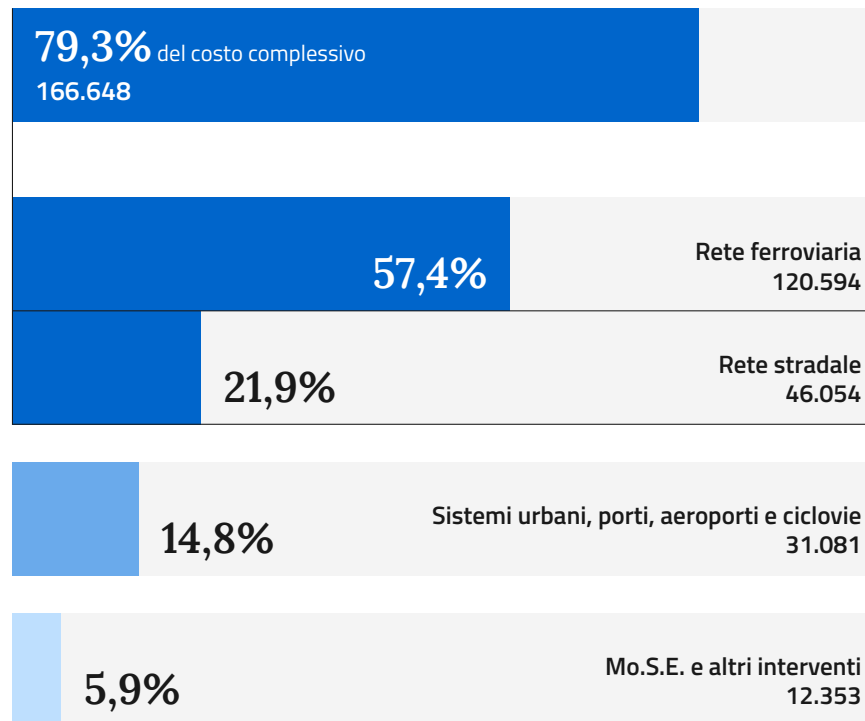

I DATI

Valori in euro

110mld

I lavori contrattualizzati*
al 30 novembre 2025

88%

Lavori in corso
sul totale
contrattualizzati*

* Lavori in corso o con contratto
non ancora avviati

Lavori ultimati

4.471

4.189 Commissariate; 922 per progetti PNRR-PNC

■ Commissariate

■ PNRR-PNC

■ 2,3%

■ 1,3%

Lavori in corso

96.180

73.486 Commissariate; 60.819 per progetti PNRR-PNC

■ 40,3%

■ 84,7%

Lavori con contratto sottoscritto e lavori da avviare

13.526

11.913 Commissariate; 3.899 per progetti PNRR-PNC

■ 6,5%

■ 5,4%

Lavori in gara o aggiudicati

7.725

7.577 Commissariate; 644 per progetti PNRR-PNC

■ 4,2%

■ 0,9%

Lavori in fase di progettazione da affidare

88.180

85.055 Commissariate; 5.540 per progetti PNRR-PNC

■ 46,7%

■ 7,7%

Importi in milioni di euro

Costi, disponibilità e stato di realizzazione per ambito territoriale



I DATI

Valori in euro

116mld


Localizzato
al Centro-Nord

92mld


Localizzato
al Sud e Isole

1,7mld

Interventi diffusi
sul territorio

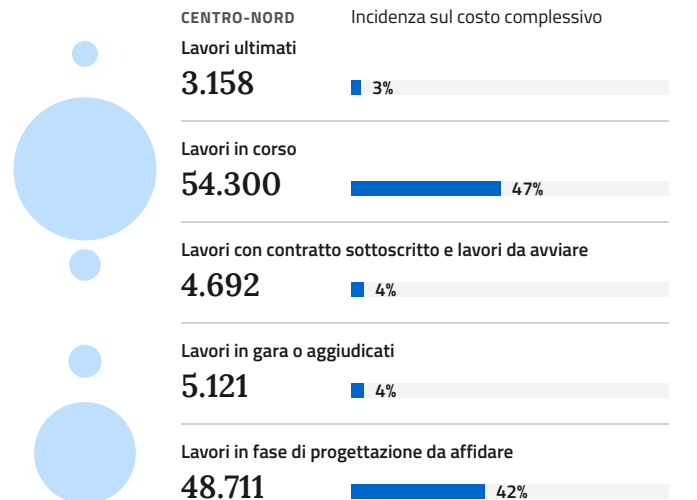

Importi in milioni di euro

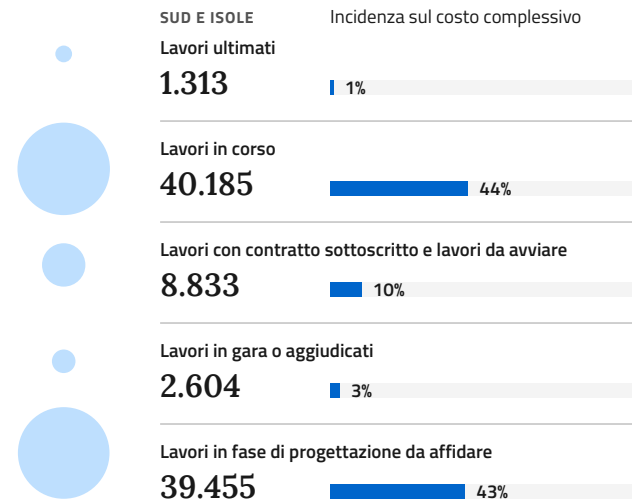

Le 10 grandi opere commissariate o PNRR-PNC



I DATI

Valori in euro

210mld

Opere commissariate
o PNRR-PNC


57,5mld

Il costo delle 10
grandi opere

27%

L'incidenza sul costo
delle opere commissariate
o PNRR-PNC

Incidenza % delle 10 opere sul totale

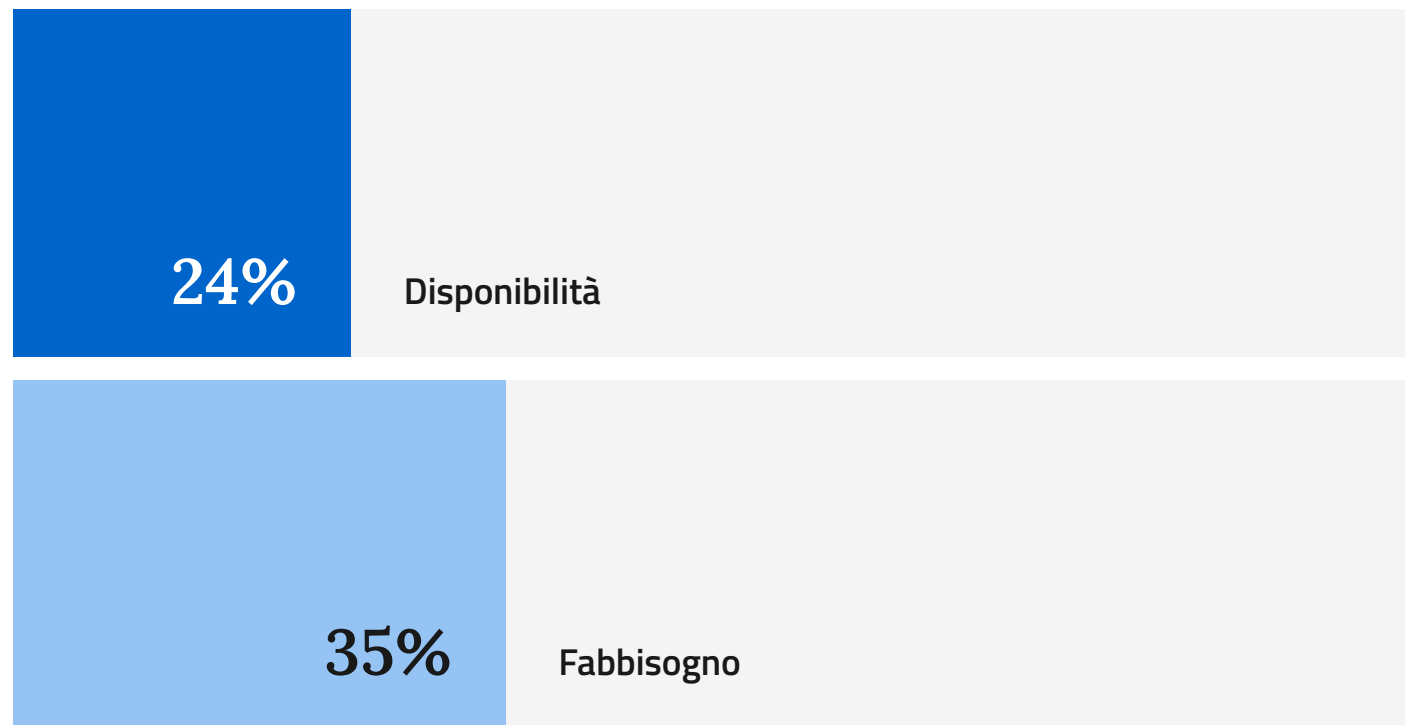

I tempi di realizzazione delle 10 grandi opere



N° Scheda / stato avanzamento	Opera / Lotto	Costo	Disponibilità	Fabbisogno	Data decisione CUP	Anno inizio lavori effettivo	Anno presunto fine lavori contratto iniziale	Anno ultimazione lavori al 30/11/2025	Durata totale anni (% avanzamento lavori)
280	AV/AC Salerno - Reggio Calabria - Fase prioritaria	17.486	12.089	5.397	2020			Oltre 2035	>15
In corso	Battipaglia-Romagnano (PNRR)	2.877	2.877	0	2020	2023	2026	2026	6 (15%)
Con contratto	Raddoppio Galleria Santomarco	2.127	2.127	0	2020	-	-	2032	12
Progettazione	Altri interventi	12.482	7.085	5.397	2020	-	-	Oltre 2035	>15
212	Itinerario AV/AC Palermo-Catania-Messina	12.677	10.582	2.095	2002			Oltre 2035	>33
Ultimati	Lotto 6 Catenanuova-Bicocca (PNRR)	638	638	0	2003	2018	2022	2025	22
In corso	Lotto 1+2 Fiumetorto-Montemaggiore-Lercara	1.946	1.792	154	2003	2023	2028	2029	26 (5%)
	Lotto 3 Lercara-Caltanissetta Xirbi	2.241	2.159	82	2003	2023	2028	2028	25 (10%)
In corso	Lotto 4a Caltanissetta Xirbi-Enna	1.708	1.583	124	2003	2023	2028	2028	25 (10%)
	Lotto 4b Enna-Dittaino (PNRR)	829	761	68	2003	2023	2026	2027	24 (15%)
	Lotto 5 Dittaino-Catenanuova	807	753	54	2003	2023	2028	2028	25 (10%)
	Raddoppio Giampileri-Fiumefreddo (PNRR)	2.365	2.324	41	2002	2022	2031	2032	30 (20%)
	Interramento tratta Acquicella-Bicocca per eliminazione interferenze con aeroporto	536	536	0	2003	2024	2027	2027	24 (15%)
Progettazione	Estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del Punto Franco Nuovo del porto di Trieste (PNC)	199	199	0	2021	-	-	Oltre 2035	>14

I tempi di realizzazione delle 10 grandi opere



N° Scheda / stato avanzamento	Opera / Lotto	Costo	Disponibilità	Fabbisogno	Data decisione CUP	Anno inizio lavori effettivo	Anno presunto fine lavori contratto iniziale	Anno ultimazione lavori al 30/11/2025	Durata totale anni (% avanzamento lavori)
276	Linea Roma-Pescara	8.498	1.058	7.440	2005			Oltre 2035	>30
4	Accesso al Brennero - Potenziamento linea Fortezza-Verona	7.707	2.972	4.735	2004			Oltre 2035	>31
59	Potenziamento e sviluppo direttrice Orte-Falconara	4.744	1.352	3.392	2002			Oltre 2035	>33
278	Potenziamento con caratteristiche di AV della direttrice ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto	1.716	396	1.320	2021			Oltre 2035	>14
247	Lazio - Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera	2.054	2.054	0	2017			2032	15
245	Porto di Genova - Diga Foranea di Genova	1.400	1.400	0	2018			2028	10
292	Campania - Invaso di Campolattaro (BN) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro	741	741	0	2020			2027	7
294	Porto di Trieste - Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway)	858	776	82	2020			Oltre 2035	>15



03

Altre infrastrutture strategiche
e prioritarie (non commissariate
o inserite nel PNRR-PNC)

I DATI


Valori in euro

312mld

Il costo delle altre
infrastrutture strategiche
prioritarie

68%

La copertura finanziaria
al 30 novembre 2025

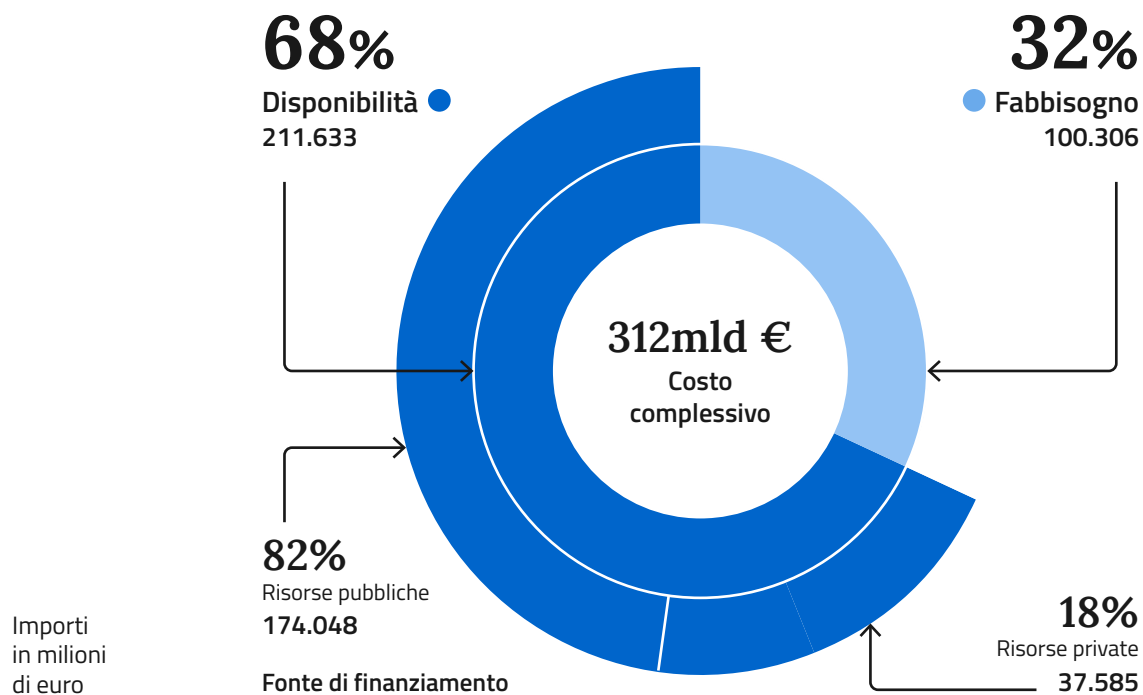

La destinazione dei costi per settore



I DATI

Valori in euro


312mld

Il costo delle altre
infrastrutture strategiche
prioritarie

250mld

Ferrovie e strade
e Ponte sullo Stretto

Importi
in milioni
di euro

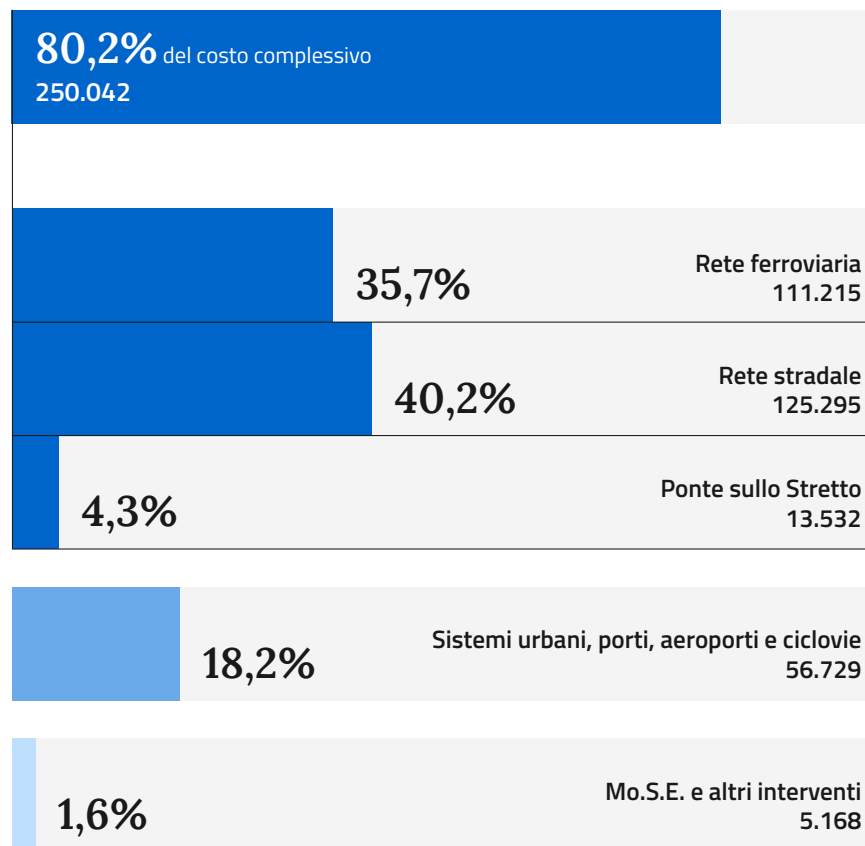

La disponibilità e il fabbisogno dei costi per settore




I DATI

L'incidenza della disponibilità
sul costo totale


49,1%
Ferrovie

75,7%
Strade

100%
Ponte sullo Stretto

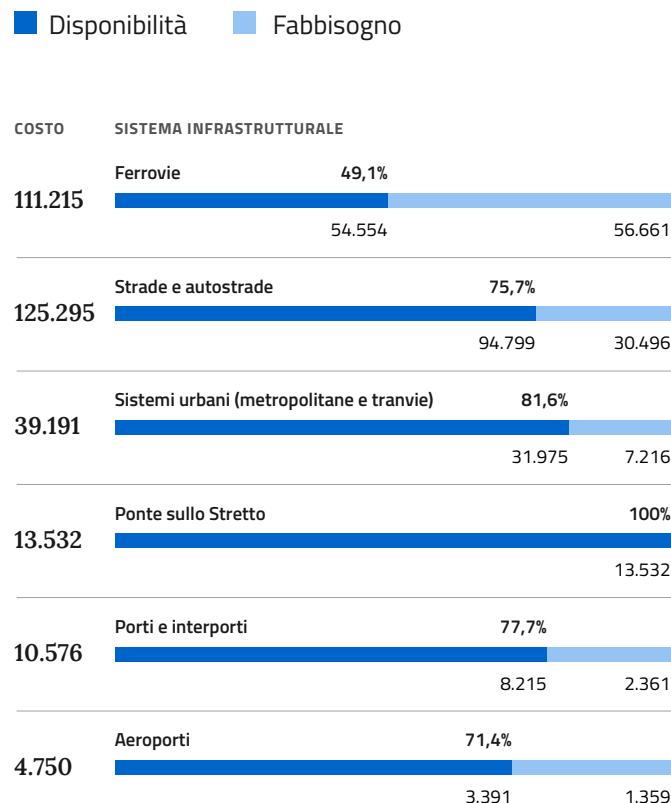

Importi in milioni di euro

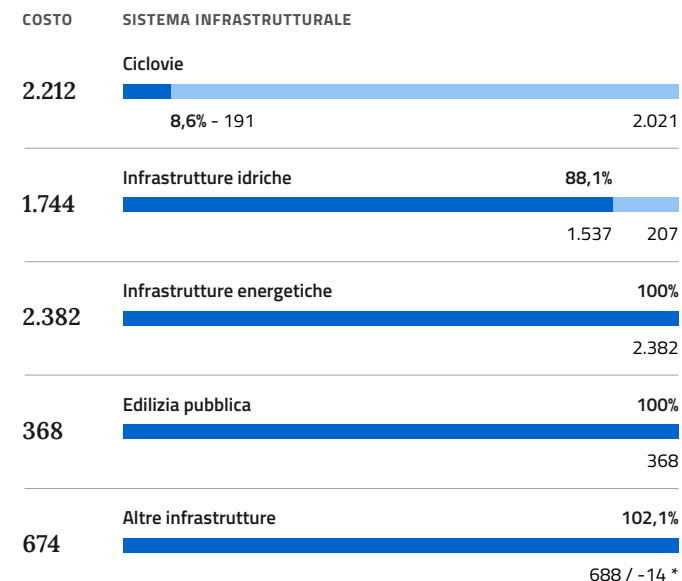

I DATI

Valori in euro

312mld

Il costo delle altre
infrastrutture strategiche
prioritarie

71mld

23%


I lavori ultimati

97mld

31%

I lavori
contrattualizzati*

* Lavori in corso o con contratto
non ancora avviati

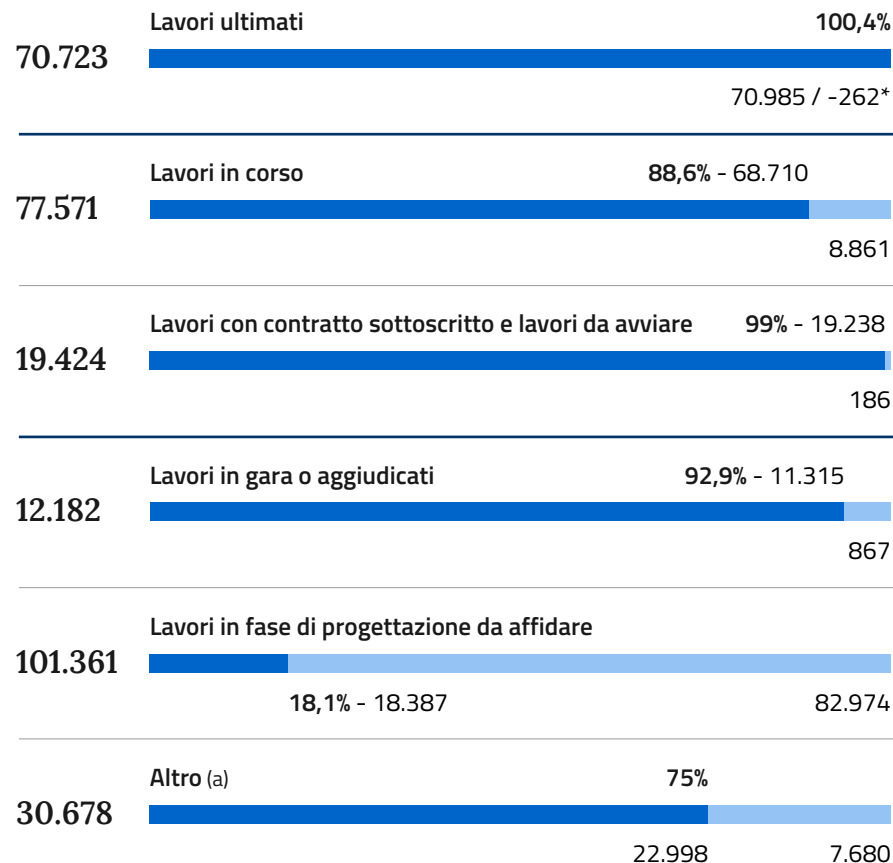

■ Disponibilità

■ Fabbisogno

Importi in milini di euro

Lo stato di realizzazione per ambito territoriale



I DATI


91%

Lavori in corso sul totale contrattualizzati* al Centro-Nord

35%

Lavori in corso sul totale contrattualizzati* al Sud e Isole

* Lavori in corso o con contratto non ancora avviati

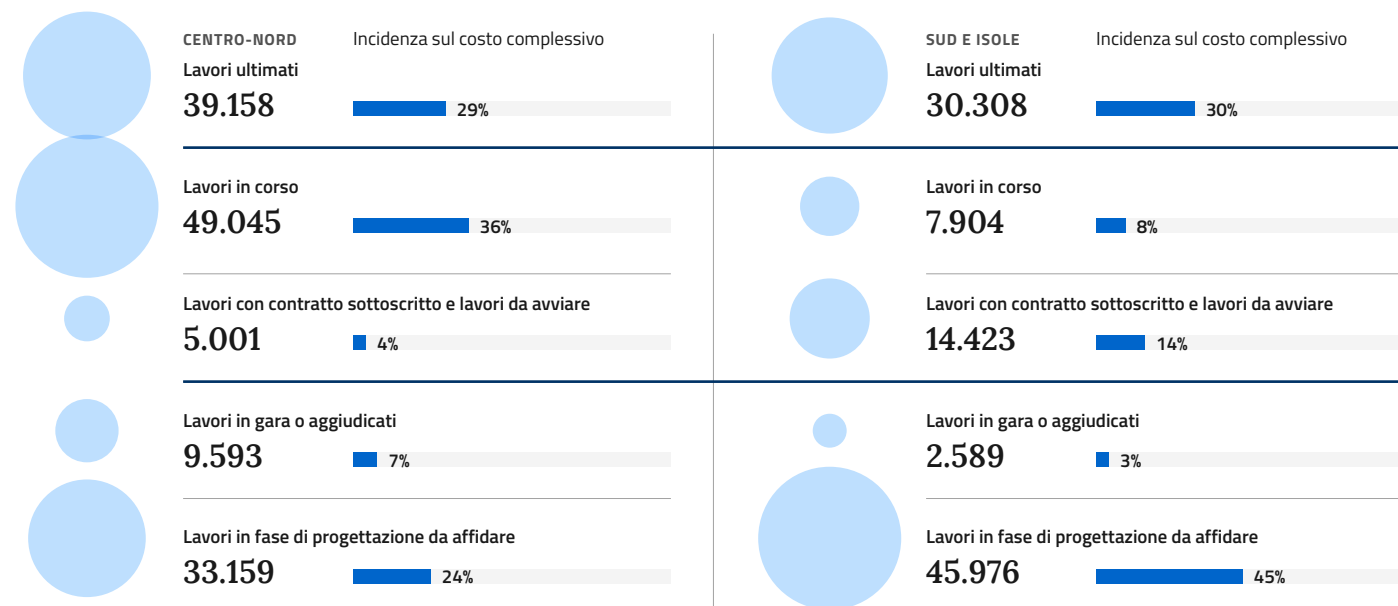

Importi in milioni di euro



04


Il mercato delle opere pubbliche
e l'impatto delle infrastrutture
strategiche e prioritarie

La crescita dei bandi e delle aggiudicazioni dei lavori pubblici




Importi in milioni di euro

BANDI

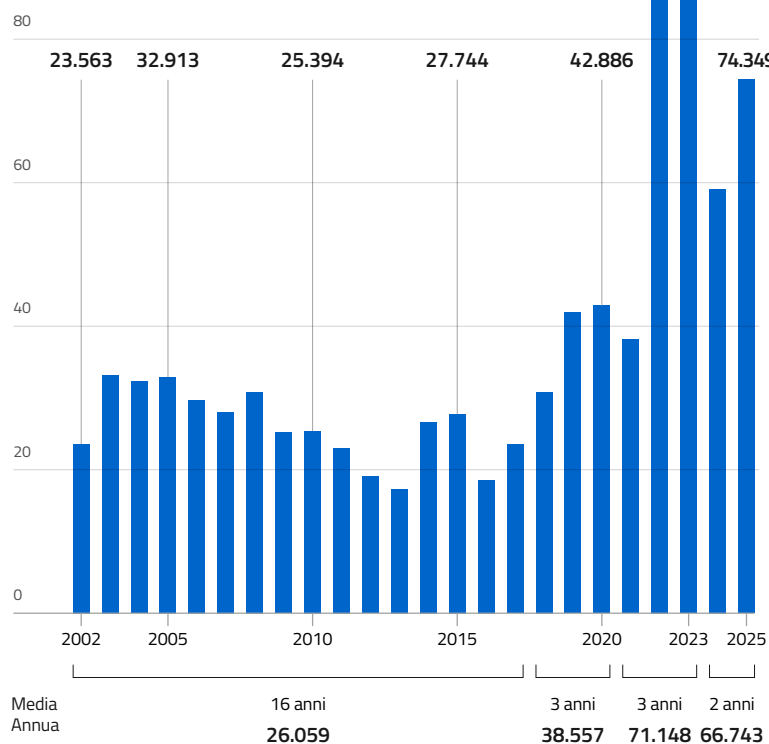

AGGIUDICAZIONI

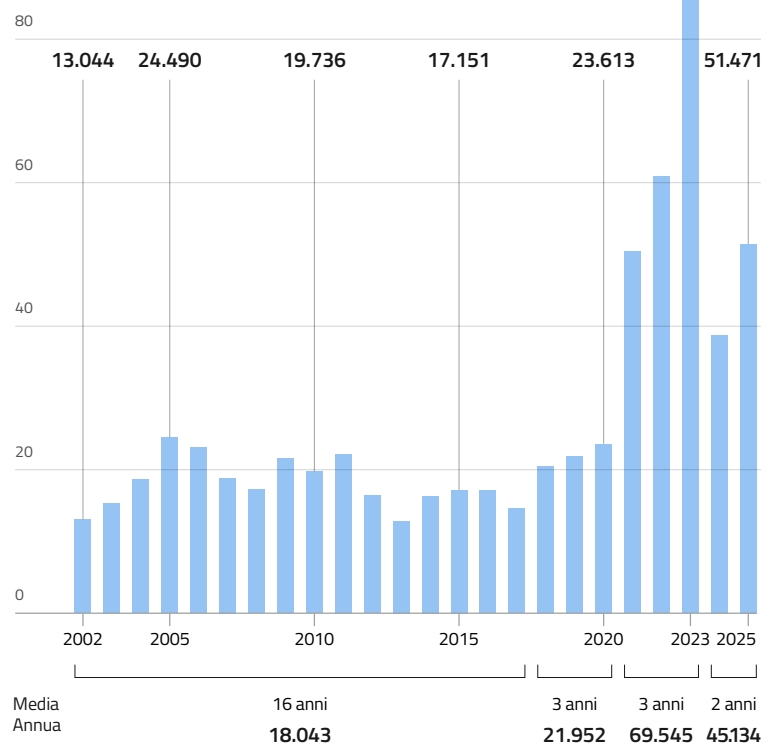

Importi delle aggiudicazioni per macro area geografica, 2021-2025



I DATI

Valori in euro

299mld

Costo dei lavori di OOPP aggiudicati, 2021-2025

24% (73mld)

Le infrastrutture strategiche e prioritarie

23%

Localizzato al Centro-Nord

40%

Localizzato al Sud e Isole

Composizione % sul totale nazionale del mercato OOPP


■ Centro-Nord

■ Sud e Isole

Importi in milioni di euro




Superficie territoriale




Popolazione (Istat 1° gennaio 2025)






Rapporti

Per scaricare i file PDF dei Rapporti annuali e dei Rapporti intermedi di sintesi e per consultare i documenti con il supporto di un assistente IA che facilita la navigazione dei contenuti e fornisce sintesi informative.



Banca dati opere

Per consultare i dati di sintesi di tutte le infrastrutture strategiche e prioritarie e i dati di dettaglio delle opere esaminate dal CIPESS, commissariate o contenute nell'elenco di cui all'Allegato IV (art. 44 del DL 77/2021).



Dati di sintesi

Per consultare i dati di sintesi mediante il supporto di strumenti e grafiche che facilitano la visualizzazione e la comprensione dei dati aggregati con l'ausilio di un assistente IA disponibile sul sito SILOS.
