


CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO

Accessibilità ferroviaria Malpensa

Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno - Variante di Galliate

SCHEDA N. 12

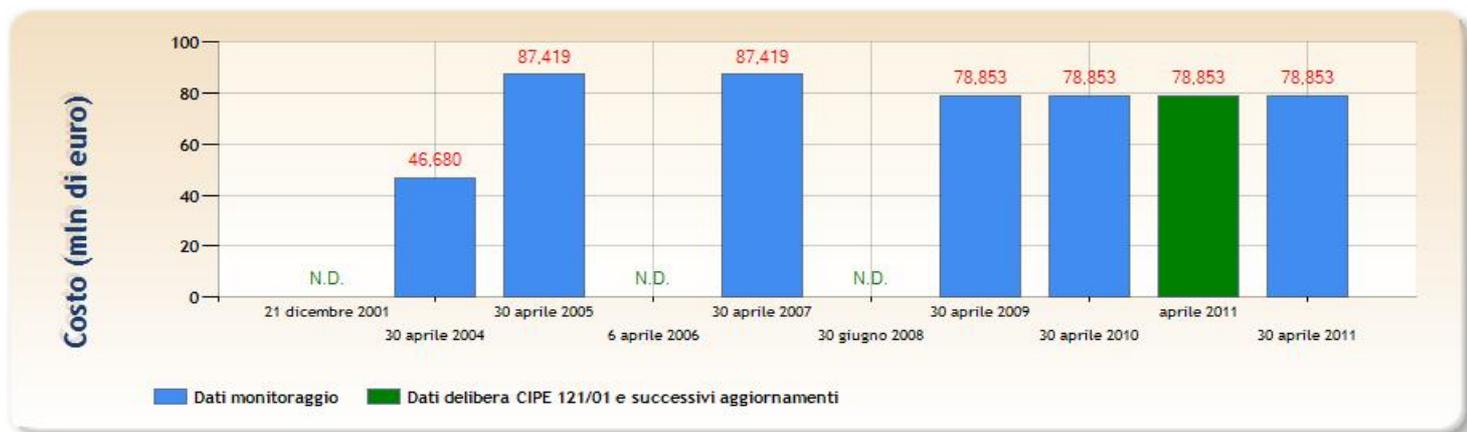

LOCALIZZAZIONE



CUP:

E11J0400000001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete ferroviaria

SOGGETTO TITOLARE:

Ferrovienord Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Progettazione preliminare

DELIBERE CIPE

21/2005

ULTIMAZIONE LAVORI

2013

DESCRIZIONE

L'intervento consiste nella realizzazione del potenziamento della tratta ferroviaria "Variante di Galliate", della linea Novara-Seregno, del collegamento diretto Torino-Malpensa e della tangenziale Ovest di Galliate. La tratta ferroviaria "variante di Galliate" interessa un tratto di 8,198 km compreso tra la stazione di Novara e il confine regionale e consiste:

- nel raddoppio della linea esistente, con previsione dell'inserimento, mediante bivio a raso, dei due binari della interconnessione alta velocità/alta capacità-Malpensa;
- nella costruzione della nuova sede per doppio binario (variante esterna di Galliate);
- nella realizzazione della nuova stazione di Galliate;
- in interventi di manutenzione ordinaria del binario esistente;
- nella deviazione del tracciato per la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Langosco, in affiancamento al ponte esistente;
- nella eliminazione dei passaggi a livello esistenti e delle interferenze nelle tratte in variante;
- nell'ammodernamento impiantistico della rete.

DATI STORICI

2000

Ferrovie Nord Milano Esercizio Spa (F.N.M.E.) è concessionaria della linea ferroviaria Novara-Turbigo e la relativa concessione viene prorogata, per la parte infrastrutture, fino al 2016.

2001

La linea Novara-Seregno è inclusa nella rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) prevista nel Piano generale dei trasporti approvato con DPR del 14 marzo 2001.

2003

L'intervento è compreso nell'Intesa Generale Quadro tra governo e regione Piemonte dell'11 aprile.

Il 10 giugno F.N.M.E. Spa - soggetto aggiudicatore - trasmette il progetto preliminare al MIT, ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali, alle regioni Piemonte e Lombardia, agli altri enti interessati e ai soggetti interferiti.

La Regione Piemonte esprime parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto sia ai fini dell'intesa sulla localizzazione sia per i profili di compatibilità ambientale e sulla valutazione di incidenza: Chiede anche l'avvio dello studio del raddoppio sulla tratta dal Km 6+747 al Km 7+922.

Il Ministero per i beni culturali esprime, in merito al SIA, parere favorevole con prescrizioni

2004

Il MIT trasmette agli enti interessati la bozza di protocollo di intesa sull'assetto ferroviario del nodo di Novara che include la "realizzazione del raccordo diretto tra l'asse alta velocità/alta capacità Torino-Milano, attraverso la interconnessione di Novara ovest, e la linea FNME Novara-Saronno, da utilizzare per relazioni dirette Torino-Malpensa".

Nel protocollo d'intesa del 28 luglio tra MIT-regioni Piemonte e Lombardia-provincia e comune di Novara- comune di Galliate-RFI-TAV S.p.a.-FNME-Autostrada Torino-Milano S.p.a, la realizzazione della variante di Galliate costituisce un tassello essenziale alla definizione dell'assetto del nodo ferroviario di Novara.

Il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria sul "potenziamento linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate", proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali.

2005

Il MIT trasmette al CIPE documentazione integrativa alla relazione istruttoria precedentemente inviata.

Il CIPE approva con prescrizioni il progetto preliminare del "potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate", con un costo dell'intervento pari a 43,1 Meuro, e fa presente che i progetti definitivi del raccordo diretto, attraverso l'interconnessione di Novara Ovest, con la linea FNME Novara-Saronno, da utilizzare per le

relazioni dirette Torino-Malpensa e della tangenziale Ovest di Galliate saranno esaminati contestualmente al progetto definitivo della "Variante di Galliate". La definizione della copertura del costo degli interventi è rimandata in sede di approvazione dei relativi progetti definitivi.

2006

Nell'allegato 2 alla delibera CIPE n. 130/2006 di rivisitazione del PIS, la "linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate" figura quale sub intervento dell'accessibilità ferroviaria Malpensa per il quale è intervenuta deliberazione del CIPE.

2007

Nel mese di ottobre Ferrovie Nord trasmette al MIT e alle amministrazioni interessate il progetto definitivo.

2008

Il 6 maggio il MIT convoca la CdS ove vengono acquisiti i pareri degli Enti interessati e/o interferiti.

2009

L'opera è compresa nel 1° Atto aggiuntivo IGQ governo e regione Piemonte, sottoscritto il 23 gennaio.

Il CIPE, con delibera n.10, prende atto dei contenuti della ricognizione sullo stato di attuazione del PIS al febbraio 2009, nonché della "Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009" del MIT. L'opera è compresa tra gli interventi dei sistemi ferroviari del Corridoio Plurimodale Padano, con un costo di 78,8 Meuro, interamente da finanziare.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Linea Novara Seregno. potenziamento e variante della tratta di Galliate" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013 "; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Linea Novara Seregno. potenziamento e variante della tratta di Galliate" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013 " ;"5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, si rileva che l'intervento si articola in tre sottoprogetti:

- potenziamento della linea Novara – Seregno nei territori di Novara e Galliate mediante raddoppio della linea per circa 7 km, dei quali 6,2 km in variante al tracciato attuale e i restanti con affiancamento del nuovo binario al binario esistente;
- collegamento diretto tra l'asse AV/AC Torino – Milano e la linea FN Novara – Seregno da utilizzare per relazioni dirette Torino – Malpensa;
- Tangenziale Ovest di Galliate.

E' disponibile il progetto definitivo dell'intero intervento ma non risulta approvato dal CIPE.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	46,680 Fonte: IGQ tra il Governo e la Regione Piemonte
Previsione di costo al 30 aprile 2005	87,419 Fonte: Delibera CIPE 21/2005
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	87,419 Fonte: Delibera CIPE 21/2005
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	78,853 Fonte: Delibera CIPE 10/2009

Previsione di costo al 30 aprile 2010	78,853 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	78,853 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	78,853 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	N.D. Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	0,000
	N.D. Fonte: DEF 2012-2014

Fabbisogno residuo:	78,853
----------------------------	---------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	<p>Le date di inizio e fine progettazione si riferiscono alla progettazione definitiva.</p> <p>L'importo lavori indicato è comprensivo degli oneri della sicurezza e della quota di progettazione esecutiva da appaltare.</p> <p>L'intervento consiste in tre sottoprogetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenziamento della linea Novara – Seregno nei territori di Novara e Galliate mediante raddoppio della linea per circa 7 km, dei quali 6,2 km in variante al tracciato attuale e i restanti con affiancamento del nuovo binario al binario esistente. - realizzazione del collegamento diretto tra l'asse AV/AC Torino – Milano e la linea FN Novara – Seregno da utilizzare per relazioni dirette Torino – Malpensa; - realizzazione della Tangenziale Ovest di Galliate. <p>L'importo lavori indicato si riferisce all'intervento nel suo complesso ovvero alla somma degli importi lavori dei tre progetti sopra indicati.</p>

Progettazione definitiva

CIPE:	No
Importo lavori:	64.484.513,83
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	1.406.000,00
Data inizio:	03/04/2005
Data fine:	13/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-
amministrativo:

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

IGQ tra il Governo e la Regione Piemonte del 11 Aprile 2003

Protocollo d'intesa tra il MIT, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Provincia di Novara, Comune di Novara, Comune di Galliate, Rete ferroviaria italiana (RFI), TAV Spa, FNME, Autostrada Torino – Milano Spa del 28 Luglio 2004

Delibera CIPE 21/2005 del 18 Marzo 2005

1° Atto aggiuntivo IGQ Governo e Regione Piemonte del 23 Gennaio 2009

Variante di Galliate

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Le date di inizio e fine progettazione e il costo indicato si riferiscono alla progettazione definitiva dell'intero intervento madre (CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO \ Accessibilità ferroviaria Malpensa \ Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno - Variante di Galliate) del quale la "Variante di Galliate" costituisce sottoprogetto. Alla data di compilazione della presente scheda non è possibile prevedere se il presente subprogetto conserverà o meno una propria autonomia rispetto all'intervento madre. Il successivo aggiornamento della presente scheda avverrà solo nel primo caso.

Progettazione definitiva

CIPE: No
Importo lavori: 37.350.752,95
Servizio: Interno
Costo progettazione interno: 1.406.000,00
Data inizio: 03/04/2005
Data fine: 13/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:

Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Tangenziale ovest di Galliate

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Le date di inizio e fine progettazione e il costo indicato si riferiscono alla progettazione definitiva dell'intero intervento madre (CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO \ Accessibilità ferroviaria Malpensa \ Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno - Variante di Galliate) del quale la "Tangenziale ovest di Galliate " costituisce sottoprogetto. Alla data di compilazione della presente scheda non è possibile prevedere se il presente subprogetto conserverà o meno una propria autonomia rispetto all'intervento madre. Il successivo aggiornamento della presente scheda avverrà solo nel primo caso.

Progettazione definitiva

CIPE: No
Importo lavori: 3.127.690,05
Servizio: Interno
Costo progettazione interno: 1.406.000,00
Data inizio: 03/04/2005
Data fine: 13/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Collegamento diretto tra l'interconnessione RFI di Novara Ovest e la linea FNME Novara-Malpensa

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Le date di inizio e fine progettazione e il costo indicato si riferiscono alla progettazione definitiva dell'intero intervento madre (CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO \ Accessibilità ferroviaria Malpensa \ Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno - Variante di Galliate) del quale la "Collegamento diretto tra l'interconnessione RFI di Novara Ovest e la linea FNME Novara-Malpensa" costituisce sottoprogetto. Alla data di compilazione della presente scheda non è possibile prevedere se il presente subprogetto conserverà o meno una propria autonomia rispetto all'intervento madre. Il successivo aggiornamento della presente scheda avverrà solo nel primo caso.

Progettazione definitiva

CIPE: No
Importo lavori: 24.006.070,83
Servizio: Interno
Costo progettazione interno: 1.406.000,00
Data inizio: 03/04/2005
Data fine: 13/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI
