


SISTEMI URBANI

Accessibilità metropolitana Fiera di Milano

Prolungamento della linea metropolitana M1 dall'attuale terminale di Molino Dorino al nuovo polo fieristico di Pero-Rho compresa l'acquisizione di materiale rotabile (13 treni)

SCHEMA N. 90

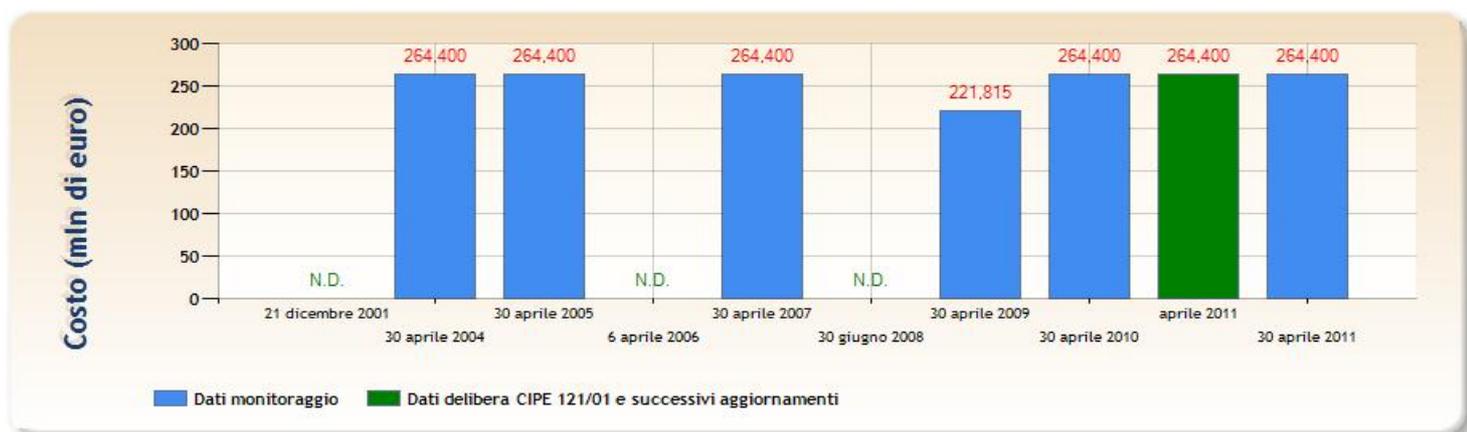

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Ferrovie metropolitane

Comune di Milano/ATM Spa -
Azienda Trasporti Milanese

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori conclusi

DELIBERE CIPE

22/2003
97/2005

ULTIMAZIONE LAVORI

2009

DESCRIZIONE

Il prolungamento della metropolitana M1 dall'attuale terminale di Molino Dorino al nuovo polo fieristico di Pero-Rho si sviluppa per circa 2,1 Km sul territorio dei Comuni di Pero (stazione intermedia) e di Rho (stazione capolinea "Rho Fiera SFR-AC") ed assolverà alle funzioni di accesso al polo fieristico, di interscambio con il servizio ferroviario regionale e con il sistema ferroviario "Alta Velocità/ Alta Capacità", oltre che con il trasporto pubblico e privato su gomma. L'intervento include l'acquisizione di 13 treni con specifiche caratteristiche tecniche.

DATI STORICI

2001

La Delibera CIPE n. 121 include, nell'ambito dei sistemi urbani, interventi di "accessibilità metropolitana Fiera di Milano" e di "accessibilità Fiera di Milano".

2002

Metropolitana Milanese Spa pubblica il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'infrastruttura con un importo stimato di 122,155 Meuro, soggetto a ribasso.

2003

L'intervento viene aggiudicato ad un costo di 94,167 Meuro.

In aprile viene stipulata tra il MIT e la Regione Lombardia un'IGQ per regolare e coordinare le attività relative alle infrastrutture strategiche del PIS. Nell'IGQ l'opera è inclusa tra gli interventi prioritari e i finanziamenti per il prolungamento della metropolitana (compreso il materiale rotabile e il parcheggio di interscambio), previsti a carico delle risorse della L. 166/02, vengono articolati in modo differenziato rispetto alle previsioni di spesa nel triennio 2002-2004 della delibera n. 121, in quanto sull'opera vengono concentrate le risorse recate dalle leggi finanziarie 2001 e 2002.

Il MIT trasmette la relazione istruttoria aggiornata dell'opera "accessibilità metropolitana Fiera di Milano", proponendo l'assegnazione di un finanziamento di 110,283 Meuro a carico dei fondi della L. 166/02.

Il CIPE prende atto che all'opera sono stati destinati 148,4 Meuro con apposito AdP e che il finanziamento proposto a carico dei fondi ex L. 166/02 vale ad integrare la copertura dell'intervento complessivo (in particolare l'acquisizione del materiale rotabile), che la Regione Lombardia si è impegnata a garantire il finanziamento di 5,717 Meuro per integrare l'onere di acquisizione, e assegna un contributo di 110,283 Meuro all'intervento e individua nel Comune di Milano il soggetto aggiudicatore.

2004

Il 14 settembre la Giunta del Comune di Milano affida il ruolo di soggetto aggiudicatore per l'intervento "accessibilità metropolitana Fiera di Milano" ad A.T.M. Spa, società controllata al 100% dal Comune di Milano. In particolare, alla Società è attribuito l'incarico di definire i capitolati di fornitura, di effettuare la gara per la scelta del fornitore, il controllo/collaudato dei veicoli e di assumere il relativo mutuo passivo.

In ottobre la Direzione Centrale ambiente e mobilità del Comune di Milano integra il provvedimento deliberativo prevedendo un numero "minimo" di 11 treni da acquisire.

2005

Il MIT, con nota del 26 luglio, trasmette al CIPE la richiesta avanzata dal Comune di Milano per trasferire la funzione di soggetto aggiudicatore all'A.T.M. Spa, affidataria del servizio di trasporto pubblico locale, e per utilizzare la somma assegnata dal CIPE con la citata delibera n. 22 del 2003 per il finanziamento di 13 treni anziché degli 11 a suo tempo

ipotizzati, in quanto il rinnovato sistema di segnalamento, nel frattempo approvato, ha incrementato del 25% la capacità di trasporto della linea.

Il CIPE, con delibera n. 97 del 29 luglio, accoglie la richiesta del Comune di Milano e individua nell'A.T.M. Spa il nuovo soggetto aggiudicatore per l'intervento "accessibilità metropolitana Fiera di Milano" e, in particolare, per l'acquisizione del materiale rotabile.

Il 14 settembre l'intera linea Molino Dorino-Rho Pero Fiera viene aperta in via continuativa all'esercizio.

2006

L'opera è contemplata dalla Delibera CIPE n.130 di rivisitazione del PIS.

2009

L'intervento "accessibilità metropolitana Fiera di Milano" è contemplato dalla delibera CIPE n. 10 del 6 marzo di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Milano prolungamento della linea Metropolitana M1+ materiale Rotabile - 13 unità di trazione" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Milano prolungamento della linea Metropolitana M1+ materiale Rotabile - 13 unità di trazione" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	264,400 Fonte: Delibera CIPE 22/2003
Previsione di costo al 30 aprile 2005	264,400 Fonte: Delibera CIPE 22/2003
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	264,400 Fonte: Delibera CIPE 22/2003
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	221,815 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	264,400 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	264,400 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	264,400 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	264,400 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	264,400
Regione Lombardia	5,720 Fonte: DPEF 2010-2013
Fondi Legge Obiettivo	110,280 Fonte: DPEF 2010-2013
Fondi Pubblici	148,400 Fonte: DPEF 2010-2013

Fabbisogno residuo:

0,000

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo:**Note:**

Il prolungamento della linea metropolitana M1 da Molino Dorino alla stazione di Rho Fiera è entrato in esercizio in data 14/09/2005. Il 19/12/2005 è stata aperta la stazione intermedia di Pero. Siamo in attesa di conoscere da Metropolitana Milanese (ing. Broglia - ing. Venza) le date precise da inserire in questa sezione della scheda.

Contenzioso:**Totale riserve definite:****Importo totale riserve definite:****Totale riserve da definire:****Note:****Sospensione lavori:****Numero totale:****Totale giorni sospensione:****Note:****Varianti:****Numero totale:****Giorni proroga totali:****Motivi:****Altri motivi:****Importo:****Importo oneri sicurezza:****Somme a disposizione:**

Totale: 0,00

Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

IGQ tra MIT e Regione Lombardia del Aprile 2003

Delibera CIPE 22/2003 del 27 Giugno 2003

Delibera di Giunta del Comune di Milano n. P.G. 929175/2004 del 14 Settembre 2004

Delibera CIPE 97/2005 del 29 Luglio 2005
