


SCHEMI IDRICI

ABR - Potenziamento Acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo 1° lotto funzionale

SCHEDA N. 151

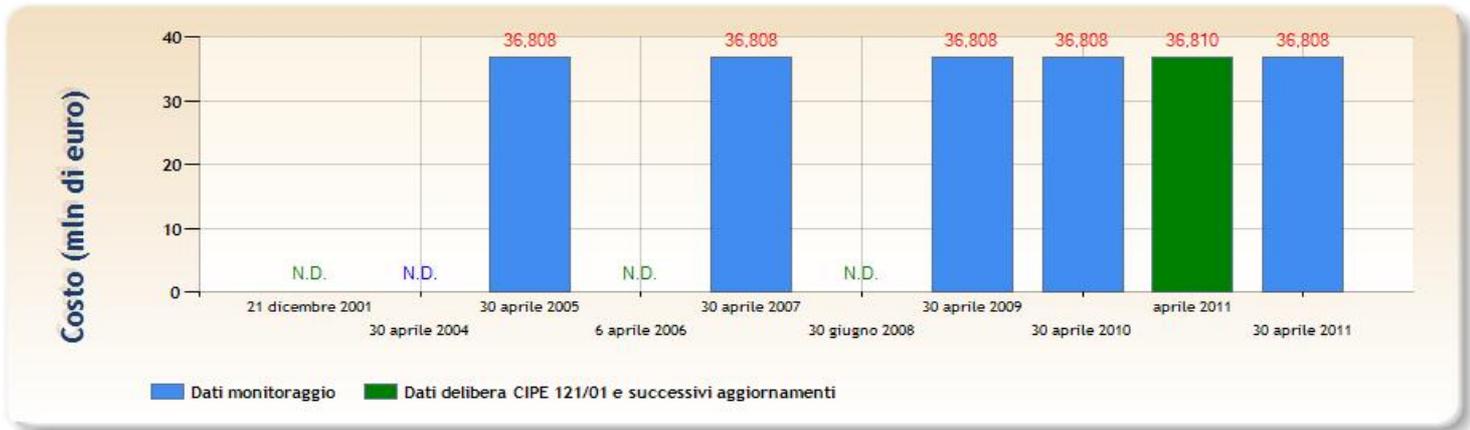

LOCALIZZAZIONE



CUP:

C47H04000030001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Regione Abruzzo

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori conclusi

DELIBERE CIPE

47/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

2009

DESCRIZIONE

L'opera riguarda: l'ampliamento dell'impianto di potabilizzazione del Vomano, mediante il raddoppio della capacità di trattamento da 730 l/sec a 1.460 l/s; l'opera di presa delle acque del Vomano dall'invaso di Piaganini in sostituzione di quelle sulla condotta forzata ENEL; la condotta di adduzione dall'invaso Piaganini all'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano; il prolungamento dell'adduttrice in uscita del potabilizzatore dal nodo di interconnessione con la condotta del Gran Sasso (nodo Basciano) fino alla località Villa Vomano; la condotta premente dall'impianto di sollevamento di Villa Vomano al partitore Tordino; la condotta di collegamento dal partitore Tordino all'alimentazione per Teramo e al partitore Colle Urania; l'impianto di sollevamento al nodo di S. Cipriano.

DATI STORICI

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra gli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Abruzzo.

2002

L'intervento è compreso nell'intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Abruzzo del 20 dicembre.

2003

In data 11 agosto la Regione Abruzzo pubblica l'avviso di avvio del procedimento di pubblica utilità.

La Regione Abruzzo, ai fini della VIA, esprime parere favorevole sul progetto definitivo.

Il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (CTAR) della Regione rilascia parere favorevole all'approvazione del progetto, per l'importo complessivo di 36,8 Meuro.

Il MIT convoca la CdS in data 9 dicembre.

2004

La Giunta regionale indica come soggetto aggiudicatore la Giunta Regionale d'Abruzzo, Direzione Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale ed aree urbane – Ciclo idrico integrato e reti tecnologiche protezione civile.

Il MIT definisce il costo complessivo dell'intervento proposto in 36,8 Meuro, IVA inclusa.

Il MIT, con nota del 9 settembre, conferma quale soggetto aggiudicatore la Giunta Regionale d'Abruzzo.

Il CIPE, con delibera n. 47, prende atto delle risultanze dell'istruttoria e in particolare del nulla osta di massima, con prescrizioni, degli Enti interessati per le interferenze. La modalità di affidamento dei lavori è la licitazione privata, come richiesto dal soggetto aggiudicatore. Approva quindi il progetto definitivo e assegna alla Regione Abruzzo l'importo complessivo di 36,8 Meuro euro a valere sulla legge n. 166/2002 (22,4 Meuro nel 2005 e 14,4 nel 2006).

2005

La società Ruzzo Reti Spa, in data 6 settembre, pubblica il bando di gara per l'affidamento dell'opera per un importo complessivo a base di gara di 27,4 Meuro.

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2006

In data 28 ottobre, la società Ruzzo Reti Spa aggiudica i lavori di potenziamento dell'acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo ad un prezzo di 25,7 Meuro all'ATI composto da Società Italiana Condotte d'Acqua Spa e Consorzio Cooperative Costruzioni.

2008

Il Rapporto "Infrastrutture Prioritarie" del MIT riporta l'opera, segnalando l'apertura dei cantieri.

2009

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

In data 28 maggio viene sottoscritto l'Atto aggiuntivo all'IGQ Regione Abruzzo.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Potenziamento acquedotto del Ruzzo - lotto 1" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture alla DEF 2012-2014 l'opera "Potenziamento acquedotto del Ruzzo - lotto 1" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo).

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	36,808 Fonte: Delibera CIPE 47/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	36,808 Fonte: Delibera CIPE 47/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	36,808 Fonte: Delibera CIPE 47/2004
Previsione di costo al 30 aprile 2010	36,808 Fonte: Delibera CIPE 47/2004
Costo ad aprile 2011	36,810 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	36,808 Fonte: Delibera CIPE 47/2004

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	36,810 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	36,808
Fondi Legge Obiettivo	36,808 Fonte: Delibera CIPE 47/2004

Fabbisogno residuo:	0,000
----------------------------	--------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	NON E' STATA EFFETTUATA LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE. LA PROGETTAZIONE E' STATA EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE ALL'ING. GIAMBUZZI, DIPENDENTE DELLA RUZZO RETI S.P.A.

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	27.422.684,82
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	0,00
Importo di aggiudicazione:	0,00
Nome aggiudicatario:	ing. GIANCARLO CAROLI
Codice fiscale aggiudicatario:	CRL GCR 48T14 A5
Data inizio:	20/11/2002

Data fine: 01/04/2004

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ruzzo Reti Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 16 mesi
Lavori: 25 mesi
Data bando: 06/09/2005
CIG/CUI: CUP C47H04000030001
Data aggiudicazione: 28/10/2006
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A./C.C.C.
Codice fiscale aggiudicatario: 00481000586
Data contratto: 18/12/2006

Quadro economico:

Importo a base gara: 26.882.766,88
Importo oneri per la sicurezza: 539.917,94
Importo complessivo a base di gara: 27.422.684,82
Importo aggiudicazione: 25.702.679,88
Somme a disposizione: 11.105.542,12
Totale: 36.808.222,00
% Ribasso di aggiudicazione: 6,40
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 29/01/2007
Data presunta fine lavori: 28/02/2009
Stato avanzamento importo: 26.593.536,81
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 26/03/2007
Data effettiva fine lavori: 21/07/2009
Data presunta fine lavori varianti: 21/07/2009
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 29/06/2010
Data collaudo tecnico-amministrativo: 12/11/2010
Note: E' stata inserita la data dell'ultima opera in c.a. collaudata

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire: 18
Note: E' in corso arbitrato

Sospensione lavori:

Numero totale:	1
Totale giorni sospensione:	19
Note:	Motivo sospensione terremoto Abruzzo del 6 aprile 2009

Varianti:

Numero totale:	4
Giorni proroga totali:	125
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. d) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. e) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	
Importo:	26.594.170,81
Importo oneri sicurezza:	558.631,53
Somme a disposizione:	9.655.419,66
Totale:	36.808.222,00
Note:	

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

IGQ tra Governo e Regione Abruzzo del 20 Dicembre 2002

Giudizio n. 276/2003 Comitato di Coordinamento Regionale dell'Abruzzo.
del 2003

Avviso Regione Abruzzo del 11 Agosto 2003

CTAR Regione Abruzzo voto n. 14 del 28 Ottobre 2003

Delibera di Giunta Regionale Abruzzo 244/2004
del 2004

Delibera CIPE 47/2004

del 29 Settembre 2004

Bando di Gara del Settembre 2005

Esito di gara del Ottobre 2006

Atto aggiuntivo all'IGQ Regione Abruzzo del 28 Maggio 2009
