Camera dei Deputati
Commissioni riunite 8^ e 9^
Ing. Nicola Montesano

DATA 03.02.2021

anas
GRUPPO FS ITALIANE

SINTESI INTERVENTO

NOME OPERA	***NA288 - S.S. 212 "della Val Fortore"*** ***Lavori di completamento dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. - 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio.***
REGIONE	CAMPANIA
DESCRIZIONE INTERVENTO	L'intervento complessivo prevede la realizzazione di un collegamento con caratteristiche assimilabili ad una strada di categoria C1 del DM 2001, lungo la direttrice "Appulo-Fortorina", tra S. Marco de Cavoti e S. Bartolomeo in Galdo, collegando la Campania alla Puglia. L'intero itinerario ha uno sviluppo complessivo pari a circa 33 km e la sua realizzazione prevede un investimento complessivo di circa 508 M€. Il primo lotto realizza la variante all'abitato di San Marco dei Cavoti, in continuità con il tratto precedente della Variante alla S.S. 212 "del Fortore" realizzata da ANAS ed è diviso in 3 stralci. Il secondo stralcio è in corso l'esecuzione dell'opera (NA287) mentre oggetto del presente intervento sono lo stralcio 1 e lo stralcio 3.
INVESTIMENTO	L'importo progettuale è pari a 53,97 M€.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Intervento inserito nell'aggiornamento del Contratto di Programma 2016-2020.

SINTESI INTERVENTO

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO	Nel 2009, Anas insieme alla Regione Campania ed alla Provincia di Benevento hanno sottoscritto una Convenzione con "l'obiettivo in forma coordinata e sinergica di realizzare un programma operativo per l'individuazione e consequenziale realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità dell'area del Fortore". Nel primo lotto rientrano gli interventi di NA287 (1° lotto - 2° stralcio) e NA288 (1° lotto – 1° e 3° stralcio), in origine i due interventi erano unificati come NA232. Il 1° lotto 1° stralcio, prevede un tracciato in variante all'attuale sede stradale, variante di 1,5 km, prevalentemente in rilevato con la realizzazione di un sottovia di 120 m ed una rotatoria di raccordo all'attuale S.S.212 Var, già condiviso con il Comune di San Marco dei Cavoti ed inserito agli atti approvativi del progetto definitivo del secondo stralcio primo lotto. La piattaforma stradale prevista è una categoria stradale di tipo C secondo il D.M. 05/11/2001. In aggiunta è stato inserito un chilometro di adeguamento della S.S.212 Var esistente. Il 1° lotto 3° stralcio, venne inserito durante le fasi della CdS decisoria tenutasi presso il MIT per approvare il progetto definitivo del 2° stralcio. Questo stralcio difatti si inserisce come opera compensativa, del 2°stralcio 1°lotto. Da un punto di vista tecnico il 3° stralcio però ha delle criticità realizzative ed economiche dovute al fatto che l'area su cui ricade è interessata da un forte dissesto idrogeologico, per cui l'opera di scavalco da realizzarsi, presenta dei costi molti elevati.

SINTESI INTERVENTO

ATTIVITA' IN CORSO	Il progettista individuato per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva è l'aggiudicatario dell'AQ DG26/17 L7 (PROGIN SpA). L'avvio della progettazione è stato dato il 30.10.2020. Con riferimento al 1° stralcio, sono già stati effettuati rilievi plano-altimetrici e indagini e sono altresì disponibili da precedenti elaborazioni da aggiornare: uno studio geologico, le relative indagini geo-meccaniche e geognostiche, lo Studio di Impatto Ambientale e la relazione Archeologica. Il progettista ha già stilato il piano indagini sia geomeccanico che di caratterizzazione ambientale. Per il terzo stralcio invece sono state già individuate tre alternative di tracciato ed è stato elaborato un pacchetto di fattibilità tecnico ed economica.
PROCEDURA AUTORIZZATIVA	Intervento in procedura ordinaria

SINTESI INTERVENTO

INQUADRAMENTO INTERVENTO	*Planimetria 1° Lotto 1° Stralcio*

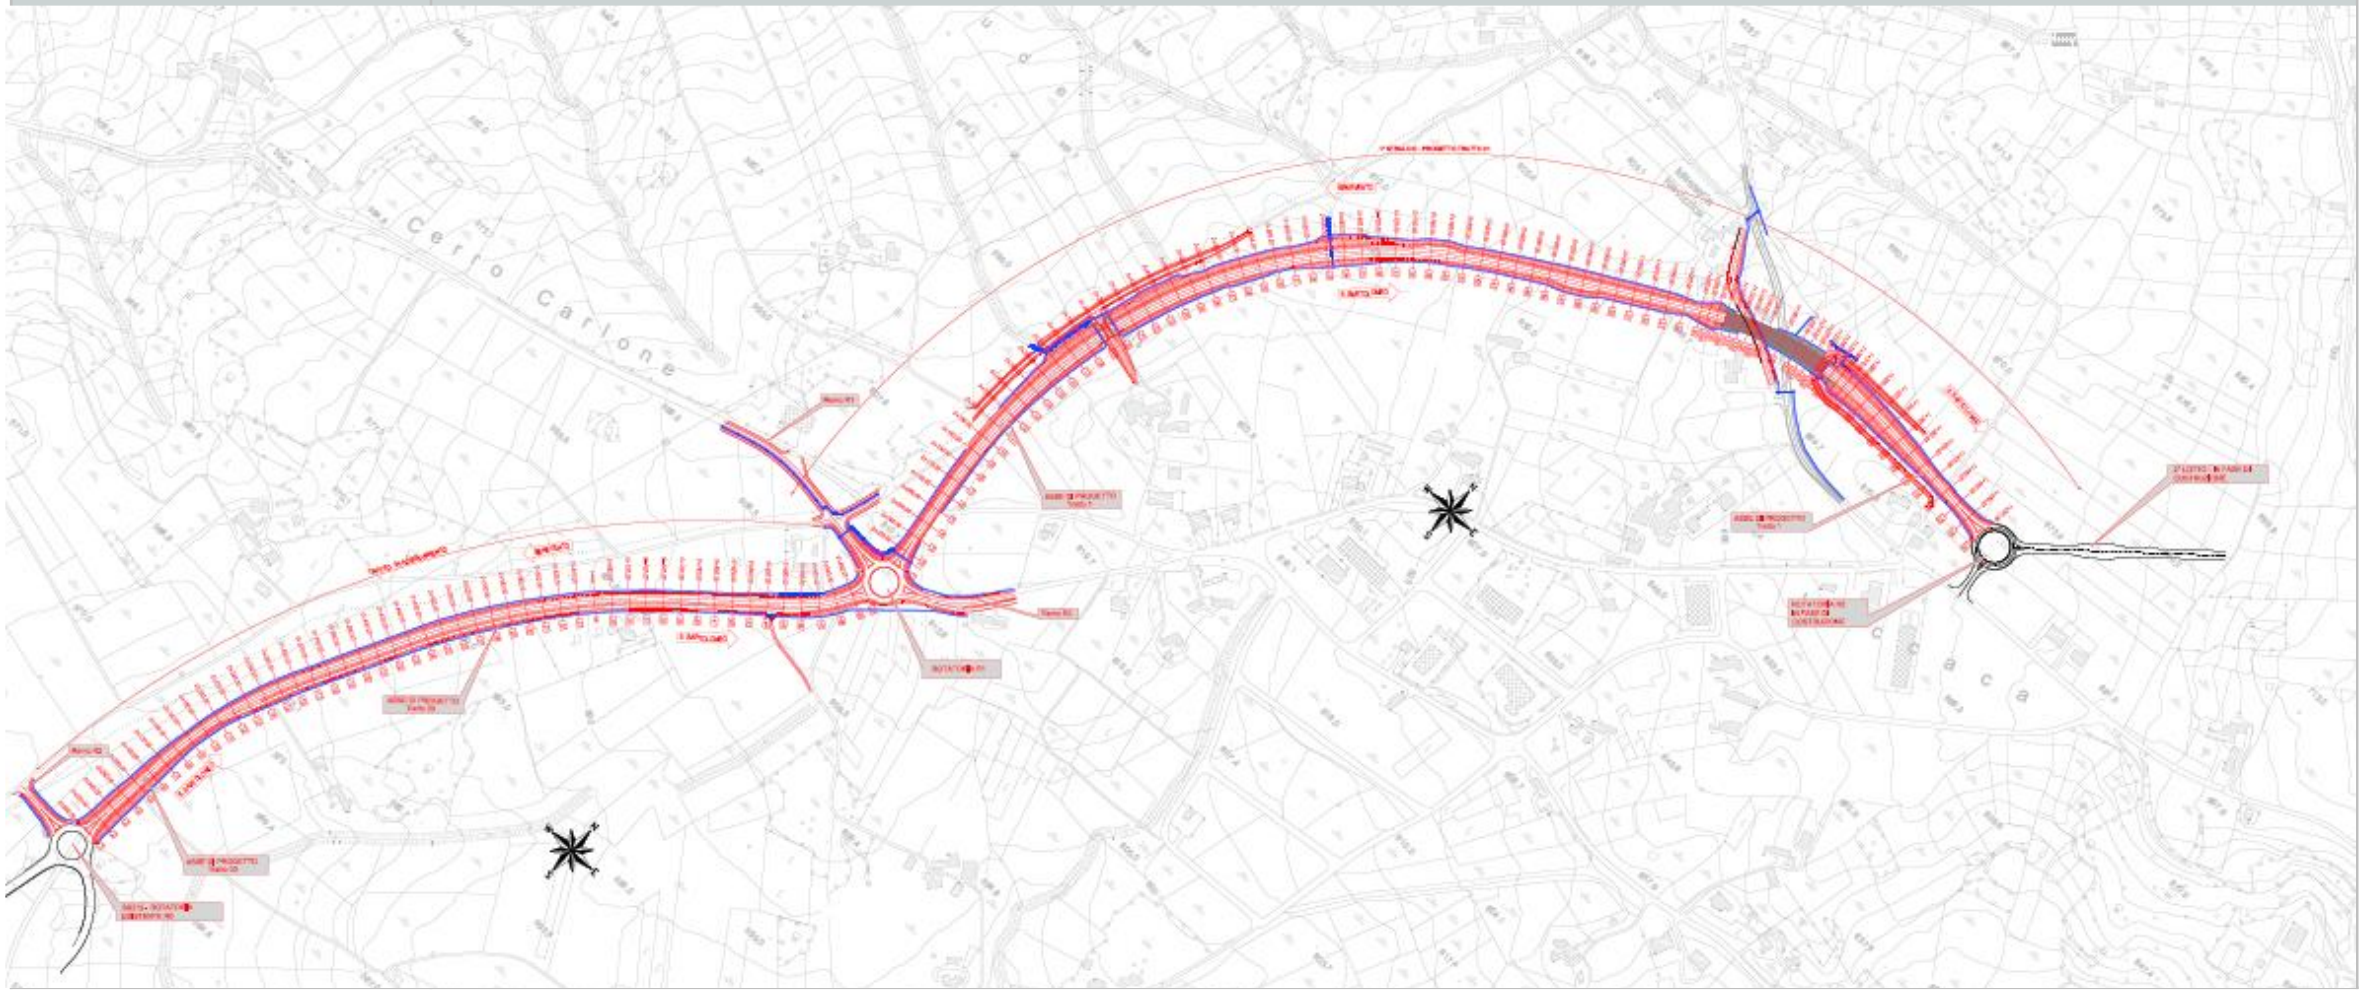

SINTESI INTERVENTO

NOME OPERA	**NA233 - S.S. n. 212 “della Val Fortore”** Lavori di completamento dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. - 2° lotto «Variante all’abitato di S. Bartolomeo in Galdo».
REGIONE	CAMPANIA
DESCRIZIONE INTERVENTO	L’intervento complessivo prevede la realizzazione di un collegamento con caratteristiche assimilabili ad una strada di categoria C1 del DM 2001, lungo la direttrice “Appulo-Fortorina”, tra S. Marco de Cavoti e S. Bartolomeo in Galdo, collegando la Campania alla Puglia. L’intero itinerario ha uno sviluppo complessivo pari a circa 33 km e la sua realizzazione prevede un investimento complessivo di circa 508 M€. Il secondo lotto realizza la variante all’abitato di San Bartolomeo in Galdo il cui sviluppo è pari a circa 10 km, comprensivi di due gallerie per un totale di 590 mt, e cinque viadotti per un totale di 650 mt.
INVESTIMENTO	L’importo progettuale è pari a 102,79 M€.
FONTE DI FINANZIAMENTO	L’intervento è inserito nel Contratto di Programma 2016-2020, come intervento programmato ma non finanziato.

anas
GRUPPO FS ITALIANE

SINTESI INTERVENTO

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO	Nel 2009, Anas insieme alla Regione Campania ed alla Provincia di Benevento aveva sottoscritto una Convenzione con *"l'obiettivo in forma coordinata e sinergica di realizzare un programma operativo per l'individuazione e consequenziale realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità dell'area del Fortore*". Il primo itinerario ha inizio proprio con la variante al Comune di San Marco dei Cavoti e termina al punto M coincidente con l'intervento di variante del comune di San Bartolomeo in Gualdo. Nel primo stralcio rientrano gli interventi di NA287 e NA288, il secondo ed il terzo stralcio invece prevedono una serie di lotti funzionali di adeguamento dell'esistente o nuovi tratti in variante. Il progetto relativo all'intervento di NA233 è rappresentato dal nono lotto funzionale che fa parte del quarto stralcio funzionale dell'intero corridoio di attraversamento della Val Fortore ad oggi programmato ma non finanziato e rappresenta la parte finale campana come variante all'abitato di San Bartolomeo in Galdo. La variante si attesta sull'attuale S.S.369 ricollegandosi così alla parte pugliese della statale.

SINTESI INTERVENTO

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO	Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato affidato all'AQ DG27/18_L4 SWS Engineering e si è in attesa che venga stipulato il contratto applicativo al fine di dare avvio alla progettazione. Sono già stati effettuati alcuni incontri con i progettisti, ad oggi si è in attesa di completare i documenti contrattuali per gli aspetti del BIM.
PROCEDURA AUTORIZZATIVA	Intervento in procedura ordinaria
INQUADRAMENTO INTERVENTO	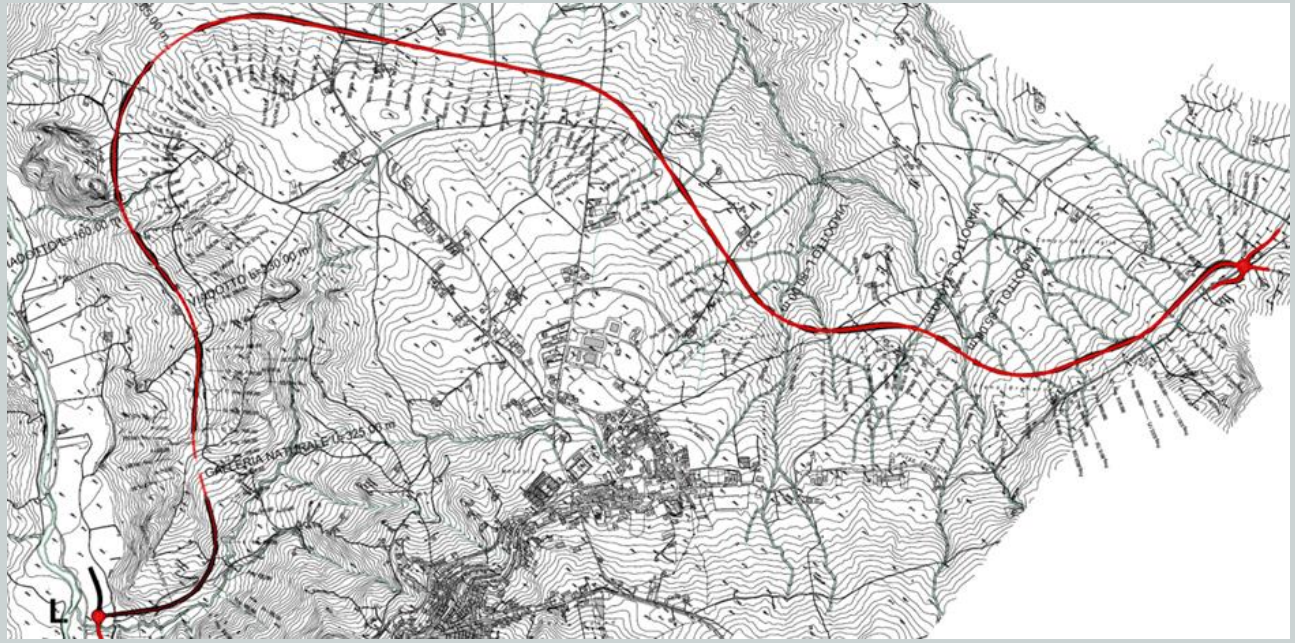

INTERVENTI LUNGO LA S.S. N.212 “DELLA VALLE DEL FORTORE”

Int.	Strada	Titolo intervento	Importo Mln€	Avanzamento %	Note
NA287 **In corso**	S.S. n.212 della Val Fortore	Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). - 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 2° Stralcio	67 M	10%	**IN CORSO** Consegnato il 21.04.2020 Ultimazione prevista Agosto 2022
NA288	S.S. 212 della Val Fortore	Lavori di completamento dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. - 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio.	54 M	Progettazione definitiva in corso	Appaltabilità 2021
NA233	S.S. 212 della Val Fortore	Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. - 2° lotto «Variante all’abitato di S. Bartolomeo in Galdo».	103 M	Progettazione Fattibilità Tecnico Economica in avvio	Appaltabilità 2022

anas
GRUPPO FS ITALIANE

INTERVENTI NUOVE OPERE - *INSERITI NEL CDP 2016-2020*

RIMODULAZIONE APPROVATA DAL CIPE NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2019 - FINANZIATI

N°	Strada	Titolo intervento	Importo Mln€	Appaltabilità prevista	Note
1	**S.S. 212** ''della Val Fortore''	**NA288** 1° lotto Variante di S. Marco dei Cavoti (Fortorina). 1° e 3° Stralcio	**54,0 M€** finanziato per 3,97 M€ dalla Legge 376/2003 art.1/e e per 50 M€ dai Fondi FSC (Delibera CIPE 98/2017)	**2021**	**Progettazione definitiva in corso**

INTERVENTI NUOVE OPERE - *INSERITI NEL CDP 2016-2020*

RIMODULAZIONE APPROVATA DAL CIPE NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2019 - PROGRAMMATI

N°	Strada	Titolo intervento	Importo Mln€	Appaltabilità prevista	Note
1	**S.S. n.212** "della Val Fortore"	**NA233** Lavori di completamento dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo - 2° stralcio	**102,80 M€**	**2022**	**Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica da avviare**

anas
GRUPPO FS ITALIANE

SINTESI INTERVENTO

NOME OPERA	SS 369 Appulo Fortorina – BA 321 Tratto dal confine regionale all'innesto con la SS17
REGIONE	PUGLIA
DESCRIZIONE INTERVENTO	La progettazione è relativa al tratto di SS369 ricadente nella Regione Puglia fino all'innesto con la SS17, l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura stradale è relativo ad un tronco stradale di circa 7 Km, caratterizzato da una sezione inadeguata, elevata tortuosità e diffusi dissesti da indagare per entità ed estensione. Si prevede di intervenire con un ampliamento della sede esistente fino alla dimensione della cat. C secondo DM 5/11/2001 compatibilmente con i dissesti presenti. Per il tratto terminale caratterizzato dalla presenza di vari tornanti si valuterà la realizzazione di ampliamenti locali per agevolare l'inserimento in curva dei mezzi pesanti.
INVESTIMENTO	Per l'intervento viene stimato un costo complessivo di 50 M€.
FONTE DI FINANZIAMENTO	L'intervento è inserito nella Sezione A.1.1 dell'Aggiornamento del Piano Pluriennale 2016-2020.

SINTESI INTERVENTO

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO	Allo stato dei fatti è stata elaborata unicamente un'ipotesi di lavoro ed una stima di massima dell'intervento nei termini sopradescritti
PROCEDURA AUTORIZZATIVA	Intervento in procedura ordinaria
INQUADRAMENTO INTERVENTO	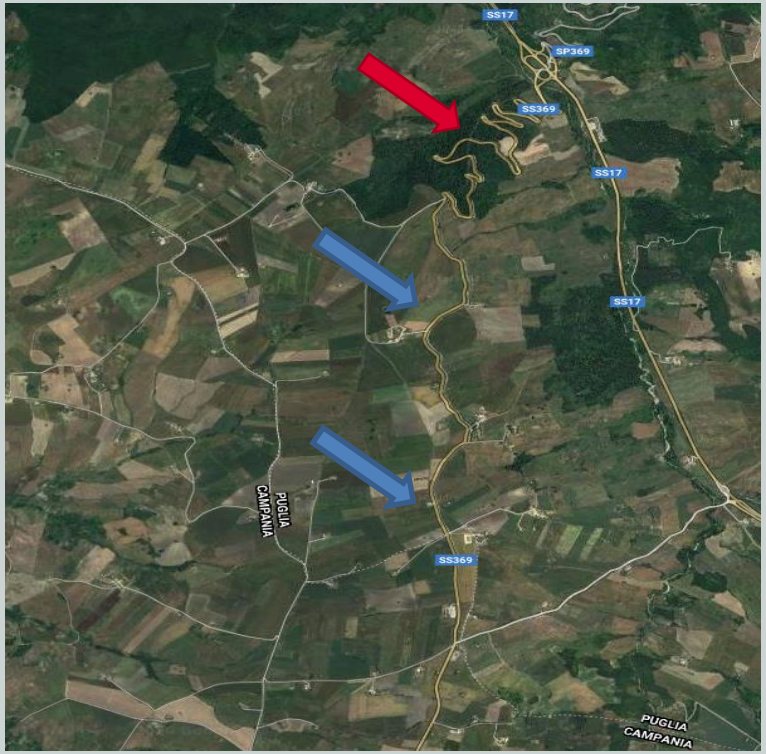

GRAZIE

anas
GRUPPO FS ITALIANE
