Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento

NN 6, n. 244

Roma, 7 maggio 2026

Caro Presidente,

trasmetto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2011, n. 26, dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 novembre 2016, n. 937, e dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 novembre 2021, n. 1257, la relazione annuale 2026 sullo stato di avanzamento degli interventi per strutture residenziali universitarie cofinanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

_____

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei deputati
ROMA

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN - Doc. firmato digitalmente da: CIRIANI LUCA + 1

Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari

Legge 14 novembre 2000, n. 338

Disposizioni in materia di alloggi e residenze
per studenti universitari

Relazione annuale 2026

Art. 9, D.M. n. 26/2011
Art. 9, D.M. n. 937/2016
Art. 10, D.M. n. 1257/2021

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Roma, 28 gennaio 2026

Indice:

1. Il quadro normativo di riferimento ..... - 5 -

2. Il terzo bando della L. 338/2000 (D.M. n. 26/2011 e D.M. n. 27/2011) ..... - 9 -

3. Il quarto bando della L. 338/2000 (D.M. 936/2016 e D.M. 937/2016) ..... - 25 -

4. Il quinto bando della L. 338/2000 (D.M. 1256/2021 e D.M. 1257/2021) ..... - 50 -

5. Il premio "professor Romano Del Nord" alla migliore residenza universitaria italiana - 75 -

6. I pignoramenti nei confronti del MUR ..... - 77 -

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN**

Figure:

Figura 1. Il quadro normativo ..... - 6 -
Figura 2. I posti alloggio attivi nei cinque bandi di applicazione della L. 338/2000 ..... - 8 -
Figura 3. I posti alloggio attivi suddivisi per regione ..... - 8 -
Figura 4. Gli interventi, i posti alloggio e il cofinanziamento per anno previsto di completamento...- 10 -
Figura 5. Gli interventi, i posti alloggio e il cofinanziamento per area geografica ..... - 11 -
Figura 6. Gli interventi, i posti alloggio e il cofinanziamento per tipologia..... - 11 -
Figura 7. Tipologia A2: interventi, posti alloggio e cofinanziamento per area geografica...... - 29 -
Figura 8. Tipologia A1, B, C: interventi, posti alloggio e cofinanziamento per area geografica. .- 29 -
Figura 9. Tipologia A1, B, C: interventi, posti alloggio e cofinanziamento per tipologia...... - 30 -
Figura 10. Tipologia A2: interventi, posti alloggio e cofinanziamento per area geografica...... - 55 -
Figura 11. Tipologia A1, B, C: interventi, posti alloggio e cofinanziamento per area geografica.- 56 -
Figura 13. Tipologia A1, B, C: interventi, posti alloggio e cofinanziamento per tipologia...... - 56 -

Tabelle:

Tabella 1 - Le domande presentate III bando..... - 12 -
Tabella 2 - Gli interventi che hanno trasmesso rinuncia al cofinanziamento, non ammessi o esclusi prima dell'emanazione del Decreto di Piano ..... - 14 -
Tabella 3 - Il cofinanziamento degli interventi III bando..... - 15 -
Tabella 4 - Gli interventi che hanno rinunciato al cofinanziamento o esclusi successivamente all'emanazione del Decreto di Piano..... - 17 -
Tabella 5 - Gli interventi in esercizio III bando ..... - 18 -
Tabella 6 - Gli interventi in corso di realizzazione III bando ..... - 19 -
Tabella 7 - Gli interventi attivi suddivisi per area geografica III bando ..... - 20 -
Tabella 8 - Gli interventi attivi suddivisi per tipologia III bando ..... - 22 -
Tabella 9 - Il quadro complessivo di attuazione degli interventi III bando ..... - 24 -
Tabella 10 - Le domande presentate IV bando..... - 31 -
Tabella 11 - Il cofinanziamento degli interventi IV bando ..... - 34 -
Tabella 12 - Gli interventi che hanno rinunciato al cofinanziamento, non ammessi o esclusi IV bando..... - 38 -
Tabella 13 - Gli interventi tipologia A2 attivi, suddivisi per area geografica IV bando..... - 40 -
Tabella 14 - Gli interventi tipologia A1, B e C attivi, suddivisi per area geografica IV bando... - 41 -
Tabella 15 - Gli interventi A1, B e C attivi suddivisi per tipologia IV bando ..... - 43 -
Tabella 16 - Gli interventi conclusi e funzionanti IV bando..... - 45 -
Tabella 17 - Gli interventi funzionanti non formalmente conclusi ..... - 46 -
Tabella 18 - Gli interventi in funzione nel 2026 ..... - 47 -
Tabella 19 - Gli interventi in funzione successivamente al 2026 ..... - 48 -
Tabella 20 - Il quadro complessivo di attuazione degli interventi IV bando..... - 49 -
Tabella 21 - Le domande presentate V bando ..... - 58 -
Tabella 22 - Il cofinanziamento degli interventi V bando ..... - 61 -

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN.

Tabella 23 - Gli interventi che hanno rinunciato al cofinanziamento V bando ..... - 65 -
Tabella 24 - Gli interventi di tipologia A2 attivi, suddivisi per area geografica V bando..... - 65 -
Tabella 25 - Gli interventi di tipologia A1, B, C attivi, suddivisi per area geografica V bando.. - 66 -
Tabella 26 - Gli interventi di tipologia A1, B, C attivi, suddivisi per tipologia V bando..... - 69 -
Tabella 27 - Gli interventi conclusi e funzionanti V bando ..... - 71 -
Tabella 28 - Gli interventi funzionanti non formalmente conclusi V bando..... - 72 -
Tabella 29 - Gli interventi per i quali i lavori risultano terminati V bando..... - 72 -
Tabella 30 - Gli interventi in corso di realizzazione V bando ..... - 72 -
Tabella 31 - Gli interventi per i quali i lavori non sono ancora iniziati V bando..... - 73 -
Tabella 32 - Gli interventi ammessi in fase 2 in attesa dell'ammissione definitiva V bando..... - 74 -
Tabella 33 - Il quadro complessivo di attuazione degli interventi V bando ..... - 75 -

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN**

La presente Relazione, approvata nella riunione della Commissione del [28 gennaio 2026], è redatta ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 26/2011 (III bando), dell'art. 9 del D.M. n. 937/2016 (IV bando) e dell'art. 10 del D.M. n. 1257/2021 (V bando) "Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari", di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

L'attuale Commissione alloggi e residenze per studenti universitari, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è stata nominata con D.M. 4 agosto 2025, n. 555 e rimane in carica per tre anni dalla data del Decreto di nomina; pertanto, la sua scadenza è fissata per il 4 agosto 2028. La Commissione si è insediata il 13 ottobre 2025, in sostituzione della precedente Commissione, nominata con D.M. 14 luglio 2022, n. 916, che ha cessato la sua attività il 9 luglio 2025.

Nell''anno 2025 la precedente Commissione si è riunita nelle seguenti date: 23 gennaio (in forma ristretta), 3 febbraio (in forma ristretta), 27 febbraio, 15 aprile, 29 aprile (in forma ristretta), 5 giugno e 9 luglio. Nell'anno 2025 l'attuale Commissione si è riunita nelle seguenti date: 13 ottobre e 11 dicembre.

1. Il quadro normativo di riferimento

La legge del 14 novembre 2000, n. 338, prevede, per alcuni soggetti pubblici (regioni, province autonome, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali, istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale) e privati (università non statali, collegi universitari, cooperative di studenti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro), la possibilità di richiedere un cofinanziamento statale (massimo 50% dell'importo complessivo dell'intervento, elevato al 75% per il quinto bando) per eseguire opere su edifici già esistenti (abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), nonché per lavori di ampliamento, realizzazione di nuovi edifici e acquisto di immobili adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari.

Alla legge hanno fatto seguito, negli anni, i decreti attuativi emanati dal MUR attraverso i quali sono state specificate sia le modalità operative per poter presentare le richieste, sia i parametri tecnici ed economici da rispettare per il conseguimento del cofinanziamento. I decreti di attuazione sono stati il n. 116 e n. 118 del 9 maggio 2001 (primo bando), il n. 42 e n. 43 del 22 maggio 2007 (secondo bando), il n. 26 e n. 27 del 7 febbraio 2011 (terzo bando), il n. 936 e n. 937 del 28 e 29 novembre 2016 (quarto bando) e il n. 1256 e n. 1257 del 30 novembre 2021 (quinto bando) (figura n. 1).

Secondo quanto previsto da tali decreti, i soggetti interessati erano tenuti a presentare un progetto di livello almeno definitivo (fatta eccezione per il quinto bando per il quale era possibile presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica secondo il D. lgs 50/2016), con l'obbligo, per gli interventi cofinanziati fino al quarto bando, di presentare il progetto esecutivo entro i termini previsti dai decreti di Piano.

Al termine della procedura di verifica e validazione delle richieste presentate, operata dalla Commissione, il Ministero ha approvato i Piani triennali che individuano gli interventi ammessi e

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

cofinanziati immediatamente, quelli ammessi con riserva (cioè subordinatamente alle disponibilità di risorse aggiuntive) e i non ammessi:

- ✓ D.M. n. 40/2004 - primo bando;
- ✓ D.M. n. 41/2008 e D.M. n. 72/2008 - secondo bando;
- ✓ D.M. n. 246/2012 - terzo bando;
- ✓ D.M. n. 852/2019 e D.M. n. 853/2019 - quarto bando;
- ✓ D.M. n. 1483/2022 e D.M. 1488/2023 – quinto bando.

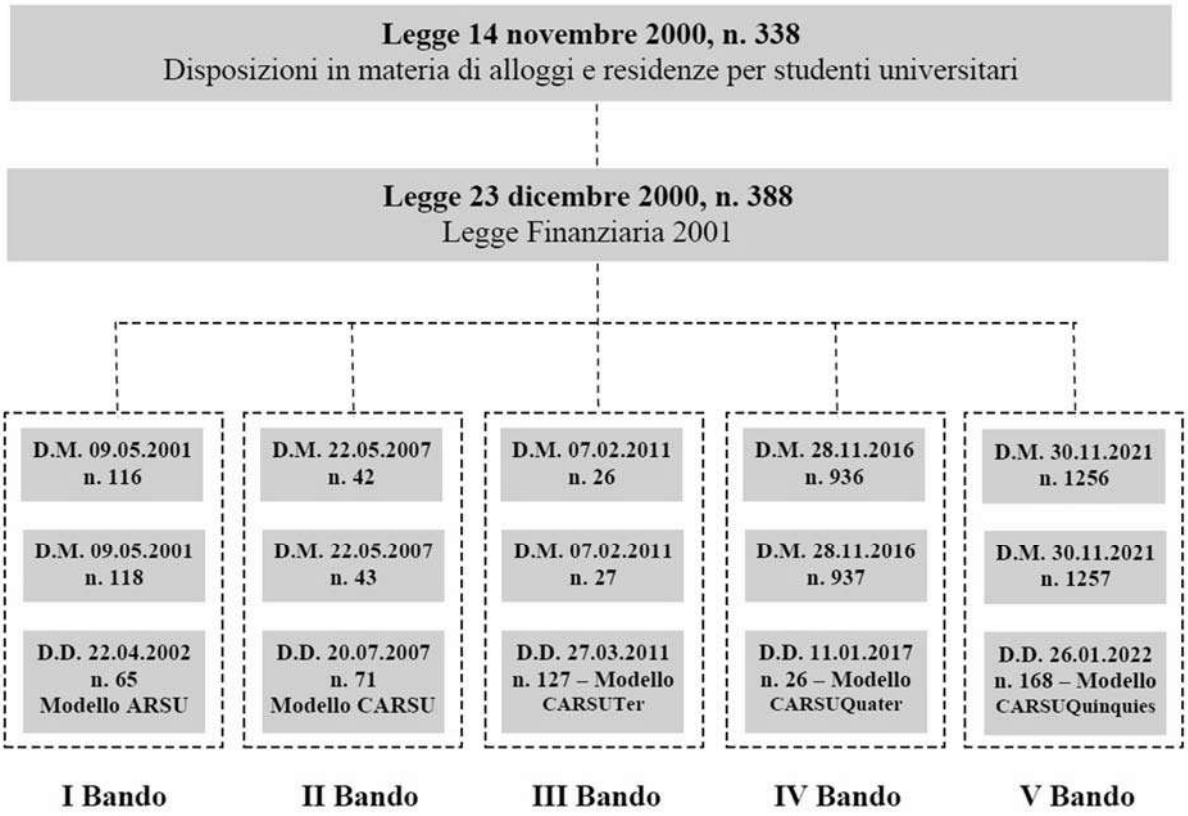


Figura 1. Il quadro normativo

Per i primi quattro bandi è previsto che il Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) inviti ciascun soggetto beneficiario a stipulare una specifica convenzione che definisce i doveri e gli obblighi di entrambe le parti, mentre a partire con il quinto bando il finanziamento degli interventi avviene con la pubblicazione in GURI del decreto MUR di assegnazione delle risorse.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Il cofinanziamento concesso dal MUR viene erogato ai soggetti beneficiari, per mezzo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a seguito del nullaosta rilasciato dalla Commissione, previa verifica della documentazione di spesa effettivamente sostenuta (ad esempio, stati di avanzamento lavori, fatture, quietanze di pagamento, ecc.).

Complessivamente, per i primi cinque bandi di applicazione della legge n. 338/2000, gli interventi inseriti nei Decreti di Piano ammessi al cofinanziamento e attivi (al netto delle rinunce pervenute) al 31.12.2025 sono 446 per un numero complessivo di 53.652 posti alloggio, dei quali 34.182 di nuova realizzazione, pari al 64 % del totale.

Lo Stato ha stanziato complessivamente per gli interventi attivi dei primi cinque bandi circa un miliardo e ottocento milioni di euro, utilizzati secondo il principio di "scorrimento" (da un Piano all'altro) dei fondi messi a disposizione e delle risorse provenienti da ribassi e/o risparmi, incluse le ulteriori risorse che hanno consentito lo scorrimento della graduatoria degli interventi del V bando (DM n. 1666/2024 e DM n. 584/2025).

Il primo Piano aveva una disponibilità iniziale di circa 450 milioni di euro, il secondo (suddiviso in due Decreti distinti) di circa 240 milioni di euro (di cui 120 milioni circa derivanti da rinunce ed economie del primo bando), il terzo di oltre 105 milioni (di cui 53 milioni circa derivanti da residui fondi FAS, rinunce e ribassi del primo e secondo bando) e il quarto (suddiviso in due Decreti distinti) di oltre 135 milioni (di cui 40 milioni circa derivanti da residui fondi FAS, rinunce e ribassi del primo, secondo e terzo bando).

Il quinto bando aveva una disponibilità iniziale di circa 493 milioni di euro, di cui circa 14 milioni per gli interventi di tipologia A2 e circa 479 per gli interventi di tipologia A1, B e C. A tale dotazione sono state aggiunte ulteriori risorse pari a circa 113 milioni.

Se al cofinanziamento statale si aggiungono le somme a carico dei soggetti beneficiari e i finanziamenti di soggetti terzi, si possono stimare, nell'arco di venti anni, investimenti complessivi pari a circa 3 miliardi di euro. A tale cifra, inoltre, deve essere aggiunto il valore degli immobili, vincolati alla destinazione d'uso di alloggi e residenze per studenti universitari per il tempo stabilito in ogni Decreto di Piano, resi disponibili dai soggetti beneficiari a parziale o totale copertura della quota parte di finanziamento a proprio carico.

Il significativo stanziamento di risorse, per l'incremento del numero di posti alloggio disponibili per gli studenti e della qualità dei servizi offerti, ha portato alla realizzazione di numerosi interventi, di cui molti in esercizio. In particolare:

- per il primo bando: 114 interventi in esercizio su 114 pari al 100% del totale e complessivi 13.329 posti alloggio messi in esercizio;
- per il secondo bando: 83 interventi in esercizio su 84, pari al 99% del totale, con 10.481 posti alloggio messi in esercizio sul totale di 10.637, pari al 99%;
- per il terzo bando: 32 interventi in esercizio su 40, pari al 80% del totale, con 3.947 posti alloggio messi in esercizio sul totale di 4.760, pari al 83%;
- per il quarto bando: 43 interventi in esercizio su 75, pari al 57% del totale, con 4.340 posti alloggio messi in esercizio sul totale di 8.360, pari al 52%;

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

- per il quinto bando: 14 interventi in esercizio su 133, pari al circa 10% del totale, con 2.221 posti alloggio messi in esercizio sul totale di 16.566, pari al 13%;

Rispetto al numero complessivo di circa 53.652 posti alloggio cofinanziati con i cinque bandi, ad oggi ne sono stati messi in esercizio 34.318, pari al 64% del totale.

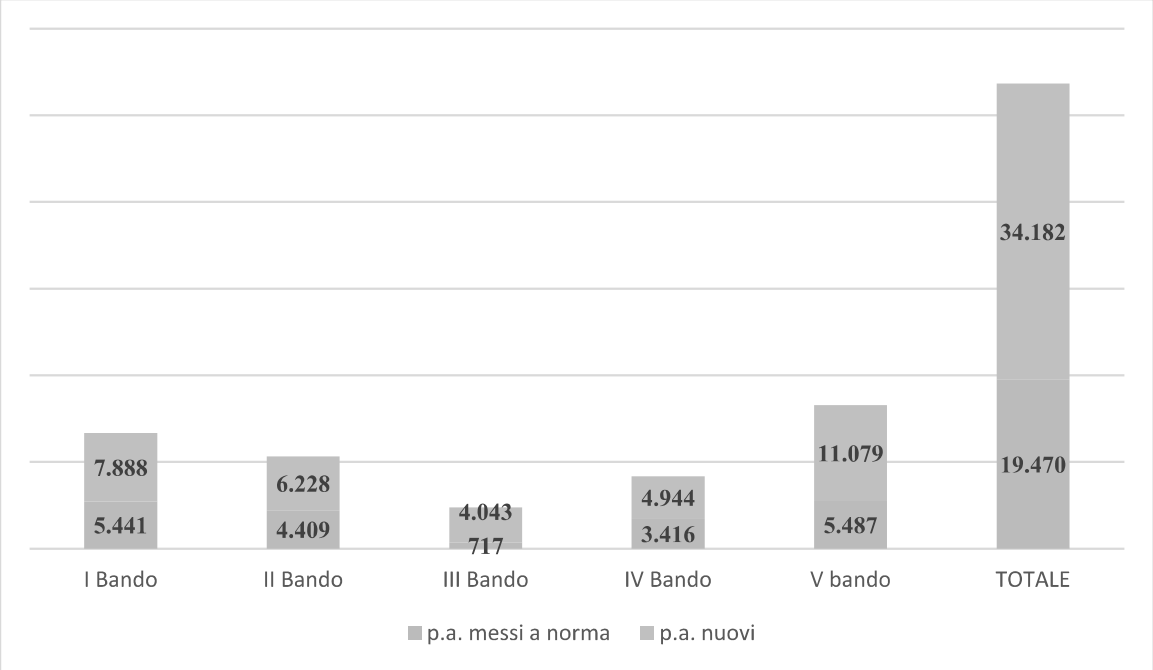


Figura 2. I posti alloggio attivi nei cinque bandi di applicazione della L. 338/2000

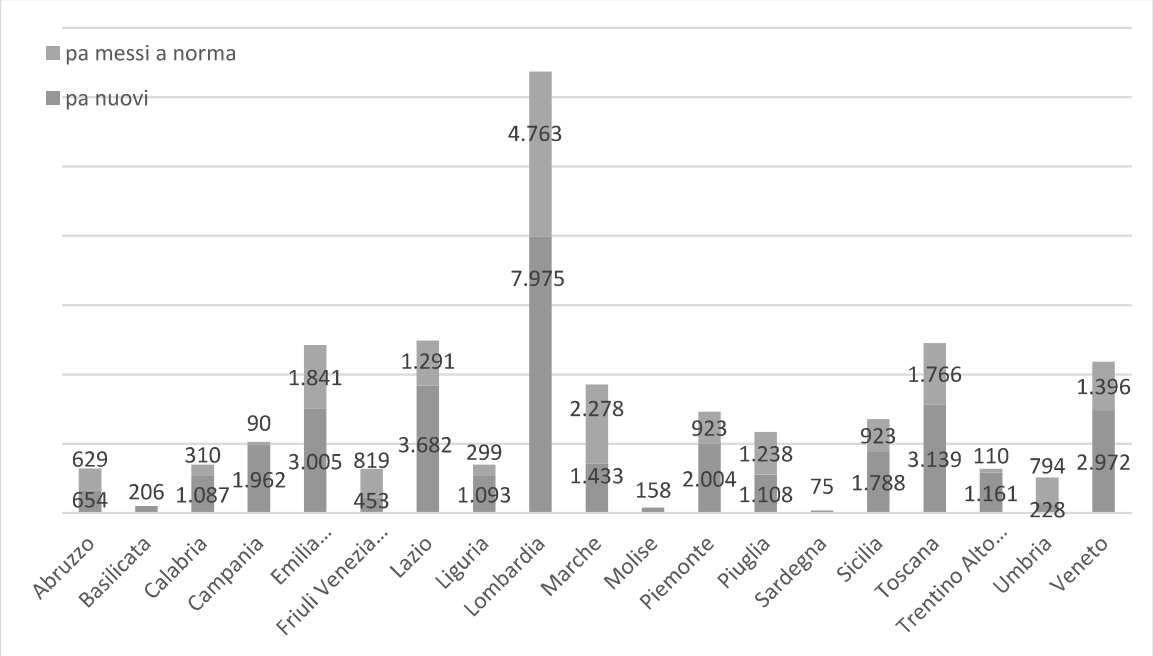


Figura 3. I posti alloggio attivi suddivisi per regione

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

2. Il terzo bando della L. 338/2000 (D.M. n. 26/2011 e D.M. n. 27/2011)

Con l'emanazione del terzo bando il Ministro ha ritenuto di attribuire un peso maggiore, rispetto al passato, a determinati parametri quali l'impiego di tecnologie innovative, il recupero di edifici esistenti e gli accorgimenti tecnici per il risparmio energetico.

Il terzo bando, rispetto ai precedenti, si è caratterizzato per alcuni fattori significativi:

a) un numero di richieste presentate inferiore rispetto ai precedenti (64% in meno rispetto al primo e 40% in meno rispetto al secondo);

b) le richieste di cofinanziamento che interessano interventi di manutenzione e messa a norma di residenze già esistenti sono fortemente diminuite rispetto a quelle che, invece, interessano la realizzazione di nuove strutture e gli interventi di ristrutturazione/restauro;

c) le richieste di cofinanziamento riguardano interventi mediamente più complessi e costosi, a causa delle dimensioni più ampie.

Le motivazioni di tali differenze risiedono principalmente nel fatto che molti interventi urgenti e necessari di manutenzione di residenze per studenti già esistenti, sono stati effettuati con i Piani precedenti, mentre per il terzo bando i soggetti si sono concentrati maggiormente sulle nuove realizzazioni o sul recupero e la ristrutturazione di immobili di notevoli dimensioni, strategici anche ai fini della riqualificazione urbana delle città. Lo stesso D.M. n. 26/2011 stabilisce, all'art. 5, comma 1, lettera g) che la richiesta di cofinanziamento sia almeno pari a € 350.000,00, escludendo di fatto interventi di manutenzione di modesta entità.

In occasione del terzo bando, con scadenza fissata nel luglio 2011, sono state presentate complessivamente 78 richieste di cofinanziamento, delle quali 45 riguardavano interventi di recupero, ristrutturazione edilizia o urbanistica, restauro e risanamento (58%), 26 interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi per studenti universitari (33%) e 7 interventi di acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari (9%) (tabella 1).

Il Piano, approvato con il D.M. del 7 agosto 2012 n. 246, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2012, n. 301, ha stabilito l'ammissibilità di 54 richieste di cofinanziamento (69% del totale delle richieste pervenute) e l'esclusione di 22 richieste (28%), prendendo atto della rinuncia di 2 richieste (3%) trasmessa dai soggetti richiedenti (l'attività istruttoria delle domande presentate è durata complessivamente circa 6 mesi).

L'importo complessivo delle richieste di cofinanziamento per il terzo bando ammonta a € 380.271.488, mentre per il primo bando era pari a € 563.101.279 e per il secondo pari a € 529.003.197. L'importo del cofinanziamento relativo alle richieste ammesse al terzo Piano ammonta a circa 288 milioni di euro per la realizzazione di 6.971 posti alloggio, di cui 5.550 posti alloggio nuovi, pari all'80% circa del totale (tabella 3).

Per effetto delle risorse disponibili, di ulteriori rinunce e revoche e del recupero di fondi provenienti dai ribassi di gara di altri interventi, al 27 gennaio 2016 tutti gli interventi inseriti nel Decreto di Piano sono stati definitivamente ammessi al cofinanziamento statale. Nello specifico, 24 interventi sono stati cofinanziati contestualmente all'uscita del Decreto di Piano, 5 sono stati ammessi nel 2013, 12

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot. 2026/0000778/TN

nel 2014, 9 nel 2015 e, infine, 4 a gennaio del 2016 (tabella 3). In sintesi, delle 54 richieste di cofinanziamento ammesse, ad oggi sono attivi 40 interventi, al netto di 13 interventi, di cui 7 hanno comunicato formale rinuncia al cofinanziamento già concesso e 6 non hanno ottenuto il nullaosta alla stipula della convenzione con il MUR (tabella 4).

Di seguito si documenta nel dettaglio lo stato di attuazione dei 40 interventi attivi, per un totale di 5.046 posti alloggio (di cui 4.046 p.a. nuovi - corrispondenti al 80% del totale dei posti alloggio - pari alla somma di 2.516 p.a. derivanti da edifici di nuova costruzione e acquisti di edifici da destinare a residenza per studenti universitari e 1.530 p.a. derivanti dall'ampliamento di strutture ricettive già esistenti) e un cofinanziamento complessivo da parte del MUR di € 172.474.956:

- n. 32 interventi sono completati e in esercizio (tabella 5);

n. 8 interventi sono in corso di realizzazione, per 3 dei quali la messa in esercizio avverrà in anni successivi al 2025 (tabella 6).



Figura 4. Gli interventi, i posti alloggio e il cofinanziamento per anno previsto di completamento

La tabella 7 suddivide gli interventi attivi per area geografica: al nord sono attivi 27 interventi, che rappresentano il 67,50% del totale, con una disponibilità di 2.891 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 101.617.215; al centro sono attivi 9 interventi, che rappresentano il 22,50% del totale, con una disponibilità di 1.491 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 57.497.952; al sud-isole sono attivi 4 interventi, che rappresentano il 10% del totale, con una disponibilità di 378 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 7.789.069.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

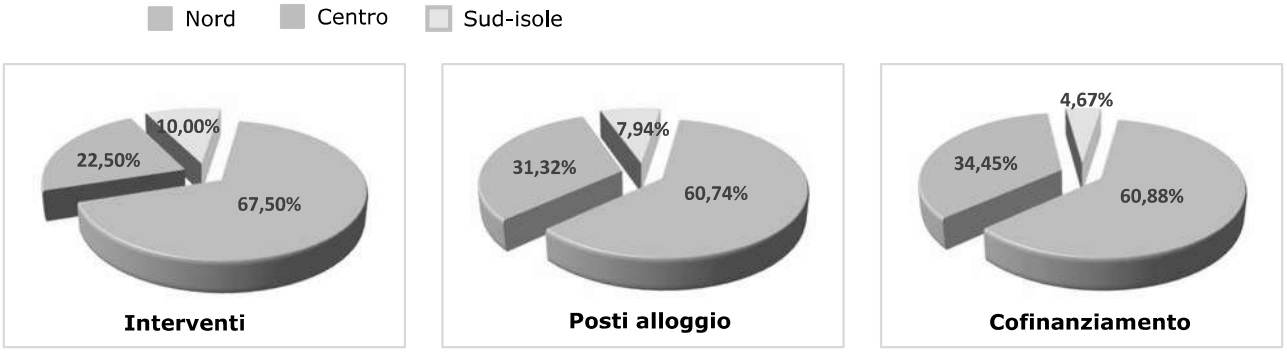


Figura 5. Gli interventi, i posti alloggio e il cofinanziamento per area geografica

La tabella 8 suddivide gli interventi attivi per tipologia: gli interventi sull'esistente (manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, nell'ambito dei quali è possibile effettuare operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza) sono n. 23, che rappresentano il 57,50% del totale, con una disponibilità di 2.102 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 69.413.479; gli interventi di nuova realizzazione o ampliamento di residenze per studenti universitari sono n. 15, che rappresentano il 37,50% del totale, con una disponibilità 2.212 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 75.514.369; gli acquisti di edifici da adibire a residenze per studenti sono n. 2, che rappresentano il 5% del totale, con una disponibilità di 446 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 25.547.162.



Figura 6. Gli interventi, i posti alloggio e il cofinanziamento per tipologia

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 1 - Le domande presentate III bando

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip[1]	p.a.[2]	Richiesta €
401	Ater Chieti	Abruzzo	Chieti	A	67	3.830.996
402	ADSU Chieti-Pescara	Abruzzo	Pescara	A	65	1.415.000
403	Conservat. Giacomantonio	Calabria	Cosenza	B	40	1.027.013
404	ADISU Salerno	Campania	Baronissi	A	86	358.303
405	Università di Salerno	Campania	Fisciano	B	152	6.337.885
406	Residenza Cavallo soc. coop.	Campania	Napoli	C	92	8.942.998
407	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	233	10.748.888
408	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	0	0
409	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	149	7.877.443
410	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	0	0
411	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	A	40	2.952.000
412	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Cesena	B	80	4.295.000
413	Fond. Collegio San Carlo	Emilia-Rom.	Modena	A	106	1.996.756
414	ASP Coll. Morigi-De Cesaris	Emilia-Rom.	Piacenza	A	89	4.520.000
415	ERDISU di Udine	Friuli V. G.	Udine	A	286	2.314.000
416	Regione Lazio	Lazio	Cassino	B	65	2.122.156
417	Regione Lazio	Lazio	Cassino	A	40	2.072.025
418	Regione Lazio	Lazio	Roma	A	76	1.300.267
419	Regione Lazio	Lazio	Roma	A	254	4.187.500
420	Sapienza Univ. di Roma	Lazio	Roma	A	240	17.847.599
421	Fondazione RUI	Lazio	Roma	A	61	262.560
422	Sapienza Univ. di Roma	Lazio	Roma	A	87	5.742.508
423	Sapienza Univ. di Roma	Lazio	Roma	A	0	0
424	Regione Lazio	Lazio	Roma	B	240	9.320.117
425	Fondazione P.G. Falciola	Lazio	Roma	C	233	14.735.100
426	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	A	112	3.000.000
427	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	A	48	499.125
428	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	C	153	7.095.000
429	A.L.E.R.	Lombardia	Bergamo	B	240	10.346.518
430	Università di Brescia	Lombardia	Brescia	A	197	13.105.400
431	Politecnico di Milano	Lombardia	Como	A	161	2.172.400
432	Associazione Univercomo	Lombardia	Como	A	105	3.999.990
433	Fond. Univ. di Mantova	Lombardia	Mantova	A	63	2.088.763
434	ALER Milano	Lombardia	Milano	A	124	4.590.818
435	ALER Milano	Lombardia	Milano	B	101	2.441.990
436	Fond. Coll. Univ. Milanesi	Lombardia	Milano	B	53	3.307.729
437	Fond. Coll. Univ. Milanesi	Lombardia	Milano	C	50	2.308.500
438	Fondazione Housing Sociale	Lombardia	Milano	B	277	6.875.023
439	IULM	Lombardia	Milano	A	96	5.454.078
440	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A	244	1.584.479
441	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	84	7.573.500
442	Univ. Catt. del Sacro Cuore	Lombardia	Milano	A	49	5.336.970
443	Università Comm. Bocconi	Lombardia	Milano	B	300	14.878.665
444	Università di Milano	Lombardia	Milano	A	151	570.900
445	Università di Milano	Lombardia	Milano	C	151	5.208.000
446	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Cinisello Balsamo	A	44	1.826.220
447	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Monza	A	146	6.982.740
448	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	104	5.718.093

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip[1]	p.a.[2]	Richiesta €
449	Ist. Univ. Studi Sup. di Pavia	Lombardia	Pavia	A	62	4.537.805
450	Università di Urbino C. Bo	Marche	Urbino	A	222	454.304
451	IACP Campobasso	Molise	Termoli	B	40	1.010.500
452	Collegio di Torino Einaudi	Piemonte	Torino	A	146	4.104.395
453	Politecnico di Torino	Piemonte	Torino	B	140	5.542.030
454	Politecnico di Torino	Piemonte	Torino	B	100	3.231.879
455	Università di Torino	Piemonte	Savigliano	A	24	1.050.000
456	A.di.s.u. Puglia	Puglia	Lecce	A	220	370.000
457	A.di.s.u. Puglia	Puglia	Lecce	A	0	0
458	Università del Salento	Puglia	Lecce	B	224	6.744.975
459	Università del Salento	Puglia	Lecce	B	186	5.948.067
460	Università del Salento	Puglia	Lecce	A	175	5.082.000
461	E.R.S.U.	Sardegna	Cagliari	A	142	1.286.960
462	E.R.S.U.	Sardegna	Cagliari	A	0	0
463	E.R.S.U.	Sardegna	Cagliari	B	240	23.549.008
464	ERSU Sassari	Sardegna	Sassari	A	75	2.608.783
465	IACP Catania	Sicilia	Catania	B	1.451	8.000.000
466	Università di Messina	Sicilia	Messina	B	42	2.227.839
467	A.R.C.E.S.	Sicilia	Palermo	A	44	845.951
468	Fondazione CEUR	Toscana	Firenze	C	203	12.868.800
469	Scuola Normale Superiore	Toscana	Pisa	A	20	518.648
470	ARDSU Toscana	Toscana	Pisa	B	245	6.898.035
471	ADSU Umbria	Umbria	Perugia	A	157	4.597.865
472	Fondaz. Frati Minori Onlus	Veneto	Venezia	A	54	2.733.248
473	Fondazione IUAV	Veneto	Venezia	A	78	6.424.971
474	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A	229	22.805.820
475	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A	136	4.371.440
476	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Ve. Mestre	B	142	4.493.039
477	Esu di Verona	Veneto	Verona	C	66	4.944.397
478	Collegio Don N. Mazza	Veneto	Verona	A	52	1.849.714
78				**Totale**	**10.749**	**380.271.488**

[1] Le tipologie di intervento, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 26/2011 sono:
A) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, nell'ambito dei quali è possibile effettuare operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza;
B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari;
C) l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari.
[2] Posti Alloggio

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 2 - Gli interventi che hanno trasmesso rinuncia al cofinanziamento, non ammessi o esclusi prima dell'emanazione del Decreto di Piano

Interventi che hanno trasmesso rinuncia

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Richiesta €
462	E.R.S.U.	Sardegna	Cagliari	A	0	0
466	Università di Messina	Sicilia	Messina	B	42	2.227.839
2				**Totale**	**42**	**2.227.839**

Interventi non ammessi al cofinanziamento

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Richiesta €
401	Ater Chieti	Abruzzo	Chieti	A	67	3.830.996
406	Residenza Cavallo soc. coop.	Campania	Napoli	C	92	8.942.998
417	Regione Lazio	Lazio	Cassino	A	40	2.072.025
421	Fondazione RUI	Lazio	Roma	A	61	262.560
429	A.L.E.R.	Lombardia	Bergamo	B	240	10.346.518
432	Associazione Univercomo	Lombardia	Como	A	105	3.999.990
434	ALER Milano	Lombardia	Milano	A	124	4.590.818
437	Fond. Coll. Univ. Milanesi	Lombardia	Milano	C	50	2.308.500
444	Università di Milano	Lombardia	Milano	A	151	570.900
445	Università di Milano	Lombardia	Milano	C	151	5.208.000
450	Università di Urbino C. Bo	Marche	Urbino	A	222	454.304
451	IACP Campobasso	Molise	Termoli	B	40	1.010.500
455	Università di Torino	Piemonte	Savigliano	A	24	1.050.000
456	A.di.s.u. Puglia	Puglia	Lecce	A	220	370.000
457	A.di.s.u. Puglia	Puglia	Lecce	A	0	0
459	Università del Salento	Puglia	Lecce	B	186	5.948.067
461	E.R.S.U.	Sardegna	Cagliari	A	142	1.286.960
463	E.R.S.U.	Sardegna	Cagliari	B	240	23.549.008
465	IACP Catania	Sicilia	Catania	B	1.451	8.000.000
467	A.R.C.E.S.	Sicilia	Palermo	A	44	845.951
469	Scuola Normale Superiore	Toscana	Pisa	A	20	518.648
477	Esu di Verona	Veneto	Verona	C	66	4.944.397
22				**Totale**	**3.736**	**90.111.140**
24			**Totale generale tabella 2**		**3.778**	**92.338.979**

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 3 - Il cofinanziamento degli interventi III bando

Interventi ammessi, inseriti nel Decreto di Piano del 7 agosto 2012, n. 246

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
402	ADSU Chieti-Pescara	Abruzzo	Pescara	A	65	1.415.000
403[1]	Conservat. Giacomantonio	Calabria	Cosenza	B	40	1.027.013
404	ADISU Salerno	Campania	Baronissi	A	86	358.303
405	Università di Salerno	Campania	Fisciano	B	152	6.337.885
411	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	A	40	2.952.000
413	Fond. Collegio San Carlo	Emilia-Rom.	Modena	A	106	1.996.756
416[1]	Regione Lazio	Lazio	Cassino	B	65	2.122.156
418	Regione Lazio	Lazio	Roma	A	76	1.300.267
419[1]	Regione Lazio	Lazio	Roma	A	254	4.187.500
420	Univ. Roma La Sapienza	Lazio	Roma	A	240	17.847.599
422	Univ. Roma La Sapienza	Lazio	Roma	A	87	5.742.508
423	Univ. Roma La Sapienza	Lazio	Roma	A	0	0
424	Regione Lazio	Lazio	Roma	B	240	9.320.117
425	Fondazione P.G. Falciola	Lazio	Roma	C	233	14.735.100
427	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	A	48	499.125
431	Politecnico di Milano	Lombardia	Como	A	161	2.172.400
439	IULM	Lombardia	Milano	A	96	5.454.078
440	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A	244	1.584.479
446	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Cinisello B.	A	44	1.826.220
452	Collegio di Torino Einaudi	Piemonte	Torino	A	146	4.104.395
454	Politecnico di Torino	Piemonte	Torino	B	100	3.231.879
458[1]	Università del Salento	Puglia	Lecce	B	224	6.744.975
464	ERSU Sassari	Sardegna	Sassari	A	75	2.608.783
470	ARDSU Toscana	Toscana	Pisa	B	245	6.898.035
24				**Totale**	**3.067**	**104.466.573**

Interventi inseriti nel Decreto di Piano del 7 agosto 2012, n. 246 e ammessi nel 2013

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
407	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	233	10.748.888
408	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	0	0
441[1]	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	84	7.573.500
448	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	104	5.718.093
471	ADSU Umbria	Umbria	Perugia	A	157	4.597.865
5				**Totale**	**578**	**28.638.346**

Interventi inseriti nel Decreto di Piano del 7 agosto 2012, n. 246 e ammessi nel 2014

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
409	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	149	7.877.443
410	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	0	0
430[1]	Università di Brescia	Lombardia	Brescia	A	197	13.105.400
436	Fond. Coll. Univ. Milanesi	Lombardia	Milano	B	53	3.307.729
442[1]	Univ. Catt. del Sacro Cuore	Lombardia	Milano	A	49	5.336.970

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
443	Università Comm. Bocconi	Lombardia	Milano	B	300	14.878.665
447[1]	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Monza	A	146	6.982.740
453	Politecnico di Torino	Piemonte	Torino	B	140	5.542.030
460[1]	Università del Salento	Puglia	Lecce	A	175	5.082.000
468	Fondazione CEUR	Toscana	Firenze	C	203	12.868.800
475	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A	136	4.371.440
476	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Ve. Mestre	B	142	4.493.039
12				**Totale**	**1.690**	**83.846.256**

Interventi inseriti nel Decreto di Piano del 7 agosto 2012, n. 246 e ammessi nel 2015

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
414	ASP Coll. Morigi-De Cesaris	Emilia-Rom.	Piacenza	A	89	4.520.000
415	ERDISU di Udine	Friuli V. G.	Udine	A	286	2.314.000
426	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	A	112	3.000.000
428[1]	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	C	153	7.095.000
435[1]	ALER Milano	Lombardia	Milano	B	101	2.441.990
438	Fondazione Housing Sociale	Lombardia	Milano	B	277	6.875.023
473	Fondazione IUAV	Veneto	Venezia	A	78	6.424.971
474	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A	229	22.805.820
478	Collegio Don N. Mazza	Veneto	Verona	A	52	1.849.714
9				**Totale**	**1.377**	**57.326.518**

Interventi inseriti nel Decreto di Piano del 7 agosto 2012, n. 246 e ammessi nel 2016

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
412	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Cesena	B	80	4.295.000
433	Fond. Università di Mantova	Lombardia	Mantova	A	63	2.088.763
449[1]	Ist. Univ. Studi Sup. di Pavia	Lombardia	Pavia	A	62	4.537.805
472[1]	Fondaz. Frati Minori Onlus	Veneto	Venezia	A	54	2.733.248
4				**Totale**	**259**	**13.654.816**
54			**Totale generale tabella 3**		**6.971**	**287.932.509**

[1] Interventi successivamente esclusi o che hanno rinunciato al cofinanziamento

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 4 - Gli interventi che hanno rinunciato al cofinanziamento o esclusi successivamente all'emanazione del Decreto di Piano

Interventi che hanno presentato rinuncia al cofinanziamento

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.		Cofin. €
403	Conservat. Giacomantonio	Calabria	Cosenza	B	40		1.027.013
419	Regione Lazio	Lazio	Roma	A	254		4.187.500
428	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	C	153		7.095.000
441	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	84		7.573.500
442	Univ. Catt. del Sacro Cuore	Lombardia	Milano	A	49		5.336.970
449	Ist. Univ. Studi Sup. di Pavia	Lombardia	Pavia	A	62		4.537.805
472	Fondaz. Frati Minori Onlus	Veneto	Venezia	A	54		2.733.248
415	ERDISU di Udine	Friuli V.G.	Udine	A	286	(*)	1.757.223
8				**Totale**	**696**		**34.248.259**

(*) Intervento per il quale è stato revocato il cofinanziamento.

Interventi esclusi

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
416	Regione Lazio	Lazio	Cassino	B	65	2.122.156
430	Università di Brescia	Lombardia	Brescia	A	197	13.105.400
435	ALER Milano	Lombardia	Milano	B	101	2.441.990
447	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Monza	A	146	6.982.740
458	Università del Salento	Puglia	Lecce	B	224	6.744.975
460	Università del Salento	Puglia	Lecce	A	175	5.082.000
6				**Totale**	**908**	**36.479.261**
13			**Totale generale tabella 4**		**1.604**	**70.727.520**

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 5 - Gli interventi in esercizio III bando

Fasc..	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
402	ADSU Chieti Pescara	Abruzzo	Pescara	A	65	1.115.107[2]
404[1]	ADISU Salerno	Campania	Baronissi	A	86	330.322[2]
405	Università di Salerno	Campania	Fisciano	B	152	4.372.527[2]
411	Università di Bologna	Emilia-R.	Bologna	A	40	2.166.232[2]
412[1]	Università di Bologna	Emilia-R.	Cesena	B	80	3.448.480[2]
413	Fond. Collegio San Carlo	Emilia-R.	Modena	A	106	1.862.229[2]
414	ASP Coll. Morigi-De Cesaris	Emilia-R.	Piacenza	A	89	3.988.160[2]
418	Regione Lazio	Lazio	Roma	A	76	929.749[2]
420[1]	Sapienza Univ. di Roma	Lazio	Roma	A	240	8.903.464[2]
425	Fondazione P.G. Falciola	Lazio	Roma	C	233	14.735.100
426	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	A	112	2.021.173[2]
427	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	A	48	376.951[2]
431	Politecnico di Milano	Lombardia	Como	A	63	1.886.025[2]
433	Fond. Univ. di Mantova	Lombardia	Mantova	A	63	1.840.343[2]
436	Fond. Coll. Univ. Milanesi	Lombardia	Milano	B	53	2.953.951[2]
438	Fondazione Housing Sociale	Lombardia	Milano	B	266	3.367.173[2]
439	IULM	Lombardia	Milano	A	96	4.334.289[2]
440[1]	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A	14[3]	1.584.479
443	Università Bocconi	Lombardia	Milano	B	300	13.398.263[2]
446	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Cinisello B.	A	44	1.038.888[2]
452	Collegio Einaudi	Piemonte	Torino	A	146	3.347.026[2]
453	Politecnico di Torino	Piemonte	Torino	B	144	4.819.806[2]
454	Politecnico di Torino	Piemonte	Torino	B	104	2.703.024[2]
464	ERSU Sassari	Sardegna	Sassari	A	75	1.971.113[2]
468	Fondazione CEUR	Toscana	Firenze	C	213	12.812.062[2]
470[1]	ARDSU Toscana	Toscana	Pisa	B	245	6.314.677[2]
471[1]	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	A	157	4.007.394[2]
473	Fondazione IUAV	Veneto	Venezia	A	78	5.570.720[2]
474	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A	229	14.170.828[2]
475	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A	136	3.715.932[2]
476[1]	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Ve. Mestre	B	142	4.145.996 [2]
478	Collegio Don Nicola Mazza	Veneto	Verona	A	52	1.697.814[2]
32				**Totale**	**3.947**	**139.929.297**

[1] Interventi funzionanti ma non formalmente chiusi perché il soggetto beneficiario ha richiesto l'erogazione soltanto di una parte del cofinanziamento assegnato.
[2] L'importo del cofinanziamento è stato rideterminato successivamente all'emanazione del Decreto di Piano.
[3] Il numero indicato rappresenta l'incremento dei posti alloggio rispetto ai 244 relativi all'intervento collegato del secondo bando (F. 275)

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 6 - Gli interventi in corso di realizzazione III bando

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
407[1]	Università di Bologna	Emilia-R.	Bologna	B	233	9.744.392[2]
408[1]	Università di Bologna	Emilia-R.	Bologna	B	0	0
409[1]	Università di Bologna	Emilia-R.	Bologna	B	149	7.287.669[2]
410[1]	Università di Bologna	Emilia-R.	Bologna	B	0	0
422[1]	Sapienza Univ. di Roma	Lazio	Roma	A	87	2.555.187[2]
423[1]	Sapienza Univ. di Roma	Lazio	Roma	A	0	0
424	Regione Lazio	Lazio	Roma	B	240	7.240.319[2]
448	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	104	5.718.093
8				**Totale**	**813**	**32.545.660**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.
[2] L'importo del cofinanziamento è stato rideterminato successivamente all'emanazione del Decreto di Piano.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 7 - Gli interventi attivi suddivisi per area geografica III bando

NORD

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
407[1]	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	233	9.744.391
408[1]	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	0	0
409[1]	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	149	7.287.669
410[1]	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	0	0
411	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	A	40	2.166.232[2]
412	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Cesena	B	80	3.448.480[2]
413	Fond. Collegio San Carlo	Emilia-Rom.	Modena	A	106	1.862.229[2]
414	ASP Coll. Morigi-De Cesaris	Emilia-Rom.	Piacenza	A	89	3.988.160[2]
426	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	A	112	2.021.173[2]
427	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	A	48	376.951[2]
431	Politecnico di Milano	Lombardia	Como	A	63	1.886.025
433	Fond. Univ. di Mantova	Lombardia	Mantova	A	63	1.840.343[2]
436	Fond. Coll. Univ. Milanesi	Lombardia	Milano	B	53	2.953.951[2]
438	Fondazione Housing Sociale	Lombardia	Milano	B	266	3.367.173[2]
439	IULM	Lombardia	Milano	A	96	4.334.289[2]
440	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A	14	1.584.479
443	Università Comm. Bocconi	Lombardia	Milano	B	300	13.398.263[2]
446	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Cinisello B.	A	44	1.038.888[2]
448	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	104	5.718.093
452	Collegio Einaudi	Piemonte	Torino	A	146	3.347.026[2]
453	Politecnico di Torino	Piemonte	Torino	B	144	4.819.806[2]
454	Politecnico di Torino	Piemonte	Torino	B	104	2.703.024[2]
473	Fondazione IUAV	Veneto	Venezia	A	78	5.570.720[2]
474	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A	229	14.170.828[2]
475	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A	136	3.715.932[2]

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
476	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Ve. Mestre	B	142	4.145.996[2]
478	Collegio Don N. Mazza	Veneto	Verona	A	52	1.697.814[2]
27				**Totale**	**2.891**	**107.187.935**

CENTRO

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
418	Regione Lazio	Lazio	Roma	A	76	929.749[2]
420	Univ. Roma La Sapienza	Lazio	Roma	A	240	8.903.464[2]
422[1]	Univ. Roma La Sapienza	Lazio	Roma	A	87	2.555.187[2]
423[1]	Univ. Roma La Sapienza	Lazio	Roma	A	0	0
424	Regione Lazio	Lazio	Roma	B	240	7.240.319[2]
425	Fondazione P.G. Falciola	Lazio	Roma	C	233	14.735.100
468	Fondazione CEUR	Toscana	Firenze	C	213	12.812.062[2]
470	ARDSU Toscana	Toscana	Pisa	B	245	6.314.677
471	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	A	157	4.007.394[2]
9				**Totale**	**1.491**	**57.497.952**

SUD E ISOLE

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
402	ADSU Chieti-Pescara	Abruzzo	Pescara	A	65	1.115.107[2]
404	ADISU Salerno	Campania	Baronissi	A	86	330.322[2]
405	Università di Salerno	Campania	Fisciano	B	152	4.372.527[2]
464	ERSU Sassari	Sardegna	Sassari	A	75	1.971.113[2]
4				**Totale**	**378**	**7.789.069**
40			**Totale generale tabella 7**		**4.760**	**172.474.956**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.
[2] L'importo del cofinanziamento è stato rideterminato successivamente all'emanazione del Decreto di Piano.

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN**

Tabella 8 - Gli interventi attivi suddivisi per tipologia III bando

INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
402	ADSU Chieti-Pescara	Abruzzo	Pescara	A	65	1.115.107[2]
404	ADISU Salerno	Campania	Baronissi	A	86	330.322[2]
411	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	A	40	2.166.232[2]
413	Fond. Collegio San Carlo	Emilia-Rom.	Modena	A	106	1.862.229[2]
414	ASP Coll. Morigi-De Cesaris	Emilia-Rom.	Piacenza	A	89	3.988.160[2]
418	Regione Lazio	Lazio	Roma	A	76	929.749[2]
420	Univ. Roma La Sapienza	Lazio	Roma	A	240	8.903.464[2]
422[1]	Univ. Roma La Sapienza	Lazio	Roma	A	87	2.555.187[2]
423[1]	Univ. Roma La Sapienza	Lazio	Roma	A	0	0
426	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	A	112	2.021.173[2]
427	ARSSU Liguria	Liguria	Genova	A	48	376.951[2]
431	Politecnico di Milano	Lombardia	Como	A	63	1.886.025[2]
433	Fond. Univ. di Mantova	Lombardia	Mantova	A	63	1.840.343[2]
439	IULM	Lombardia	Milano	A	96	4.334.289[2]
440	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A	14	1.584.479
446	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Cinisello B.	A	44	1.038.888[2]
452	Collegio Einaudi	Piemonte	Torino	A	146	3.347.026[2]
464	ERSU Sassari	Sardegna	Sassari	A	75	1.971.113[2]
471	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	A	157	4.007.394[2]
473	Fondazione IUAV	Veneto	Venezia	A	78	5.570.720[2]
474	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A	229	14.170.828[2]
475	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A	136	3.715.932[2]
478	Collegio Don N. Mazza	Veneto	Verona	A	52	1.697.814[2]
23				**Totale**	**2.102**	**69.413.425**

NUOVE COSTRUZIONI O AMPLIAMENTI

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
405	Università di Salerno	Campania	Fisciano	B	152	4.372.527[2]
407[1]	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	233	9.744.391[2]
408[1]	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	0	0
409[1]	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	149	7.287.669[2]
410[1]	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Bologna	B	0	0
412	Università di Bologna	Emilia-Rom.	Cesena	B	80	3.448.480[2]
424	Regione Lazio	Lazio	Roma	B	240	7.240.319[2]
436	Fond. Coll. Univ. Milanesi	Lombardia	Milano	B	53	2.953.951[2]
438	Fondazione Housing Sociale	Lombardia	Milano	B	266	3.367.173[2]
443	Università Comm. Bocconi	Lombardia	Milano	B	300	13.398.263[2]
448	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	104	5.718.093
453	Politecnico di Torino	Piemonte	Torino	B	144	4.819.806[2]
454	Politecnico di Torino	Piemonte	Torino	B	104	2.703.024[2]
470	ARDSU Toscana	Toscana	Pisa	B	245	6.314.677[2]

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

476	Univ. Ca' Foscari Venezia	Veneto	Ve. Mestre	B	142	4.145.996[2]
15			**Totale**		**2.212**	**75.514.369**

ACQUISTI

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
425	Fondazione P.G. Falciola	Lazio	Roma	C	233	14.735.100
468	Fondazione CEUR	Toscana	Firenze	C	213	12.812.062
2				**Totale**	**446**	**27.547.162**
40			**Totale generale tabella 8**		**4.760**	**172.474.956**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.
[2] L'importo del cofinanziamento è stato rideterminato successivamente all'emanazione del Decreto di Piano.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 9 - Il quadro complessivo di attuazione degli interventi III bando

	n.	%	Cofin. €	%	p.a.	%
Interventi chiusi e funzionanti	25	78,13	114.587.046	79,95	2.983	75,58
Interventi funzionanti ma non formalmente chiusi	7	21,88	28.734.812	20,05	964	24,42
Totale interventi in esercizio (tabella 5)	32	80	143.221.858	81,49	3.947	82,92
Interventi in funzione nel 2025	3	37,50	9.795.506	30,10	327	40,22
Interventi in funzione in anni successivi al 2025	5	62,50	22.750.154	69,90	486	59,78
Totale interventi in corso di realizzazione (tabella 6)	8	20	32.545.660	18,51	813	17,08
Totale degli interventi attivi	**40**	**100**	**172.474.956**	**100**	**4.760**	**100**

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN**

3. Il quarto bando della L. 338/2000 (D.M. 936/2016 e D.M. 937/2016)

Con l'emanazione del quarto bando il Ministro ha ritenuto di attribuire un peso maggiore, rispetto al passato, agli interventi finalizzati all'efficientamento e/o al miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie.

Il quarto bando prevede, infatti, una tipologia di interventi specifici (A2) per l'individuazione e messa in opera di soluzioni tecnologiche e progettuali innovative finalizzate ad uno sviluppo ambientale ed economico sostenibile anche per le residenze universitarie oggetto di interventi di recupero. Il bando, per tale tipologia di interventi, stabilisce un *range* di cofinanziamento (minimo € 100.000, massimo € 600.000) ed un apposito Decreto di Piano per un importo massimo di € 15.000.000.

La scadenza per la trasmissione delle richieste di cofinanziamento era fissata per il 10/05/2017. Le richieste di cofinanziamento pervenute nei termini definiti e oggetto di istruttoria, in riferimento ai Modelli Informatizzati chiusi nei termini stabiliti, sono state 113. Rispetto a tali domande, per un intervento non è stata trasmessa documentazione cartacea e per 3 interventi sono stati compilati, rispettivamente, 3 Modelli Informatizzati (uno errato e uno corretto per ciascun intervento). Di conseguenza, le richieste di cofinanziamento effettivamente pervenute risultano essere 109 (tabella 10).

Delle 109 richieste, 13 interventi (pari al 12% del totale) riguardano opere di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie (tipologia A2), 76 interventi (pari al 70% del totale) riguardano opere di recupero, ristrutturazione edilizia o urbanistica, restauro e risanamento (Tipologia A1); 13 interventi (pari al 12% del totale) riguardano opere di nuova costruzione o ampliamento di alloggi per studenti universitari (Tipologia B), inclusa l'eventuale acquisizione delle aree necessarie e 7 interventi (pari al 6% del totale) prevedono l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari (Tipologia C).

L'importo di cofinanziamento complessivo richiesto al MUR ammonta a circa 400 milioni di euro per la realizzazione/messa a norma di oltre 12.300 posti alloggio, di cui circa 5.500 posti alloggio da mettere a norma e da manutenere e circa 6.800 posti alloggi di nuova realizzazione.

Il quarto bando, rispetto ai precedenti, si è caratterizzato per alcuni fattori significativi:

a) numero di richieste superiore rispetto al terzo bando (+42%) e leggermente inferiore al secondo (-15%) e al primo (-35%);

b) numero di posti alloggio interessati superiore rispetto al terzo bando (+52%), molto simile al secondo (-2%) e inferiore al primo bando (-25%);

c) le richieste di cofinanziamento riguardano in 88 casi (80% circa) interventi su immobili già esistenti (76 interventi di tipologia A1 e 13 interventi di tipologia A2): 53 di questi comportano comunque un incremento o nuova realizzazione di posti alloggio per circa 4.000 unità.

L'importo delle richieste di cofinanziamento che interessano interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione di immobili esistenti è predominante rispetto agli interventi di nuova costruzione e acquisto (circa 294 milioni di euro a fronte dei circa 104 milioni per le nuove costruzioni e acquisti).

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Questo indica come i soggetti proponenti si sono orientati verso il recupero del patrimonio edilizio esistente - piuttosto che sulla costruzione di nuove volumetrie - finalizzato comunque alla realizzazione di nuovi posti alloggio e non solo al recupero delle strutture già adibite a tale finalità.

Rispetto al terzo bando le richieste di cofinanziamento presentate per il quarto presentano in generale importi inferiori: in media circa 4.000.000 di euro ad intervento per il quarto bando mentre per il terzo bando la media era di quasi 5.000.000 di euro ad intervento.

L'importo complessivo delle richieste di cofinanziamento per il quarto bando ammonta a € 403.042.691mentre per il terzo era pari a € 380.271.488.

Alla data del 3 settembre 2018, la Commissione istituita ai sensi del D.M 21 luglio 2015, n. 504, in concomitanza con il termine del proprio mandato, ha terminato i lavori di istruttoria degli interventi che hanno presentato richiesta di cofinanziamento e ha trasmesso al Ministro la proposta di graduatoria.

Il MUR, con il D.M 12 dicembre 2018, n. 852 e il D.M. 12 dicembre 2018 n. 853, ha emanato i Decreti di Piano che individuano gli interventi ammissibili (suddivisi tra immediatamente cofinanziabili e in riserva) e gli interventi esclusi dal cofinanziamento, nonché le modalità di trasmissione dell'eventuale documentazione integrativa e dei progetti esecutivi.

Dalla data di emanazione dei suddetti decreti i soggetti ammessi, così come previsto dall'art. 4, comma 2 del D.M 12 dicembre 2018, n. 852 e dall'art. 7, comma 2 del D.M. 12 dicembre 2018 n. 853, entro 210 giorni dovevano trasmettere il progetto esecutivo, la documentazione integrativa, la scheda informatizzata e la scheda di previsione della gestione (solo per le tipologie A1, B e C).

Il Ministero, con il D.M. 8 aprile 2019, n. 321, registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio 2019, ha nominato la nuova Commissione, che si è insediata il 13 giugno 2019.

Con D.M n. 857 del 10/10/2019 il MUR, vista la nota del 17/07/2019 con la quale la CRUI e il CoDAU hanno richiesto una proroga del termine previsto dall'art. 7, comma 11, D.M. 937/2016; visto l'estratto del Verbale n. 03/2019 del 25/07/2019 nel quale la Commissione esprime parere favorevole alla concessione della proroga; visto il parere della Conferenza Stato-Regioni del 26/09/2019, ha concesso 90 giorni di proroga per l'invio della documentazione integrativa (per complessivi 300 giorni), facendo slittare a gennaio 2020 la consegna degli elaborati.

Il Decreto di Piano approvato con il D.M. del 12 dicembre 2018, n. 852 (interventi tipologia A2), e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2019, serie generale n. 69, ha individuato gli interventi di tipologia A2 cofinanziabili (tabella 11) per un importo complessivo di cofinanziamento pari a 5.664.307 euro e ha stabilito l'ammissibilità di 13 richieste di cofinanziamento, il 100% del totale delle richieste pervenute (tabella 11). Poiché ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.M. 937/2016 per gli interventi di tipologia A2 era previsto un ammontare complessivo di cofinanziamento pari a 15.000.000 euro nell'Esercizio Finanziario 2016, i restanti 9.335.693 euro sono stati utilizzati per il cofinanziamento degli interventi di tipologia A1, B e C.

Il Decreto di Piano approvato con il D.M. del 12 dicembre 2018 n. 853 (interventi tipologia A1, B e C), e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019, serie generale n. 75, ha individuato gli interventi di tipologia A1, B e C ammissibili al cofinanziamento e ha stabilito l'ammissibilità di 80 richieste di cofinanziamento (83% del totale delle richieste pervenute di tipologia A1, B, C) e l'esclusione di 14 richieste (circa il 15% del totale delle richieste pervenute di tipologia A1, B, C),

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

prendendo atto della rinuncia di 2 richieste (2% del totale delle richieste pervenute di tipologia A1, B, C) trasmessa dai soggetti richiedenti (tabelle 11 e 12). Come per i piani precedenti, poiché l'importo complessivo di cofinanziamento superava l'importo a disposizione, il Piano ha definito gli interventi immediatamente finanziabili (fase 1 e 2) e gli interventi ammessi con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse (fase 3) per il finanziamento dei quali verranno utilizzate le annualità successive e i recuperi derivanti dai ribassi di gara, eventuali rinunce, revoche, ecc.

In sintesi, delle 109 richieste pervenute, per complessivi € 403.042.691di cofinanziamento statale richiesto, n. 93 interventi sono stati giudicati ammissibili dalla Commissione e inseriti nei due Decreti di Piano: 13 interventi di tipologia A2 nel D.M. 852/2018 e 80 interventi di tipologia A1, B, C nel D.M. 853/2018.

I 93 interventi ritenuti ammissibili, per un totale di 10.610 posti alloggio - di cui 4.580 già esistenti messi a norma e 6.030 di nuova realizzazione - e un cofinanziamento complessivo pari a € 333.660.408, sono suddivisi in due gruppi:

Gli interventi di tipologia A2 (art. 3, comma 1, D.M. 937/2016) rappresentano il 13,98% del totale, con una disponibilità di 1.430 posti alloggio già esistenti, per un cofinanziamento complessivo di € 5.664.307. Di questi:

- gli interventi al Nord sono n. 8 per un totale di 956 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 3.706.397;
- un intervento è al Centro Italia per un totale di 66 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 504.760,00;
- gli interventi al Sud Italia e Isole sono n. 4 per un totale di 407 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 1.453.150.

Gli Interventi di tipologia A1, B, C rappresentano l'86,02% del totale, con una disponibilità di 9.181 posti alloggio - di cui n. 6.030 di nuova realizzazione - e cofinanziamento complessivo assegnato di € 327.996.101. Di questi:

- gli interventi al Nord sono n. 45 per un totale di 4.881 posti alloggio - di cui 3.263 di nuova realizzazione - e cofinanziamento pari a € 166.915.630;
- gli interventi al Centro Italia sono n. 17 per un totale di 2.455 posti alloggio - di cui 1.179 di nuova realizzazione - e cofinanziamento pari a € 73.087.296;
- gli interventi al Sud Italia e Isole sono n. 18 per un totale di 1.845 posti alloggio - di cui 1.588 di nuova realizzazione - e cofinanziamento pari a € 87.993.175;

In base al D.M. 853/2018, dei suddetti 80 interventi di tipologia A1, B, C ammessi al cofinanziamento, n. 35 sono stati finanziati immediatamente in base alle risorse disponibili, per un totale di 4.061 posti alloggio - di cui n. 2.266 di nuova realizzazione - e un cofinanziamento complessivo di € 123.928.306. Di questi, un intervento al Centro Italia ha presentato formale rinuncia al cofinanziamento, per un totale di 352 p.a. esistenti e cofinanziamento pari a € 1.184.558 (F. 576)

Camera dei Deputati Arrivo 05 maggio 2026 Prot. 2026.0006778.I

e un intervento al Sud Italia è stato escluso dal cofinanziamento per non aver trasmesso la documentazione integrativa nei termini previsti dal D.M. 853/2018: trattasi di intervento su 120 p.a. esistenti e cofinanziamento di € 1.212.495,50 (F. 597).

Per tutti gli interventi inseriti nel D.M. 853/2018 con riserva è stata comunicata l'ammissione definitiva al cofinanziamento: 2 interventi, (n. 1 al Nord e n. 1 al Sud) per un totale di 452 p.a. di nuova realizzazione e cofinanziamento pari a € 24.931.662, sono stati ammessi il 13/05/2019 (F. 519 e F. 559); 3 interventi, al Nord Italia per un totale di 170 p.a. di cui 91 di nuova realizzazione e cofinanziamento pari a € 7.196.000, sono stati ammessi il 29/11/2019 (F. 541, F. 569 e F. 570); un intervento al Nord Italia (F. 551) per un totale di 182 p.a. di nuova realizzazione e cofinanziamento pari a € 8.571.885,00 è stato ammesso il 27/02/2020; 11 interventi, (n. 8 al Nord, n. 1 al Centro e n. 2 al Sud-Isole) per un totale di 1.384 p.a. e cofinanziamento pari a € 49.746.315, sono stati ammessi il 21/07/2020 (F. 544, F. 584, F. 562, F. 552, F. 567, F. 553, F. 587, F. 514, F. 595, F.585); 18 interventi (n. 10 al Nord, n. 4 al Centro e n. 4 al Sud) per un totale di 1.606 p.a. e cofinanziamento pari a € 64.315.513, sono stati ammessi il 07/07/2021 (F. 530 , F. 599, F. 598, F. 538, F. 572, F. 543, F. 516, F. 517, F. 571, F. 563, F. 606, F. 540, F. 581, F. 592, F. 566, F. 586, F.531, F. 542); un intervento al Sud Italia (F. 593) per un totale di 87 p.a. e cofinanziamento pari a € 4.290.200,00 è stato ammesso il 30/07/2021; un intervento al Nord Italia (F. 603) per un totale di 200 p.a. di nuova realizzazione e cofinanziamento pari a € 4.290.200,00 è stato ammesso il 18/10/2021; un intervento al Sud Italia (F. 523) per un totale di 152 p.a. di nuova realizzazione e cofinanziamento pari a € 6.839.571,00 è stato ammesso il 08/11/2021; un intervento al Sud Italia (F. 596) per un totale di 206 p.a. di nuova realizzazione e cofinanziamento pari a € 12.849.897,00 è stato ammesso il 30/12/2021; un intervento al Sud Italia (F. 594) per un totale di 234 p.a. di nuova realizzazione e cofinanziamento pari a € 8.011.785,57 è stato ammesso il 28/12/2022 (tabella 11).

I soggetti beneficiari di 14 interventi (n. 8 al nord Italia, n. 3 interventi al centro Italia e n. 3 interventi al sud-isole), inseriti nel D.M. 853/2018 con riserva, hanno trasmesso formale rinuncia al cofinanziamento (F. 515, F. 531, F. 542, F. 553, F. 555, F. 566, F. 576, F. 577, F. 580, F. 581, F. 586, F. 588, F. 590, F. 594, F. 598, per un totale di 1.703p.a. e cofinanziamento pari a € 53.381.588; i soggetti beneficiari di 3 interventi (n. 1 al nord Italia e n. 2 interventi al sud-isole), inseriti nel D.M. 853/2018 con riserva, sono stati esclusi dal cofinanziamento per non aver trasmesso la documentazione integrativa nei termini previsti dall'art. 7, commi 11 e 12 del D.M. 937/2016 (F. 543, F. 595, F. 597), per un totale di 521 p.a. e cofinanziamento pari a € 4.396.743 (Tabella 12).

Pertanto, gli interventi di tipologia A1, B, C inseriti nel D.M. 853/2018 e attualmente attivi sono 62, per un totale di 6.931 posti alloggio e un cofinanziamento complessivo di € 251.997.466, incluse eventuali rideterminazioni a seguito di economie conseguite.

Sommando gli interventi di tipologia A2, ad oggi risultano attivi 75 interventi, per un totale di 8.360posti alloggio e un cofinanziamento complessivo di € 256.906.917, incluse eventuali rideterminazioni a seguito di economie conseguite.

Per tutti gli interventi di cui sopra è stata trasmessa la documentazione integrativa nei termini previsti dal D.M. 853/2018 e la Commissione ha espresso il nulla osta alla stipula della Convenzione, come previsto dall'art. 5, comma 1 del D.M. 852/2018 per gli interventi di tipologia A2 e dall'art. 8. V Comma 1 del D.M. 853/2018 per gli interventi di tipologia A1, B, C. Tutti e 13 gli interventi di tipologia A2 e 62 interventi di tipologia A1, B, C hanno stipulato la Convenzione ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 29/11/2016 n. 937.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

La tabella 13 suddivide gli interventi cofinanziati di tipologia A2 per area geografica: al nord sono cofinanziati 8 interventi, che rappresentano il 61,54% del totale, con una disponibilità di 956 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 3.412.662; al centro è cofinanziato 1 intervento, che rappresenta il 7,69% del totale, con una disponibilità di 66 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 321.638; al sud-isole sono cofinanziati 4 interventi, che rappresentano il 30,77% del totale, con una disponibilità di 407 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 1.175.151.

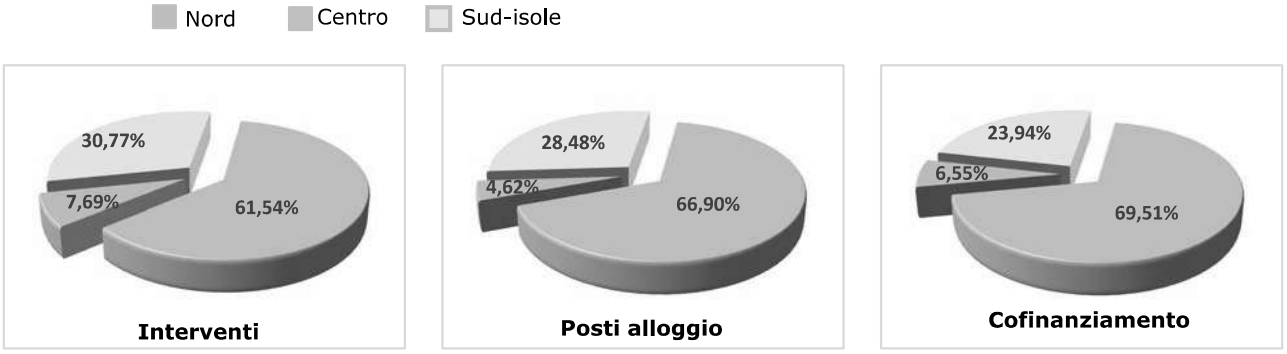


Figura 7. Tipologia A2: interventi, posti alloggio e cofinanziamento per area geografica.

La tabella 14 suddivide gli interventi cofinanziati di tipologia A1, B e C per area geografica: al nord sono attivi 36 interventi, che rappresentano il 58,06% del totale, con una disponibilità di 3.996 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 125.826.151; al centro sono attivi 14 interventi, che rappresentano il 22,58% del totale, con una disponibilità di 1.697 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 64.118.025; al sud-isole sono attivi 12 interventi, che rappresentano il 19,35% del totale, con una disponibilità di 1.238 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 62.053.290.

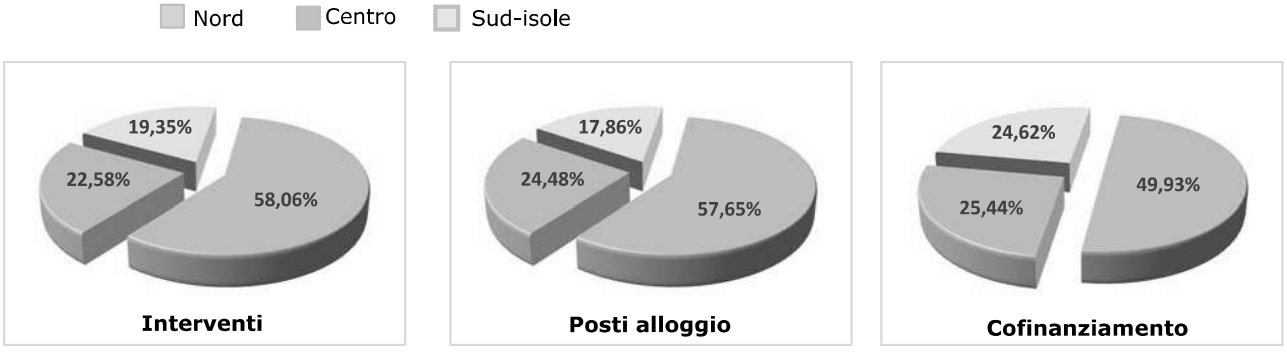


Figura 8. Tipologia A1, B, C: interventi, posti alloggio e cofinanziamento per area geografica.

La tabella 15 suddivide gli interventi cofinanziati di tipologia A1, B e C per tipologia: gli interventi sull'esistente (manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, nell'ambito dei quali è possibile effettuare operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza) sono

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot. 2026/0000778/RI

48, che rappresentano il 77,42% del totale, con una disponibilità di 5.066 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 179.375.616; gli interventi di nuova realizzazione o ampliamento di residenze per studenti universitari sono n. 9, che rappresentano il 14,52% del totale, con una disponibilità 1.387 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 58.726.332; gli acquisti di edifici da adibire a residenze per studenti sono n. 5, che rappresentano il 8,06% del totale, con una disponibilità di 478 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 13.895.518.



Figura 9. Tipologia A1, B, C: interventi, posti alloggio e cofinanziamento per tipologia.

Di seguito si documenta nel dettaglio lo stato di attuazione dei 75 interventi attivi, di cui 13 interventi di tipologia A2, per un totale di 8.360 posti alloggio (di cui 1.865 p.a. nuovi, con 1.387 p.a. derivanti da edifici di nuova costruzione e acquisti di edifici da destinare a residenza per studenti universitari e 478 p.a. derivanti dal recupero di edifici da destinare a residenza o dall'ampliamento di strutture ricettive già esistenti) e un cofinanziamento complessivo da parte del MUR di € 256.988.510:

- n. 32 interventi (tabella 16) sono funzionanti, di cui 12 di tipologia A2, (n. 20 al nord, n. 6 al centro e n. 6 al sud-isole) che rappresentano il 42,67% del totale, con una disponibilità di 3.165 posti alloggio, per un importo di cofinanziamento complessivo pari a € 51.855.130. Gli interventi sull'esistente sono n. 30 per un totale di 2.868 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 42.899.033; gli interventi di nuova edificazione sono n. 2, per un totale di 297 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 8.956.097;
- n. 11 interventi (tabella 17) sono funzionanti ma non formalmente conclusi (n. 10 al nord, n. 1 al centro) e rappresentano il 14,67%% del totale, con una disponibilità di 1.175 posti alloggio, per un cofinanziamento pari a € 25.510.171.
- n. 11 interventi (tabella 18) sono in corso di realizzazione e in funzione nel 2026 (n. 5 al nord, n. 5 al centro e n. 1 al sud-isole) che rappresentano il 14,67%% del totale, con una disponibilità di 1.621 posti alloggio, per un cofinanziamento complessivo di € 70.322.916.
- n. 21 interventi (tabella 19), entreranno in funzione successivamente al 2026. Gli interventi che entreranno in funzione successivamente al 2026 rappresentano il 28% del totale, con una disponibilità di 2.399 posti alloggio e un cofinanziamento di € 109.300.293.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 10 - Le domande presentate IV bando

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip*	p.a.	Richiesta €
501	Università della Calabria	Calabria	Rende (CS)	A2	170	242.844
502	Fondazione C.E.U.R.	Em. Rom.	Bologna	A2	124	403.146
503	Fondazione Collegio San Carlo	Em. Rom.	Modena	A2	42	561.344
504	Fond. Istituto "Mons. F. Tomadini"	Friuli V. G.	Udine	A2	258	250.000
505	Fondazione RUI	Lazio	Roma	A2	66	504.760
506	Fondazione C.E.U.R.	Lombardia	Milano	A2	95	445.997
507	Fond. Collegio Università Milanesi	Lombardia	Milano	A2	112	501.675
508	Fondazione Pier Giorgio Falciola	Lombardia	Milano	A2	193	519.585
509	Istituto G. Toniolo di Studi Superiori	Lombardia	Milano	A2	132	429.000
510	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A2	0[2]	595.650
511	A.DI.S.U. Puglia	Puglia	Bari	A2	96	488.730
512	E.R.S.U. Catania	Sicilia	Catania	A2	54	317.562
513	Fondazione C.E.U.R.	Sicilia	Catania	A2	87	404.014
514	Azienda D.S.U. Chieti-Pescara	Abruzzo	Chieti	A1	149	12.206.931
515	ADSU L'Aquila	Abruzzo	L'Aquila	A1	51	2.467.533
516[1]	Azienda D.S.U. Chieti-Pescara	Abruzzo	Pescara	A1	42	5.400.000
517[1]	Azienda D.S.U. Chieti-Pescara	Abruzzo	Pescara	B	24	0
Fasc.	**Soggetto**	**Regione**	**Città**	**Tip***	**p.a.**	**Richiesta €**
518	Biblos Soc. Coop. Universitaria	Abruzzo	Pescara	A1	40	618.714
519	ADSU Teramo	Abruzzo	Teramo	A1	206	9.970.000
520	Fond. Università Magna Graecia	Calabria	Catanzaro	A1	143	6.773.368
521	Università della Calabria	Calabria	Rende (CS)	A1	50	1.262.649
522	I.P.E. Napoli	Campania	Napoli	A1	50	2.016.928
523	Università degli Studi di Salerno	Campania	Fisciano (SA)	B	152	6.839.571
524[1]	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	A1	40	5.500.000
525[1]	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	A1	0	0
526[1]	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	A1	17	0
527[1]	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	A1	0	0
528[1]	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	B	79	4.963.247
529[1]	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	A1	0	0
530	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	A1	131	8.457.200
531	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	A1	90	7.927.440
532	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	A1	60	5.750.000
533	Fondazione C.E.U.R.	Em. Rom.	Bologna	A1	77	2.549.693
534[1]	Nuovo Mondo Società Cooperativa	Em. Rom.	Bologna	C	33	1.587.200
535[1]	Nuovo Mondo Società Cooperativa	Em. Rom.	Bologna	C	60	3.264.000
536[1]	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Imola (BO)	A1	45	5.000.000
537[1]	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Imola (BO)	A1	6	0
538	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Forlì (FC)	C	64	4.595.560
539	Università degli Studi di Parma	Em. Rom.	Parma	A1	87	4.358.528
540	Fondazione Flaminia	Em. Rom.	Ravenna	A1	112	3.648.856
541	ER.GO	Em. Rom.	Reggio Emilia	A1	75	5.896.000
542	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Rimini	A1	65	5.278.000
543	ARDISS Friuli V.G.	Friuli V. G.	Udine	A1	286	1.184.247
544	Sapienza Università di Roma	Lazio	Latina	A1	112	6.768.998
545	Collegio Universitario D. N. Mazza	Lazio	Roma	A1	84	2.336.718
546	CUIR di Roma	Lazio	Roma	A1	57	8.591.839
547	Fondazione C.E.U.R.	Lazio	Roma	A1	178	7.329.353
548	Istituto G. Toniolo di Studi Superiori	Lazio	Roma	A1	250	6.884.299

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

549	Sapienza Università di Roma	Lazio	Roma	A1	200	11.380.067
551	ALFA Liguria	Liguria	Genova	A1	182	8.571.885
552	ALFA Liguria	Liguria	Genova	A1	137	7.005.391
553	ALFA Liguria	Liguria	Savona	A1	43	1.929.489
554	Università Degli Studi Di Bergamo	Lombardia	Bergamo	A1	230	12.001.539
555	Conservatorio "L. Marenzio"	Lombardia	Darfo B. T (BS)	A1	40	699.997
556	Fond. Collegio Università Milanesi	Lombardia	Milano	B	57	2.935.416
557	Fondazione RUI	Lombardia	Milano	A1	62	2.538.513
558	Humanitas University	Lombardia	Pieve E. (MI)	B	240	6.215.000
559	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	246	14.961.662
560	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	213	10.644.000
561	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	375	892.250
562	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	182	2.190.000
563	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	59	1.005.000
564	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	146	1.712.500
565	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Sesto S. G. (MI)	C	200	7.150.500
566	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Vedano L. (MB)	B	165	5.330.124
567	EdiSU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	75	594.549
568	Fondazione Collegio Ghislieri	Lombardia	Pavia	A1	200	770.394
569[1]	Fond. Collegio S. Caterina da Siena	Lombardia	Pavia	A1	16	950.000
570[1]	Fond. Collegio S. Caterina da Siena	Lombardia	Pavia	A1	79	350.000

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip*	p.a.	Richiesta €
571	ERAP Marche	Marche	Ancona	A1	49	2.694.433
572	Università Politecnica Marche	Marche	Ancona	A1	59	3.241.975
573	ERSU di Macerata	Marche	Macerata	A1	48	537.998
574	Università degli Studi di Macerata	Marche	Macerata	A1	65	4.814.915
575	ERSU Camerino	Marche	Camerino (MC)	A1	254	5.312.970
576	ERSU Urbino	Marche	Urbino (PU)	A1	352	1.184.558
577[1]	Università di Urbino Carlo Bo	Marche	Urbino (PU)	A1	256	3.180.630
578[1]	Università di Urbino Carlo Bo	Marche	Urbino (PU)	A1	152	0
579[1]	Università di Urbino Carlo Bo	Marche	Urbino (PU)	A1	222	3.708.670
580[1]	Università di Urbino Carlo Bo	Marche	Urbino (PU)	A1	150	0
581	Università degli Studi di Torino	Piemonte	Savigliano (CN)	A1	48	4.354.490
582	Università del Piemonte Orientale	Piemonte	Novara	A1	129	724.401
583	Collegio Universitario R. Einaudi	Piemonte	Torino	A1	41	1.444.661
584	Collegio Universitario R. Einaudi	Piemonte	Torino	A1	148	3.956.238
585	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1	70	1.427.171
586	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1	60	1.871.834
587	Torino	Piemonte	Torino	C	171	0
588	Università degli Studi di Torino	Piemonte	Torino	B	88	5.210.080
589	A.DI.S.U. Puglia	Puglia	Bari	A1	80	4.620.000
590	Università degli Studi di Bari	Puglia	Taranto	A1	44	4.045.700
591	E.R.S.U. Cagliari	Sardegna	Cagliari	A1	186	1.740.000
592	E.R.S.U. Catania	Sicilia	Catania	A1	59	2.450.000
593	Università degli Studi di Catania	Sicilia	Catania	A1	87	4.290.200
594	Università Kore di Enna	Sicilia	Enna	B	234	8.057.949
595	E.R.S.U. di Messina	Sicilia	Messina	C	115	2.000.000
596	Università degli Studi di Messina	Sicilia	Messina	A1	206	15.495.494
597	ERSU Palermo	Sicilia	Palermo	A1	120	1.226.500
598	ERSU Palermo	Sicilia	Palermo	A1	43	3.923.523
599	Fondazione C. R. di Lucca	Toscana	Lucca	A1	100	4.230.000
600	Scuola Normale Superiore	Toscana	Pisa	A1	91	1.734.983

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

601	DSU Toscana	Toscana	Siena	A1	100	787.413
602	Cons. Formazione Cultura Servizi	Trentino	Trento	B	133	4.852.386
603	Università Degli Studi di Trento	Trentino	Trento	B	200	11.449.560
604[1]	A.D.I.S.U Umbria	Umbria	Perugia	A1	109	6.530.665
605[1]	A.D.I.S.U Umbria	Umbria	Perugia	A1	0	6.530.665
606	A.T.E.R. Umbria	Umbria	Perugia	C	150	4.500.000
607	Fondazione "Gregorianum"	Veneto	Padova	A1	80	940.000
608	Università degli Studi di Padova	Veneto	Padova	A1	187	11.555.088
609	Centro di Pastorale Universitaria	Veneto	Venezia	A1	73	450.000
610	ESU Venezia	Veneto	Marghera (VE)	B	87	3.048.086
109			**Totale**		**12.339**	**403.042.691**

* Le tipologie di intervento, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 937/2016 sono:
A1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza;
A2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie;
B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di strutture residenziali universitarie;
C) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie
[1] Interventi inseriti in un programma unitario..
[2] Programma unitario con l'intervento di cui al F. 561, i posti alloggio sono stati conteggiati una sola volta.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 11 - Il cofinanziamento degli interventi IV bando

Interventi di tipologia A2 ammessi (Decreto di Piano del 12.12.2018, n. 852)

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
501	Università della Calabria	Calabria	Rende (CS)	A2	170	242.844
502	Fondazione CEUR	Emilia-Romagna	Bologna	A2	124	403.146
503	Fondazione Collegio S. Carlo	Emilia-Romagna	Modena	A2	42	561.344
504	Fondazione Istituto "Mons. Francesco Tomadini"	Friuli-Venezia Giulia	Udine	A2	258	250.000
505	Fondazione RUI	Lazio	Roma	A2	66	504.760
506	Fondazione CEUR	Lombardia	Milano	A2	95	445.997
507	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	Milano	A2	112	501.675
508	Fondazione Pier Giorgio Falciola	Lombardia	Milano	A2	193	519.585
509	Istituto Giuseppe Toniolo	Lombardia	Milano	A2	132	429.000
510[1]	Politecnico Milano	Lombardia	Milano	A2	0[1]	595.650
511	ADISU Puglia	Puglia	Bari	A2	96	488.730
512	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A2	54	317.562
513	Fondazione CEUR	Sicilia	Catania	A2	87	404.014
13				**Totale**	**1.430**	**5.664.307**

[1] Programma unitario con l'intervento di cui al F. 561, i posti alloggio sono stati conteggiati una sola volta.

Interventi di tipologia A1, B e C inseriti nel Decreto di Piano del 12.12.2018, n. 853 e ammessi al cofinanziamento con le risorse disponibili

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
518	BIBLOS Società Cooperativa Universitaria	Abruzzo	Pescara	A1	40	618.714
520	Fondazione Università Magna Graecia Catanzaro	Calabria	Catanzaro	A1	143	6.773.368
522	I.P.E. – Istituto per ricerche ed attività educative	Campania	Napoli	A1	50	2.016.928
524[1] 525[1] 526[1]	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	A1	40 0 17	4.074.699
533	Fondazione C.E.U.R.	Emilia-Romagna	Bologna	A1	77	2.364.893
534[1] 535[1]	Nuovo Mondo Società Cooperativa	Emilia-Romagna	Bologna	C	33 60	1.587.200 3.264.000
536	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia-Romagna	Imola (BO)	A1	45	2.262.174
539	Università degli Studi di Parma	Emilia-Romagna	Parma	A1	87	4.301.978
545	Collegio Universitario Don Nicola Mazza	Lazio	Roma	A1	84	2.336.718
546	CUIR – Roma	Lazio	Roma	A1	57	6.740.515
547	Fondazione C.E.U.R.	Lazio	Roma	A1	178	7.329.353
548	Istituto Toniolo	Lazio	Roma	B	250	6.829.399
549	Sapienza Università di Roma	Lazio	Roma	A1	200	11.380.067

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/IN

556	Fondazione Collegio delle Università Milanesi	Lombardia	Milano	B	57	2.935.416
557	Fondazione RUI	Lombardia	Milano	A1	62	2.538.513
558	Humanitas University	Lombardia	Pieve Emanuele (MI)	B	240	6.215.000
560	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	213	10.301.200
561	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	375	892.250
564	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	146	1.712.500
573	ERSU di Macerata	Marche	Macerata	A1	48	537.998
574	Università di Macerata	Marche	Macerata	A1	65	4.814.915
575	ERSU Camerino	Marche	Camerino (MC)	A1	254	5.312.970
576	ERSU Urbino	Marche	Urbino	A1	352	1.184.558
582	Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"	Piemonte	Novara	A1	129	724.401
583	Collegio "R. EINAUDI"	Piemonte	Torino	A1	41	1.411.922
589	A.DI.S.U. Puglia	Puglia	Bari	A1	80	4.512.000
597	ERSU Palermo	Sicilia	Palermo	A1	120	1.226.500
600	Scuola Normale Superiore	Toscana	Pisa	A1	91	1.734.983
607	Fondazione "Gregorianum"	Veneto	Padova	A1	80	940.000
608	Università degli Studi di Padova	Veneto	Padova	A1	187	11.555.088
609	Centro di Pastorale Santa Fosca	Veneto	Venezia	A1	73	450.000
610	ESU di Venezia	Veneto	Marghera (VE)	B	87	3.048.086
35				**Totale**	**4.061**	**123.928.306**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.

Interventi ammessi definitivamente al cofinanziamento nel 2019

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
519[2]	ADSU Teramo	Abruzzo	Teramo	A1	206	9.970.000
541[3]	ER.GO	Emilia-Romagna	Reggio Emilia	A1	75	5.896.000
559[2]	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	246	14.961.662
569[3]	Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena[1]	Lombardia	Pavia	A1	16	950.000
570[3]				A1	79	350.000
5				**Totale**	**622**	**32.127.662**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.
[2] Interventi ammessi definitivamente al cofinanziamento il 13/05/2019.
[3] Interventi ammessi definitivamente al cofinanziamento il 29/11/2019.

Interventi ammessi definitivamente al cofinanziamento nel 2020

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
551[1]	ALFA Liguria	Liguria	Genova	A1	182	8.571.885
544[2]	Sapienza Università di Roma	Lazio	Latina	A1	112	6.768.998
584[2]	Collegio "R. Einaudi" Torino	Piemonte	Torino	A1	148	3.956.238
585[2]	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1	70	1.427.171
562[2]	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	182	2.186.973
Fasc.	**Soggetto**	**Regione**	**Città**	**Tip**	**p.a.**	**Cofin. €**

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

552[2]	ALFA Liguria	Liguria	Genova	A1	137	7.005.391
567[2]	EdiSU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	75	550.629
553[2]	ALFA Liguria	Liguria	Savona	A1	43	1.929.489
587[2]	Providence House	Piemonte	Torino	C	171	3.500.000
514[2]	ADSU Chieti-Pescara	Abruzzo	Chieti	A1	149	11.849.541
595[2]	E.R.S.U. Messina	Sicilia	Messina	C	115	2.000.000
11				**Totale**	**1.384**	**49.746.315**

[1] Intervento ammessi definitivamente al cofinanziamento il 27/02/2020.
[2] Interventi ammessi definitivamente al cofinanziamento il 21/07/2020.

Interventi ammessi definitivamente al cofinanziamento nel 2021

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
530[1]	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia R.	Bologna	B	131	8.457.200
599[1]	Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	Toscana	Lucca	A1	100	4.230.000
586[1]	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1	60	1.871.834
598[1]	ERSU Palermo	Sicilia	Palermo	A1	43	2.942.642
538[1]	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia R.	Forlì (FC)	C	64	1.044.318
572[1]	Università Politecnica delle Marche	Marche	Ancona	A1	59	3.241.975
531[1]	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia R.	Bologna	A1	90	7.802.890
543[1]	ARDiSS Friuli Venezia Giulia	Friuli V.G.	Udine	A1	286	1.184.247
516[1]	ADSU Chieti-Pescara	Abruzzo	Pescara	A1	42	5.314.400
517[1]				B	24	
571[1]	ERAP Marche	Marche	Ancona	A1	49	2.692.909
563[1]	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	59	1.005.000
542[1]	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia R.	Rimini	A1	65	5.278.000
606[1]	A.T.E.R. Umbria	Umbria	Perugia	C	150	4.500.000
540[1]	Fondazione Flaminia	Emilia R.	Ravenna	A1	112	3.643.357
581[1]	Università degli Studi di Torino	Piemonte	Savigliano (CN)	A1	48	3.326.617
592[1]	E.R.S.U. Catania	Sicilia	Catania	A1	59	2.450.000
566[1]	Università degli Studi di Milano – Bicocca	Lombardia	Vedano al Lambro (MB)	B	165	5.330.124
593[2]	Università di Catania	Sicilia	Catania	A1	87	4.290.200
603[3]	Università degli Studi di Trento	Trentino A.A.	Trento	B	200	10.197.209
523[4]	Università di Salerno	Campania	Fisciano (SA)	B	152	6.839.571
596[5]	Università di Messina	Sicilia	Messina	A1	206	12.849.897
22				**Totale**	**2.251**	**98.492.390**

[1] Interventi ammessi definitivamente al cofinanziamento il 07/07/2021.
[2] Interventi ammessi definitivamente al cofinanziamento il 30/07/2021.
[3] Interventi ammessi definitivamente al cofinanziamento il 18/10/2021.
[4] Interventi ammessi definitivamente al cofinanziamento il 08/11/2021.
[5] Interventi ammessi definitivamente al cofinanziamento il 30/12/2021.

Interventi ammessi definitivamente al cofinanziamento nel 2022

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
594	Università Kore di Enna	Sicilia	Enna	B	234	8.011.786
1				**Totale**	**234**	**8.011.786**

[1] Intervento ammesso definitivamente al cofinanziamento il 28/12/2022.

87	**Totale generale tabella 11**	**9.982**	**317.970.766**

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN**

Tabella 12 - Gli interventi che hanno rinunciato al cofinanziamento, non ammessi o esclusi IV bando

Interventi che hanno trasmesso rinuncia prima dell'emanazione del Decreto di Piano

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
527	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	A1	0	1.425.301
532	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	A1	60	5.750.000
2				**Totale**	**60**	**7.175.301**

Interventi non ammessi al cofinanziamento

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
521	Università della Calabria	Calabria	Rende (CS)	A1	50	1.262.649
528	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	B	79	4.963.247
529	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	A1	0	0
537	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Imola (BO)	A1	6	0
554	Università Degli Studi Di Bergamo	Lombardia	Bergamo	A1	230	12.001.539
565	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Sesto SG (MI)	C	200	7.150.500
568	Fondazione Collegio Ghislieri	Lombardia	Pavia	A1	200	770.394
578	Università di Urbino Carlo Bo	Marche	Urbino (PU)	A1	152	0
579	Università di Urbino Carlo Bo	Marche	Urbino (PU)	A1	222	3.708.670
591	E.R.S.U. Cagliari	Sardegna	Cagliari	A1	186	1.740.000
601	DSU Toscana	Toscana	Siena	A1	100	787.413
602	Cons. Formazione Cultura Servizi	Trentino	Trento	B	133	4.852.386
604	A.D.I.S.U Umbria	Umbria	Perugia	A1	109	6.530.665
605	A.D.I.S.U Umbria	Umbria	Perugia	A1	0	0
14				**Totale**	**1.667**	**43.767.463**

Interventi che hanno rinunciato o esclusi dal cofinanziamento successivamente all'emanazione del Decreto di Piano

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
515[1]	ADSU L'Aquila	Abruzzo	L'Aquila	A1	51	2.467.533
531[1]	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Bologna	A1	90	7.802.890
542[1]	Alma Mater Studiorum di Bologna	Em. Rom.	Rimini	A1	42	5.278.000

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
543[2]	ARDISS Friuli Venezia Giulia	Friuli V.G.	Udine	A1	286	1.184.247
553[1]	ALFA Liguria	Liguria	Savona	A1	40	1.929.489
555[1]	Conservatorio L. Marenzio	Lombardia	Darfo Boario Terme (BS)	A1	40	699.997
566[1]	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Vedano al Lambro (MB)	B	165	5.330.124
576[1]	ERSU Urbino	Marche	Urbino (PU)	A1	352	1.184.558
577[1]	Università di Urbino	Marche	Urbino (PU)	A1	256	2.225.627
580[1]	Università di Urbino	Marche	Urbino (PU)	A1	150	1.226.311
581[1]	Università di Torino	Piemonte	Torino	A1	48	3.326.617
586[1]	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1	60	1.871.834
588[1]	Università di To	Piemonte	Torino	B	8	5.210.080

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

590[1]	Università di Bari	Puglia	Taranto	A1	44	3.874.100
594[1]	Università di Enna KORE	Sicilia	Enna	B	234	8.011.786
595[2]	ERSU Messina	Sicilia	Messina	C	115	2.000.000
597[2]	ERSU Palermo	Sicilia	Palermo	A1	120	1.212.496
598[1]	ERSU Palermo	Sicilia	Palermo	A1	43	2.942.642
18				**Totale**	**2.224**	**57.778.331**

34	**Totale generale tabella 12**	**3.951**	**108.721.095**

[1] Rinuncia
[2] Esclusione

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN**

Tabella 13 - Gli interventi tipologia A2 attivi, suddivisi per area geografica IV bando

NORD

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
502	Fondazione CEUR	Emilia-Romagna	Bologna	A2	124	354.608
503	Fondazione Collegio S. Carlo	Emilia-Romagna	Modena	A2	42	509.112
504	Fondazione Istituto "Mons. Francesco Tomadini"	Friuli-Venezia Giulia	Udine	A2	258	186.745
506	Fondazione CEUR	Lombardia	Milano	A2	95	360.800
507	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	Milano	A2	112	501.547
508	Fondazione Pier Giorgio Falciola	Lombardia	Milano	A2	193	511.347
509	Istituto Giuseppe Toniolo	Lombardia	Milano	A2	132	392.853
510[1]	Politecnico Milano	Emilia-Romagna	Milano	A2	0[1]	595.650
8				**Totale**	**956**	**3.412.662[2]**

CENTRO

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
505	Fondazione RUI	Lazio	Roma	A2	66	321.638
1				**Totale**	**66**	**321.638[2]**

SUD E ISOLE

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
511	ADISU Puglia	Sud	Bari	A2	96	457.586
501	Università della Calabria	Sud	Rende (CS)	A2	170	151.250
512	ERSU Catania	Isole	Catania	A2	54	209.479
513	Fondazione CEUR	Isole	Catania	A2	87	356.836
4				**Totale**	**407**	**1.175.151[2]**

[1] Programma unitario con l'intervento di cui al F. 561, i posti alloggio sono stati conteggiati una sola volta.
[2] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 14 - Gli interventi tipologia A1, B e C attivi, suddivisi per area geografica IV bando

NORD

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
524[1] 525[1] 526[1]	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	A1	40 0 17	3.017.528
530	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	B	131	8.346.946
533	Fondazione C.E.U.R.	Emilia-Romagna	Bologna	A1	77	2.133.378
534[1]	Nuovo Mondo Società Cooperativa	Emilia-Romagna	Bologna	C	33	1.587.200
535[1]					60	3.264.000
536	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia-Romagna	Imola (BO)	A1	45	2.170.186
538	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia-Romagna	Forlì (FC)	C	64	1.044.318
539	Università degli Studi di Parma	Emilia-Romagna	Parma	A1	87	3.822.194
540	Fondazione Flaminia	Emilia-Romagna	Ravenna	A1	112	3.643.357
541	ER.GO	Emilia-Romagna	Reggio E.	A1	75	5.034.905
551	ALFA Liguria	Liguria	Genova	A1	182	7.854.073
552	ALFA Liguria	Liguria	Genova	A1	137	6.350.939
556	Fondazione Collegio delle Università Milanesi	Lombardia	Milano	B	57	2.802.644
557	Fondazione RUI	Lombardia	Milano	A1	62	2.437.328
558	Humanitas University	Lombardia	Pieve Emanuele (MI)	B	240	6.153.453
559	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	246	14.961.662
560	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	213	10.301.200
561	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	375	892.250
562	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	182	1.724.675
563	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	59	1.005.000
564	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	146	1.474.541[2]
567	EdiSU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	75	464.087
569[1]	Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena	Lombardia	Pavia	A1	16	1.169.282
570[1]					79	

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
582	Università degli Studi del Piemonte Orientale	Piemonte	Novara	A1	129	519.307
583	Collegio "R. EINAUDI"	Piemonte	Torino	A1	41	1.334.397
584	Collegio "R. EINAUDI"	Piemonte	Torino	A1	148	3.732.978
585	EDISU-Piemonte	Piemonte	Torino	A1	70	1.154.486
587	Providence House	Piemonte	Torino	C	171	3.500.000
603	Università degli Studi di Trento	Trentino-Alto Adige	Trento	B	200	10.190.241
607	Fondazione "Gregorianum"	Veneto	Padova	A1	80	940.000
608	Università degli Studi di Padova	Veneto	Padova	A1	187	9.695.349
609	Centro di Pastorale Santa Fosca	Veneto	Venezia	A1	73	450.000
610	ESU di Venezia	Veneto	Marghera (VE)	B	87	2.654.247

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

36				**Totale**	**3.996**	**125.826.151[2]**

CENTRO

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
544	Sapienza Università di Roma	Lazio	Latina	A1	112	6.768.998
545	Collegio Universitario Don Nicola Mazza	Lazio	Roma	A1	84	2.226.095
546	CUIR – Roma	Lazio	Roma	A1	57	5.624.809
547	Fondazione C.E.U.R.	Lazio	Roma	A1	178	6.837.576
548	Istituto Toniolo	Lazio	Roma	B	250	6.777.568
549	Sapienza Università di Roma	Lazio	Roma	A1	200	9.556.132
571	ERAP Marche	Marche	Ancona	A1	49	2.692.909
572	Università Politecnica delle Marche	Marche	Ancona	A1	59	3.239.162
573	ERSU di Macerata	Marche	Macerata	A1	48	389.291
574	Università di Macerata	Marche	Macerata	A1	65	4.814.915
575	ERSU Camerino	Marche	Camerino (MC)	A1	254	4.809.533
599	Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	Toscana	Lucca	A1	100	4.230.000
600	Scuola Normale Superiore	Toscana	Pisa	A1	91	1.651.037
606	A.T.E.R. Umbria	Umbria	Perugia	C	150	4.500.000
14				**Totale**	**1.697**	**64.118.025[2]**

SUD E ISOLE

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
514	ADSU Chieti-Pescara	Abruzzo	Chieti	A1	149	11.710.801
516[1]	ADSU Chieti-Pescara	Abruzzo	Pescara	A1	42	4.668.414
517[1]				B	24	
518	BIBLOS Società Cooperativa Universitaria	Abruzzo	Pescara	A1	40	603.196
519	ADSU Teramo	Abruzzo	Teramo	A1	206	9.970.000
520	Fondazione Magna Graecia Catanzaro	Calabria	Catanzaro	A1	143	6.515.157
522	I.P.E. – Istituto per ricerche ed attività educative	Campania	Napoli	A1	50	1.645.289
523	Università di Salerno	Campania	Fisciano (SA)	B	152	6.839.571
589	A.DI.S.U. Puglia	Puglia	Bari	A1	80	4.028.416
592	E.R.S.U. Catania	Sicilia	Catania	A1	59	2.165.022
593	Università di Catania	Sicilia	Catania	A1	87	4.280.609
596	Università di Messina	Sicilia	Messina	A1	206	9.626.815
12				**Totale**	**1.238**	**62.053.290[2]**

[1] Intervento inserito in un programma unitario.
[2] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 15 - Gli interventi A1, B e C attivi suddivisi per tipologia IV bando

INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip.	p.a.	Cofin. €
514	ADSU Chieti-Pescara	Abruzzo	Chieti	A1	149	11.710.801
516[1]	ADSU Chieti-Pescara	Abruzzo	Pescara	A1	42	4.668.414
518	BIBLOS Società Cooperativa Universitaria	Abruzzo	Pescara	A1	40	603.196
519	ADSU Teramo	Abruzzo	Teramo	A1	206	9.970.000
520	Fondazione Magna Graecia Catanzaro	Calabria	Catanzaro	A1	143	6.515.157
522	I.P.E. – Istituto per ricerche ed attività educative	Campania	Napoli	A1	50	1.645.289
524[1] 525[1] 526[1]	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia R.	Bologna	A1	40 0 17	3.017.528
533	Fondazione C.E.U.R.	Emilia R.	Bologna	A1	77	2.133.378
536	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia R.	Imola (BO)	A1	45	2.170.186
539	Università degli Studi di Parma	Emilia R.	Parma	A1	87	3.822.194
540	Fondazione Flaminia	Emilia R.	Ravenna	A1	112	3.643.357
541	ER.GO	Emilia R.	Reggio Emilia	A1	75	5.034.905
544	Sapienza Università di Roma	Lazio	Latina	A1	112	6.768.998
545	Collegio Universitario Don Nicola Mazza	Lazio	Roma	A1	84	2.226.095
546	CUIR – Roma	Lazio	Roma	A1	57	5.624.809
547	Fondazione C.E.U.R.	Lazio	Roma	A1	178	6.837.576
549	Sapienza Università di Roma	Lazio	Roma	A1	200	9.556.132
551	ALFA Liguria	Liguria	Genova	A1	182	7.854.073
552	ALFA Liguria	Liguria	Genova	A1	137	6.350.939
557	Fondazione RUI	Lombardia	Milano	A1	62	2.437.328
560	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	213	10.301.200
561	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	375	892.250
562	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	182	1.724.675
563	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	59	1.005.000
564	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	146	1.474.541

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip.	p.a.	Cofin. €
567	EdiSU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	75	464.087
569[1] 570[1]	Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena	Lombardia	Pavia	A1	16 79	1.169.282
571	ERAP Marche	Marche	Ancona	A1	49	2.692.909
572	Università Politecnica delle Marche	Marche	Ancona	A1	59	3.239.162
573	ERSU di Macerata	Marche	Macerata	A1	48	389.291
574	Università di Macerata	Marche	Macerata	A1	65	4.814.915
575	ERSU Camerino	Marche	Camerino (MC)	A1	254	4.809.533
582	Università Piemonte Orientale	Piemonte	Novara	A1	129	519.307
583	Collegio "R. EINAUDI"	Piemonte	Torino	A1	41	1.334.397
584	Collegio "R. EINAUDI"	Piemonte	Torino	A1	118	3.732.978

Camera dei Deputati ARRIVO 12 maggio 2026 Prot. 2026/0000778/TN

585	EDISU-Piemonte	Piemonte	Torino	A1	70	1.154.486
589	A.DI.S.U. Puglia	Puglia	Bari	A1	80	4.028.416
592	E.R.S.U. Catania	Sicilia	Catania	A1	59	2.165.022
593	Università di Catania	Sicilia	Catania	A1	87	4.280.609
596	Università di Messina	Sicilia	Messina	A1	206	9.626.815
599	Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	Toscana	Lucca	A1	100	4.230.000
600	Scuola Normale Superiore	Toscana	Pisa	A1	91	1.651.037
607	Fondazione "Gregorianum"	Veneto	Padova	A1	80	940.000
608	Università degli Studi di Padova	Veneto	Padova	A1	187	9.695.349
609	Centro di Pastorale Santa Fosca	Veneto	Venezia	A1	73	450.000
48				**Totale**	**5.066**	**179.375.616**

NUOVE COSTRUZIONI O AMPLIAMENTI

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
517[1]	ADSU Chieti-Pescara	Abruzzo	Pescara	B	24	0
523	Università di Salerno	Campania	Fisciano (SA)	B	152	6.839.571
530	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	B	131	8.346.946
548	Istituto Toniolo	Lazio	Roma	B	250	6.777.568
556	Fondazione Collegio delle Università Milanesi	Lombardia	Milano	B	57	2.802.644
558	Humanitas University	Lombardia	Pieve Emanuele (MI)	B	240	6.153.453
559	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	246	14.961.662
603	Università degli Studi di Trento	Trentino-Alto Adige	Trento	B	200	10.190.241
610	ESU ARDSU di Venezia	Veneto	Marghera (VE)	B	87	2.654.247
9				**Totale**	**1.387**	**58.726.332[2]**

ACQUISTI

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
534[1]	Nuovo Mondo	Emilia-Romagna	Bologna	C	33	1.587.200
535[1]	Società Cooperativa				60	3.264.000
538	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	Emilia-Romagna	Forlì (FC)	C	64	1.044.318
587	Providence House	Piemonte	Torino	C	171	3.500.000
606	A.T.E.R. Umbria	Umbria	Perugia	C	150	4.500.000
5				**Totale**	**478**	**13.895.518[2]**

[1] Intervento inserito in un programma unitario.
[2] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 16 - Gli interventi conclusi e funzionanti IV bando

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Piena funzionalità	Cofin. € [1]
501	Università della Calabria	Calabria	Rende (CS)	A2	170	17/11/22	151.250
502	Fondazione CEUR	Emilia Romagna	Bologna	A2	124	13/02/19	354.608
503	Fondazione Collegio S. Carlo	Emilia Romagna	Modena	A2	42	08/01/18	509.112
504	Istituto Tomadini	Friuli Venezia Giulia	Udine	A2	258	(1)	186.745
505	Fondazione RUI	Lazio	Roma	A2	66	(1)	321.638
506	Fondazione CEUR	Lombardia	Milano	A2	95	21/02/19	360.800
507	Collegio Università Milanesi	Lombardia	Milano	A2	112	(1)	501.547
508	Fondazione CEUR	Lombardia	Milano	A2	193	14/03/19	511.347
509	Istituto Toniolo	Lombardia	Milano	A2	132	(1)	392.852
511	ADISU Puglia	Puglia	Bari	A2	96	01/10/20	457.586
512	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A2	54	12/10/22	209.479
513	Fondazione CEUR	Sicilia	Catania	A2	87	22/01/21	356.836
518	Coop. Univer. Biblos	Abruzzo	Pescara	A1	40	01/10/22	603.196
522	IPE Napoli	Campania	Napoli	A1	50	02/09/19	1.645.889
533	Fondazione CEUR	Emilia Romagna	Bologna	A1	77	14/10/22	2.133.378
534	Cooperativa Nuovo Mondo	Emilia Romagna	Bologna	C	33	28/10/21	4.851.200
535	Cooperativa Nuovo Mondo	Emilia Romagna	Bologna	C	60	28/10/21	
538	Università di Bologna	Emilia Romagna	Forlì	C	64	26/10/23	1.044.318
545	Collegio Don Nicola Mazza	Lazio	Roma	A1	84	05/09/20	2.226.095
547	Fondazione CEUR	Lazio	Roma	A1	178	31/10/21	6.837.576
556	Collegio Università Milanesi	Lombardia	Milano	B	57	29/04/24	2.802.644
557	Fondazione RUI	Lombardia	Milano	A1	62	20/12/22	2.437.327
558	Humanitas University	Lombardia	Pieve Emanuele (MI)	B	240	28/08/18	6.153.453
569	Collegio S. Caterina da Siena	Lombardia	Pavia	A1	16	01/09/23	1.169.282
570	Collegio S. Caterina da Siena	Lombardia	Pavia	A1	79	01/09/23	0
573	ERSU Macerata (ora ERDIS Marche)	Marche	Macerata	A1	48	25/09/23	389.291
582	Università Piemonte Orientale	Piemonte	Novara	A1	129	31/01/24	519.306
583	Collegio Einaudi	Piemonte	Torino	A1	41	31/08/21	1.334.397
584	Collegio Einaudi	Piemonte	Torino	A1	148	08/01/23	3.723.978
599	Fondazione CR Lucca	Toscana	Lucca	A1	100	27/02/23	4.230.000
606	ATER Umbria	Umbria	Perugia	C	150	01/10/18	4.500.000
607	Fondazione Gregorianum	Veneto	Padova	A1	80	16/10/21	940.000
32				**Totale**	**3.165**		**51.855.130**

[1] Importi aggiornati all'attuale rideterminazione

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN**

Tabella 17 - Gli interventi funzionanti non formalmente conclusi

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Piena funzionalità	Cofin. € [1]
510	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A2	0	30/09/25	595.650
524	Università di Bologna	Emilia Romagna	Bologna	A1	40	-	3.017.528
525	Università di Bologna	Emilia Romagna	Bologna	A1	0		
526	Università di Bologna	Emilia Romagna	Bologna	A1	17		
560	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	213	28/08/23	10.301.200
574	Università di Macerata	Marche	Macerata	A1	65	09/09/21	4.814.915
587	Providence House	Piemonte	Torino	C	171	17/09/23	3.500.000
609	Centro di Pastorale S. Fosca	Veneto	Venezia	A1	73	Sempre in esercizio	450.000
561	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	375	30/09/25	892.250
564	Università di Milano	Lombardia	Milano	A1	146	08/07/25	1.474.541
567	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	75	-	464.087
11				**Totale**	**1.175**		**25.510.171**

[1] Importi aggiornati all'attuale rideterminazione

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Tabella 18 - Gli interventi in funzione nel 2026

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. € [1]
539	Università di Parma	Emilia Romagna	Parma	A1	87	3.822.194
541	ER.GO	Emilia Romagna	Reggio Emilia	A1	75	5.034.905
544	Sapienza Università di Roma	Lazio	Latina	A1	112	6.768.998
546	Collegio CUIR	Lazio	Roma	A1	57	5.624.809
548	Università Cattolica	Lazio	Roma	A1	250	6.777.568
549	Sapienza Università di Roma	Lazio	Roma	A1	200	9.556.132
551	ALFA (ora ALISEO) Liguria	Liguria	Genova	A1	182	7.854.073
552	ALFA (ora ALISEO) Liguria	Liguria	Genova	A1	137	6.350.939
575	ERSU Camerino (ora ERDIS Marche)	Marche	Camerino (MC)	A1	254	4.809.533
589	ADISU Puglia	Puglia	Bari	A1	80	4.028.416
608	Università Padova	Veneto	Padova	A1	187	9.695.349
11				**Totale**	**1.621**	**70.322.916**

[1] Importi aggiornati all'attuale rideterminazione

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN**

Tabella 19 - Gli interventi in funzione successivamente al 2026

Fasc.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. € [1]
514	ADSU Chieti Pescara	Abruzzo	Chieti	A1	149	11.710.800
516	ADSU Chieti Pescara	Abruzzo	Pescara	A1	42	4.668.414
517	ADSU Chieti Pescara	Abruzzo	Pescara	B	24	
519	ADSU Teramo	Abruzzo	Teramo	A1	206	9.970.000
520	Università Magna Grecia Catanzaro	Calabria	Germaneto (CZ)	A1	143	6.515.157
523[3]	Università di Salerno	Campania	Fisciano (SA)	B	152	6.839.571
530	Università di Bologna	Emilia Romagna	Bologna	B	131	8.436.946
536	Università di Bologna	Emilia Romagna	Imola (BO)	A1	45	2.170.185
540	Fondazione Flaminia	Emilia Romagna	Ravenna	A1	112	3.643.357
559	Politecnico Milano	Lombardia	Milano	B	246	14.961.662
562	Università di Milano	Lombardia	Milano	A1	182	1.724.675
563	Università di Milano	Lombardia	Milano	A1	59	1.005.000
571[4]	ERAP Marche	Marche	Ancona	A1	49	2.692.908
572[3]	Università Politecnica Marche	Marche	Ancona	A1	59	3.239.162
585[2]	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1	70	1.154.486
592	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	59	2.165.021
593[3]	Università di Catania	Sicilia	Catania	A1	87	4.280.609
596[3]	Università di Messina	Sicilia	Messina	A1	206	9.626.815
600	Università Normale di Pisa	Toscana	Pisa	A1	91	1.651.037
603[3]	Università di Trento	Trentino	Trento	B	200	10.190.241
610[2]	ESU Venezia	Veneto	Venezia	B	87	2.654.247
21				**Totale**	**2.399**	**109.300.293**

[1] Importi aggiornati all'attuale rideterminazione
[2] Interventi attualmente sospesi
[3] Interventi per i quali è stata stipulata la convenzione con il MUR nel corso del 2024
[4] Interventi per i quali è stata stipulata la convenzione con il MUR nel corso del 2025

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN**

Tabella 20 - Il quadro complessivo di attuazione degli interventi IV bando

	n.	%	Cofin. €	%	p.a.	%
Interventi chiusi e funzionanti (Tab. 16)	32	42,67	51.855.130	20,18	3.165	37,86
Interventi funzionanti ma non formalmente chiusi (Tab. 17)	11	14,67	25.510.171	9,93	1.175	14,06
Totale interventi in esercizio	43	57,33	77.365.301	30,10	4340	51,91
Interventi in funzione nel 2026 (Tab. 18)	11	14,67	70.322.916	27,36	1.621	19,39
Interventi in funzione successivamente al 2026 (Tab. 19)	21	28,00	109.300.293	42,53	2.399	28,70
Totale degli interventi attivi	**75**	**100**	**256.988.510**	**100**	**8.360**	**100**

[1] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

4. Il quinto bando della L. 338/2000 (D.M. 1256/2021 e D.M. 1257/2021)

Con l'emanazione del quinto bando, il Ministro ha ritenuto di confermare gli interventi finalizzati all'efficientamento e/o al miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie. Il quinto bando prevede, come il quarto, una tipologia di interventi specifici (A2) per l'individuazione e messa in opera di soluzioni tecnologiche e progettuali innovative finalizzate a uno sviluppo ambientale ed economico sostenibile anche per le residenze universitarie oggetto di interventi di recupero. Il bando, per tale tipologia di interventi, stabilisce un *range* di cofinanziamento (minimo € 200.000, massimo € 1.000.000) e un apposito Decreto di Piano per un importo massimo di € 15.000.000.

Il quinto bando, rispetto ai precedenti, si è caratterizzato per alcuni fattori significativi:

a) incremento del limite massimo del cofinanziamento da parte dello Stato, dal 50% al 75% del costo complessivo dell'intervento;
b) l'introduzione del principio del *no green field*, con la riduzione significativa dei casi in cui è ammissibile la nuova edificazione, limitata a specifici casi chiaramente identificati;
c) l'introduzione del rispetto del principio del DNSH e dei CAM;
d) l'obbligo dell'utilizzo del BIM (a eccezione degli interventi di tipologia A2);
e) obbligo di destinare il 40% delle risorse disponibili per il finanziamento di interventi localizzati nelle aree del Mezzogiorno;
f) l'abolizione della Convenzione: il Decreto di Piano, oltre ai già citati Decreti n. 1256 e n. 1257 del 30 novembre 2021, rappresenta l'unico atto che disciplina i doveri e gli obblighi delle parti.

La scadenza per la trasmissione delle richieste di cofinanziamento era fissata per il 17/05/2022. Sono pervenute 155 richieste di cofinanziamento, con riferimento ai Modelli Informatizzati chiusi nei termini stabiliti (tabella 21): 18 (pari al 12% del totale) riguardano interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie (tipologia A2); 86 (pari al 55% del totale) riguardano interventi di recupero, ristrutturazione edilizia o urbanistica, restauro e risanamento (Tipologia A1); 34 interventi (pari al 22% del totale) riguardano opere di nuova costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, completamento di alloggi per studenti universitari (Tipologia B), inclusa l'eventuale acquisizione delle aree necessarie, e 17 (pari al 11% del totale) prevedono l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari (Tipologia C). Il numero di richieste presentate è superiore rispetto ai precedenti bandi, fatta eccezione per il primo: +41% rispetto al quarto bando; +99% rispetto al terzo; +19% rispetto al secondo e -8% rispetto al primo.

L'importo di cofinanziamento complessivo richiesto al MUR ammonta a € 1.326.626.870 (per il quarto bando è stato di € 403.042.691 di euro; per il terzo di € 380.271.488) per la realizzazione/messa a norma di oltre 20.000 posti alloggio, di cui 6.000 circa da mettere a norma e da manutenere e 14.000 circa di nuova realizzazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

L'importo delle richieste di cofinanziamento che interessano interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione di immobili esistenti è superiore rispetto agli interventi di nuova costruzione e acquisto (circa 700 milioni di euro per gli interventi di tipologia A1+A2 a fronte di circa 600 milioni per gli interventi di tipologia B+C). Si precisa che, con il V bando, sono inclusi nella tipologia B gli interventi di demolizione e ricostruzione e di completamento, nei precedenti bandi classificati all'interno della tipologia A1. Questo comporta che la tipologia B include, nel V bando, sia interventi di nuova edificazione, sia interventi in aree già urbanizzate che prevedono il recupero del volume esistente.

Dalle domande presentate emerge la prevalenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato alla realizzazione di nuovi posti alloggio e non solo al recupero delle strutture già adibite a residenze universitarie.

Rispetto al quarto bando, gli importi richiesti sono superiori; tale circostanza è una diretta conseguenza dell'incremento del limite massimo del cofinanziamento, portato nel V bando dal 50% al 75%: la media è pari a circa 9.500.0000 di euro a intervento, a fronte di circa 4.000.000 di euro a intervento per il quarto bando.

Ai sensi dell'art. 8, comma 7 del D.M. MUR 30 novembre 2021 n. 1257, al cofinanziamento degli interventi erano inizialmente destinati circa 167 milioni di euro, relativi allo stanziamento di bilancio per il triennio 2022-23-24, oltre a 300 milioni di euro previsti dal PNRR.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. MUR 26 agosto 2022 n. 1046, i 300 milioni di euro da fondi PNRR sono stati stralciati dal V bando della legge 338/2000 e destinati a un'altra linea di finanziamento, riportando l'importo complessivo del finanziamento disponibile a circa 167 milioni di euro.

Il Parlamento, con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023, ha approvato lo stanziamento di ulteriori risorse per 300 milioni di euro, compensando la quota dei fondi PNRR stralciati e riportando la disponibilità ai circa 467 milioni di euro previsti dal D.M. 30 novembre 2021 n. 1257. A questi si aggiungono le risorse disponibili a dicembre 2022 a seguito di economie conseguite in sede di affidamento di lavori e/o arredi, rinunce ed esclusioni, per circa 28 milioni di euro, che portano lo stanziamento disponibile a oltre 490 milioni di euro. A tale somma si aggiungeranno le risorse dell'esercizi 2026 e successivi, oltre alle economie conseguite in sede di ulteriori rideterminazioni e/o rinunce relative a interventi dei bandi precedenti.

La Commissione esprime il proprio apprezzamento, sottolineando come l'attenzione del Parlamento nei confronti della legge n. 338/2000, l'incremento delle risorse disponibili e il potenziamento dei finanziamenti per tale finalità ne certifichino ulteriormente la validità e l'importanza strategica per il Paese.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

Il Decreto di Piano approvato con il D.M. del 2 novembre 2023, n. 1483 (interventi tipologia A2) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 05 gennaio 2024, serie generale n. 4, ha individuato gli interventi di tipologia A2 cofinanziabili (tabella 22) per un importo complessivo di cofinanziamento pari a 13.860.839,15 euro e ha stabilito l'ammissibilità di 18 richieste di cofinanziamento, il 100% del totale delle richieste pervenute (tabella 22). Poiché, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del D.M. 1257/2021, per gli interventi di tipologia A2 era previsto un ammontare complessivo di cofinanziamento pari a 15.000.000 di euro, le risorse residue sono state destinate al cofinanziamento degli interventi di tipologia A1, B e C.

Il Decreto di Piano approvato con il D.M. del 6 novembre 2023 n. 1488 (interventi tipologia A1, B e C), e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2024, serie generale n. 4, ha individuato gli interventi di tipologia A1, B e C ammissibili al cofinanziamento e ha stabilito l'ammissibilità di 118 richieste di cofinanziamento (86% rispetto alle 137 richieste pervenute di tipologia A1, B, C) e l'esclusione di 18 richieste (13% del totale delle richieste pervenute di tipologia A1, B, C), prendendo atto della rinuncia di una richiesta (1% del totale delle richieste pervenute di tipologia A1, B, C) trasmessa dai soggetti richiedenti (tabella 22).

Come per i piani precedenti, poiché l'importo complessivo di cofinanziamento supera l'importo a disposizione, il Piano ha definito gli interventi immediatamente finanziabili (fase 1) e gli interventi ammessi con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse (fase 2), per il finanziamento dei quali verranno utilizzate le annualità successive e i recuperi derivanti dai ribassi di gara, eventuali rinunce, revoche, ecc.

I 136 interventi ritenuti ammissibili, per un totale di 16.949 posti alloggio - di cui 5.545 già esistenti messi a norma e 11.404 di nuova realizzazione - e un cofinanziamento complessivo pari a € 1.134.127.635, sono suddivisi in due gruppi:

- gli interventi di tipologia A2, che rappresentano il 13,24% del totale, con una disponibilità di 2.478 posti alloggio già esistenti, per un cofinanziamento complessivo di € 13.860.839. Di questi:
  - gli interventi al Nord Italia sono n. 9 per un totale di 1.248 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 7.725.019;
  - gli interventi al Centro Italia sono n. 3 per un totale di 310 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 2.005.796;
  - gli interventi al sud Italia e Isole sono n. 6 per un totale di 920 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 4.130.024.
- gli interventi di tipologia A1, B, C, che rappresentano l'86,76% del totale, con una disponibilità di 14.471 posti alloggio, di cui n. 11.404 di nuova realizzazione, e cofinanziamento complessivo assegnato di € 1.120.266.796. Di questi:

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

- gli interventi al Nord Italia sono n. 67 per un totale di 8.336 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 709.102.739;
- gli interventi al Centro Italia sono n. 23 per un totale di 2.711 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 170.125.990;
- gli interventi al Sud Italia e Isole sono n. 28 per un totale di 3.424 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 241.038.067.

In base al D.M. 1488/2023, dei suddetti 118 interventi di tipologia A1, B, C ammessi al cofinanziamento, n. 57 sono stati finanziati immediatamente in base alle risorse disponibili, per un totale di 6.762 posti alloggio - di cui n. 5.399 di nuova realizzazione - e un cofinanziamento complessivo di € 478.926.002. In particolare:

- gli interventi al Nord Italia sono n. 22 per un totale di 2.552 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 199.373.283;
- gli interventi al Centro Italia sono n. 12 per un totale di 1.527 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 83.802.914;
- gli interventi al Sud Italia e Isole sono n. 23 per un totale di 2.683 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 195.749.805.

I restanti 61 interventi di tipologia A1, B, C, per un totale di 7.709 posti alloggio, di cui n. 6.005 di nuova realizzazione, e un cofinanziamento complessivo di € 641.340.794, sono stati ammessi al cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1666 del 25 ottobre 2024, le risorse finanziarie aggiuntive assegnate per lo scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'Allegato B del citato D.M. 6 novembre 2023, n. 1488, ai fini del cofinanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere A1), B) e C) del D.M. n.1257/2021, sono pari a € 186.750.724,47, a valere sui fondi stanziati per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.
All'art. 3 del suddetto decreto, si specifica che, sulla base dell'elenco definitivo elaborato dalla Commissione Paritetica alloggi e residenze universitarie e tenuto conto delle risorse che si sono rese effettivamente disponibili, sono ammessi al cofinanziamento nei limiti dell'importo riconosciuto dalla Commissione Paritetica, con contestuale scioglimento della riserva, i progetti compresi, nella fase 2 dell'Allegato B del citato D.M. n. 1488 del 6 novembre 2023, tra il n. 58 (S221XZR-01/H43D22000090005 – fascicolo 764) e il n. 74 (U22TX7V-01-U22TX7V-02/ J19H17000220008– fascicolo 788-789).

Le risorse che si renderanno successivamente disponibili saranno prioritariamente destinate al cofinanziamento degli interventi presentati e ammessi al cofinanziamento statale nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000, ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, del D.M. n.1257/2021 sino all'esaurimento della graduatoria, unitamente al residuo disponibile, pari a euro 29.938.068,97, allo

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

stato non utilizzabile in quanto l'intervento immediatamente successivo in graduatoria (n. 75) prevede un cofinanziamento superiore rispetto al suddetto residuo disponibile.

Con lo scorrimento della graduatoria, di cui al citato D.M. n. 1666, è stata sciolta la riserva per n. 17 interventi, per un importo complessivo di cofinanziamento pari a € 156.812.655,50 e per un totale di 2.148 p.a., di cui 1.312 di nuova realizzazione. In particolare:

- gli interventi al Nord Italia sono n. 10 per un totale di 1.322 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 103.604.409,50 (F. 764 – CUP H43D22000090005; F. 761 – CUP D48I21000680008; F. 852 – CUP H34D22000400005; F. 799 – CUP H49I22000890007; F. 848 – CUP H79I22000300003; F. 778 – CUP G13C22001730009; F. 851 – CUP D34F22000390006; F. 806 – CUP C15G22000020008; F. 853 – CUP E32D22000030001; F. 766 – CUP G44D22000290006);
- gli interventi al Centro Italia sono n. 7 per un totale di 826 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 53.208.246,00 (F. 793 – CUP H33E22000410003; F. 836 – CUP H94D22000020003; F. 794 – CUP H33E22000430003; F. 795 – CUP H33E22000420003; F. 837 – CUP C96F22000300005; FF. 788-789 – CUP J19H17000220008);
- non sono presenti interventi al Sud Italia e Isole.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 584 del 05 agosto 2025, le risorse finanziarie aggiuntive assegnate per lo scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'Allegato B del citato D.M. 6 novembre 2023, n. 1488, ai fini del cofinanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere A1), B) e C) del D.M. n.1257/2021, sono pari a € 171.355.205,12, a valere sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR, di cui alle premesse del DM stesso.

All'art. 3 del suddetto decreto, si specifica che, sulla base dell'elenco definitivo elaborato dalla Commissione Paritetica alloggi e residenze universitarie e tenuto conto delle risorse che si sono rese effettivamente disponibili, sono ammessi al cofinanziamento nei limiti dell'importo riconosciuto dalla Commissione Paritetica, con contestuale scioglimento della riserva, i progetti compresi, nella fase 2 dell'Allegato B del citato D.M. n. 1488 del 6 novembre 2023, tra il n. 75 (S22H8EB-01/I49I22000160009 - fascicolo 773) e il n. 83 (S22M3K4-01/C39H22000000008 - fascicolo 736).

Le risorse che si renderanno successivamente disponibili saranno prioritariamente destinate al cofinanziamento degli interventi presentati e ammessi al cofinanziamento statale nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000, ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, del D.M. n.1257/2021 sino all'esaurimento della graduatoria, unitamente al residuo disponibile, pari a euro 3.530.233,62, allo stato non utilizzabile in quanto l'intervento immediatamente successivo in graduatoria (n. 84) prevede un cofinanziamento superiore rispetto al suddetto residuo disponibile.

Con lo scorrimento della graduatoria, di cui al citato D.M. n. 584, è stata sciolta la riserva per n. 9 interventi, per un importo complessivo di cofinanziamento pari a € 167.824.971,50 e per un totale di 1.551 p.a., di cui 1.453 di nuova realizzazione. In particolare:

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

- gli interventi al Nord Italia sono n. 9 per un totale di 1.551 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 167.824.971,50 (F. 773 – CUP I49I22000160009; F. 768 – CUP D48H21000170005; F. 770 – CUP D48H21000160005; F. 833 – CUP H65G22000000006; F. 753 – CUP E53C22000570007; F. 765 – CUP D45E21000040005; F. 783 – CUP F18H22000380008; F. 832 – CUP H75G22000000006; F. 736 – CUP C39H22000000008);
- non sono presenti interventi al Centro Italia;
- non sono presenti interventi al Sud Italia e Isole.

I soggetti beneficiari di 3 interventi (n. 2 al Nord Italia e n. 1 intervento al Centro Italia), inseriti nel D.M. 1488/2023 con riserva, hanno trasmesso formale rinuncia al cofinanziamento (si tratta degli interventi di cui al F. 736, ammesso definitivamente con il D.M. 584/2025; e degli interventi di cui al F. 766 e F. 794 ammessi definitivamente con il D.M. 1666/2024, per un totale di 383 p.a. e cofinanziamento pari a € 27.428.830 (Tabella 23).
Pertanto, gli interventi di tipologia A1, B, C inseriti nel D.M. 1488/2023 e attualmente attivi sono 115, per un totale di 14.088 posti alloggio e un cofinanziamento complessivo di € 1.035.575.696,83, al netto delle rideterminazioni a seguito di economie conseguite.
Sommando gli interventi di tipologia A2, ad oggi risultano attivi 133 interventi, per un totale di 16.566 posti alloggio e un cofinanziamento complessivo di € 1.048.102.458,22, al netto delle rideterminazioni a seguito di economie conseguite.

La tabella 24 suddivide gli interventi cofinanziati di tipologia A2 per area geografica: al Nord sono cofinanziati 9 interventi, che rappresentano il 50% del totale, con una disponibilità di 1.248 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 7.358.018; al Centro sono cofinanziati 3 interventi, che rappresenta il 16,67% del totale, con una disponibilità di 310 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 1.734.598; al Sud-Isole sono cofinanziati 6 interventi, che rappresentano il 33,33% del totale, con una disponibilità di 920 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 3.434.145.

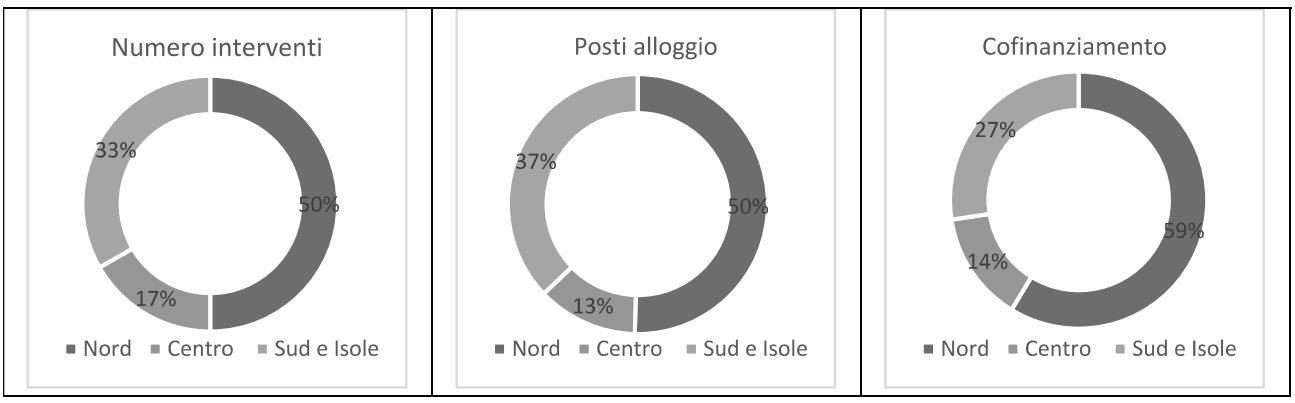


Figura 10. Tipologia A2: interventi, posti alloggio e cofinanziamento per area geografica.

La tabella 25 suddivide gli interventi cofinanziati di tipologia A1, B e C per area geografica: al Nord sono attivi 65 interventi che rappresentano il 56,52% del totale, con una disponibilità di 8.058 posti

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot. 0026000 ZTRAN

alloggio e cofinanziamento pari a € 662.642.279; al Centro sono attivi 22 interventi, che rappresentano il 19,13% del totale, con una disponibilità di 2.606 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 157.183.209; al Sud-Isole sono attivi 28 interventi, che rappresentano il 24,35% del totale, con una disponibilità di 3.424 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 215.750.209.

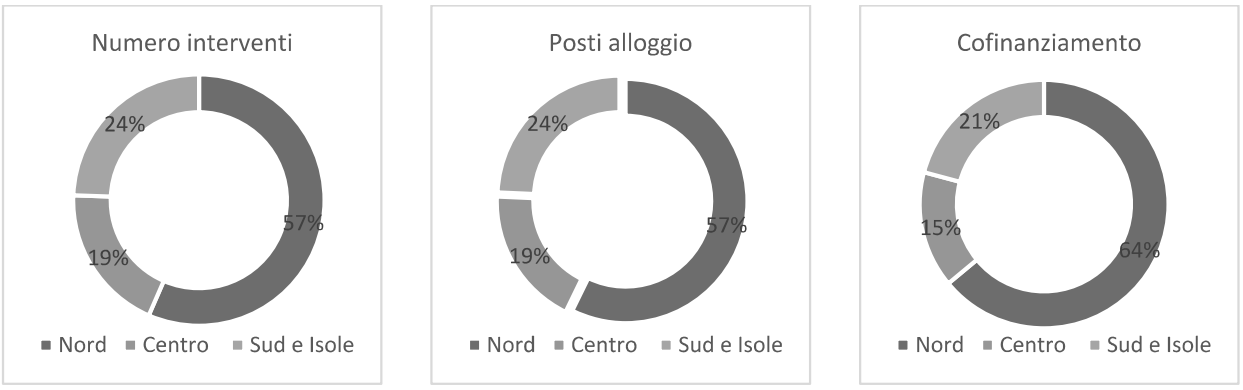


Figura 11. Tipologia A1, B, C: interventi, posti alloggio e cofinanziamento per area geografica.

La tabella 26 suddivide gli interventi cofinanziati di tipologia A1, B e C per tipologia di intervento: gli interventi sull'esistente (manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, nell'ambito dei quali è possibile effettuare operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza) sono 78, che rappresentano il 67,83% del totale, con una disponibilità di 8.871 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 600.443.796; gli interventi di nuova realizzazione o ampliamento di residenze per studenti universitari sono n. 28, che rappresentano il 24,35% del totale, con una disponibilità 3.920 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 335.622.225; gli acquisti di edifici da adibire a residenze per studenti sono n. 9, che rappresentano il 7,83% del totale, con una disponibilità di 1.297 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 99.509.676.

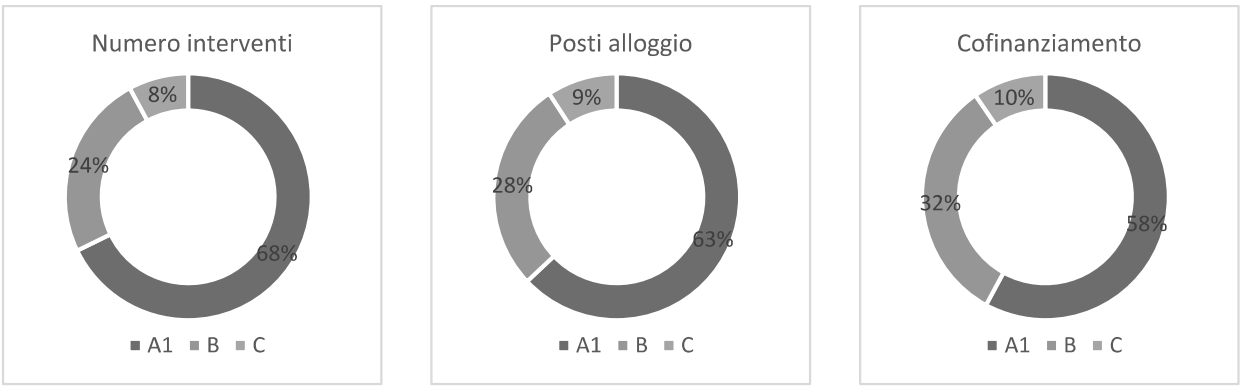


Figura 12. Tipologia A1, B, C: interventi, posti alloggio e cofinanziamento per tipologia.

Di seguito, si documenta nel dettaglio lo stato di attuazione dei 133 interventi, di cui 18 interventi di tipologia A2, per un totale di 16.566 posti alloggio (di cui 11.079 p.a. nuovi -

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

corrispondenti al 67% del totale dei posti alloggio) e un cofinanziamento complessivo da parte del MUR di € 1.048.102.458:

- n. 9 interventi (Tabella 27), di cui 7 di tipologia A2, sono funzionanti (n. 6 al Nord, n. 1 al Centro e n. 2 al Sud-Isole), e rappresentano il 6,77% del totale, con una disponibilità di 1.290 posti alloggio, di cui 230 di nuova realizzazione, per un importo di cofinanziamento complessivo pari a € 21.546.947. Gli interventi sull'esistente sono n. 8 per un totale di 1.060 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 6.805.258; gli interventi di nuova edificazione sono n. 1 (intervento di tipologia C, acquisto di cosa futura, che prevede demolizione e ricostruzione) per 230 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 14.741.689;
- n. 5 interventi (tabella 28), di cui 4 di tipologia A2, sono funzionanti ma non formalmente conclusi (n. 2 al Nord, n. 1 al Centro e n. 2 al Sud-Isole) e rappresentano il 3,76% del totale, con una disponibilità di 931 posti alloggio, per un cofinanziamento pari a € 7.805.641;
- n. 5 interventi (tabella 29), tutti di tipologia A2, per i quali i lavori sono terminati (n. 3 al Nord e n. 2 al Sud-Isole) e rappresentano il 3,76% del totale, con una disponibilità di 408 posti alloggio, per un cofinanziamento pari a € 2.995.879. Per questi interventi la messa in esercizio è prevista per la prima metà del 2026;
- n. 32 interventi (Tabella 30), di cui 2 di tipologia A2, sono in corso di realizzazione (n. 14 al Nord, n. 11 al Centro e n. 7 al Sud-Isole) e rappresentano il 24,06% del totale, con una disponibilità di 3.836 posti alloggio, di cui 3.058 di nuova realizzazione, per un cofinanziamento complessivo di € 258.602.136. Gli interventi sull'esistente sono n. 27 (di cui n. 2 interventi di tipologia C, acquisti di cosa futura, che prevedono ristrutturazione di immobili esistenti) per un totale di 3.010 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 186.738.181; gli interventi di nuova edificazione sono n. 5 (di cui n. 3 interventi di tipologia C, acquisti di cosa futura, che prevedono demolizione e ricostruzione), per un totale di 826 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 71.863.955.
  Di questi, per n. 9 interventi la messa in esercizio è prevista nel 2026 e per n. 23 interventi dopo il 2026;
- n. 47 interventi – n. 28 ammessi in fase 1, n. 11 ammessi in fase 2 e definitivamente con il primo scorrimento (D.M. 1666/2024), n. 8 ammessi in fase 2 e definitivamente con il secondo scorrimento (D.M. 584/2025) - (Tabella 31), per i quali i lavori non sono ancora iniziati (n. 23 al Nord, n. 8 al Centro e n. 16 al Sud-Isole), che rappresentano il 35,34% del totale, con una disponibilità di 6.091 posti alloggio, di cui 4.438 di nuova realizzazione, per un importo di cofinanziamento complessivo pari a € 443.272.818,22. Gli interventi sull'esistente sono n. 35 per un totale di 4.151 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 269.238.645; gli interventi di nuova edificazione sono n. 12, per un totale di 1.940 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 174.034.173 (in merito agli interventi di cui ai fascicoli 729 e 789, inseriti nei programmi unitari rispettivamente con l'intervento di tipologia A1 di cui al fascicolo 728 e con l'intervento di tipologia A1 di cui al fascicolo 788, l'importo di cofinanziamento assegnato ai programmi unitari è stato interamente conteggiato tra gli interventi di tipologia A1).

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

- I restanti 35 interventi (Tabella 32), ammessi con riserva in fase 2, rimangono in attesa dell'ammissione definitiva (n. 26 al Nord, n. 4 al Centro e n. 5 al Sud-Isole) e rappresentano il 26,32% del totale, con una disponibilità di 4.010 posti alloggio, di cui 3.280 di nuova realizzazione, per un cofinanziamento complessivo di € 313.879.037. Gli interventi sull'esistente sono n. 20, per un totale di 2.165 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 165.838.440; gli interventi di nuova edificazione sono n. 15, per un totale di 1.845 posti alloggio e cofinanziamento pari a € 148.040.597 (in merito agli interventi di cui ai fascicoli 845 – tipologia C e 846 – tipologia B, inseriti nel programma unitario con l'intervento di tipologia A1 di cui al fascicolo 844, il numero di posti alloggio e l'importo di cofinanziamento assegnato al programma unitario sono stati conteggiati tra gli interventi di tipologia A1).

Tabella 21 - Le domande presentate V bando

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip.	p.a.	Richiesta €
701	Fondazione Experience	Abruzzo	Chieti	A2	464	430.871
702	Università della Calabria	Calabria	Rende	A2	56	736.624
703	Università della Calabria	Calabria	Rende	A2	84	749.901
704	IPE Napoli	Campania	Napoli	A2	40	584.793
705	Fondazione CEUR	Emilia-Romagna	Bologna	A2	266	1.000.000
706	Nuovo Mondo Società Cooperativa	Emilia-Romagna	Bologna	A2	65	928.387
707	Lazio DISCO	Lazio	Roma	A2	88	663.834
708	Fondazione RUI	Lazio	Roma	A2	52	348.009
709	Università di Milano Bocconi	Lombardia	Milano	A2	333	1.000.000
710	Fondazione CEUR	Lombardia	Milano	A2	161	1.000.000
711	Fondazione Collegio S. Caterina da Siena	Lombardia	Pavia	A2	77	923.518
712	ADISU Puglia	Puglia	Bari	A2	168	687.270
713	ADISU Puglia	Puglia	Lecce	A2	108	1.000.000
714	DSU Toscana	Toscana	Pisa	A2	170	1.000.000
715	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Trento	A2	110	990.338
716	Collegio Don Nicola Mazza	Veneto	Padova	A2	78	1.216.234
717	ESU Verona	Veneto	Verona	A2	79	227.253
718	ESU Verona	Veneto	Verona	A2	79	655.524
719	Fondazione CEUR	Abruzzo	Pescara	C	185	13.176.500
720	Università di Catanzaro	Calabria	Catanzaro	B	141	11.471.576
721	Conservatorio Cimarosa	Campania	Avellino	A1	47	3.255.916
722	Università del Sannio	Campania	Benevento	A1	115	5.107.680
723	Università della Campania	Campania	Caserta	A1	122	10.959.828
724	Aedificatores Società Cooperativa Edilizia	Campania	Caserta	C	238	9.595.000
725	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	50	4.599.694
726	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	186	17.273.328
727	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	100	6.314.006
728[1]	ADISURC	Campania	Napoli	A1	60	5.421.039
729[1]				B	40	7.710.123
730	Università di Napoli Parthenope	Campania	Napoli	A1	70	5.773.428
731	Fondazione CEUR	Campania	Napoli	C	142	10.495.000
732	Università di Napoli Federico II	Campania	Portici	A1	62	6.580.916
733	Alma Mater Universi di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	A1	89	6.910.775

Camera dei Deputati ARRIVO 07 Maggio 2026 Prot. 2026/0000778/TN

734	Alma Mater Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	B	90	11.494.621
735	Fondazione RUI	Emilia-Romagna	Bologna	A1	44	6.366.380
736	Fondazione CEUR	Emilia-Romagna	Bologna	C	172	18.526.000
737	Università di Ferrara	Emilia-Romagna	Ferrara	A1	119	13.104.308
738	Fondazione Bonifiche Ferraresi	Emilia-Romagna	Jolanda di Savoia	A1	107	6.138.807
739	Fondazione Almerici-Montevecchio	Emilia-Romagna	Cesena	A1	40	4.076.833
740[1]	Università di Modena e Reggio Emilia	Emilia-Romagna	Modena	A1	70	6.034.315
741[1]				A1	36	2.601.135
742	Fondazione Collegio S. Carlo	Emilia-Romagna	Modena	A1	106	1.418.493
743	Università di Parma	Emilia-Romagna	Parma	A1	61	8.445.891
744	ACER Azienda Casa Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Reggio Emilia	A1	80	10.869.286
745	Lazio DISCO	Lazio	Roma	A1	41	3.497.109
746[1]	Università Cattolica Sacro Cuore	Lazio	Roma	B	95	10.973.360
747[1]				A1	95	
0748	Fondazione CEUR	Lazio	Roma	C	110	12.365.000
749	ALISEO Liguria	Liguria	Genova	A1	66	8.582.019
750	Università di Genova	Liguria	Genova	A1	92	6.289.653
751	ALISEO Liguria	Liguria	La Spezia	A1	57	3.035.282
752	Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia	Liguria	La Spezia	A1	52	2.037.558
753	ALISEO Liguria	Liguria	Savona	A1	40	5.074.486
754	Università di Bergamo	Lombardia	Bergamo	A1	255	28.448.642
755	Università di Bergamo	Lombardia	Dalmine	C	48	2.013.000
756	Università di Brescia	Lombardia	Brescia	C	392	10.625.000
757	Università Cattolica Sacro Cuore	Lombardia	Brescia	A1	72	6.840.094
758	Fondazione Maddalena di Canossa	Lombardia	Rodengo Saiano	A1	42	2.600.000
759	Politecnico di Milano	Lombardia	Mantova	B	79	8.572.987
760	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	Garbagnate Milanese	A1	172	15.001.535
761	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	259	16.967.499
762	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	A1	104	5.809.565
763	Università di Milano	Lombardia	Milano	A1	208	13.591.051
764	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	144	14.773.742
765	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	244	22.732.777
766	Università di Milano	Lombardia	Milano	B	106	4.974.593
767	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	137	13.290.122
768	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	250	23.469.052
769	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	244	22.732.777
770	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	250	23.469.052
771	Università Cattolica Sacro Cuore	Lombardia	Milano	A1	122	11.880.284
772	Accademia Belle Arti Brera	Lombardia	Milano	B	200	17.533.170
773	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	Milano	A1	167	37.937.609
774	Fondazione Campus Studi Martino	Lombardia	Milano	A1	152	8.503.325
775	Fondazione Campus Studi Martino	Lombardia	Milano	B	250	11.547.594
776	Fondazione Campus Studi Martino	Lombardia	Milano	B	250	11.547.594
777	Università Humanitas	Lombardia	Pieve Emanuele	B	119	8.696.461
778	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	116	4.869.703
779	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	102	11.442.660
780	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	326	21.019.353
781[1]	Istituto Universitario di Studi Superiori	Lombardia	Pavia	B	96	6.613.660
782[1]				A1	0	0

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

783	Fondazione Collegio Ghislieri	Lombardia	Pavia	A1	113	6.089.911
784	Fondazione CEUR	Lombardia	Pavia	C	189	18.412.500
785	Università dell'Insubria	Lombardia	Varese	A1	46	4.167.280
786	ERDIS Marche	Marche	Ancona	A1	85	7.716.000
787	ERAP Ascoli Piceno	Marche	Ascoli Piceno	C	76	6.806.487
788[1]	Università di Camerino	Marche	Camerino	A1	266	11.108.034
789[1]				B	0	0
790	Università di Camerino	Marche	Camerino	B	40	3.275.812
791	ERDIS Marche	Marche	Macerata	A1	42	2.519.853
792	ERDIS Marche	Marche	Macerata	C	91	8.287.506
793	ERDIS Marche	Marche	Fano	A1	40	3.750.004
794	ERDIS Marche	Marche	Urbino	C	105	3.928.238
795	ERDIS Marche	Marche	Urbino	C	129	4.000.301
796	Università di Urbino	Marche	Urbino	A1	780	19.398.300
797	Università di Urbino	Marche	Urbino	B	200	20.512.679
798	Asti Studi Superiori Società Consortile ASTISS S.c.r.l.	Piemonte	Asti	A1	87	6.742.704
799	EDISU Piemonte	Piemonte	Savigliano	A1	57	6.780.037
800	EDISU Piemonte	Piemonte	Novara	A1	171	9.806.500
801	EDISU Piemonte	Piemonte	Grugliasco	A1	250	21.649.853
802	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1	164	4.942.768
803	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1	209	15.639.795
804	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	B	224	17.980.163
805	Collegio Einaudi Torino	Piemonte	Torino	A1	40	1.727.852
806	Fondazione CEUR	Piemonte	Torino	C	207	14.362.500
807	LUM	Puglia	Casamassima	B	242	16.238.916
808	ADISU Puglia	Puglia	Brindisi	A1	50	5.444.928
809	Università di Foggia	Puglia	Foggia	A1	64	3.198.590
810	ADISU Puglia	Puglia	Lecce	A1	80	7.714.025
811	Università del Salento	Puglia	Lecce	A1	89	9.365.972
812	Fondazione Venture Impatto Sociale ETS	Puglia	Monteroni di Lecce	B	250	8.910.800
813	ADISU Puglia	Puglia	Taranto	A1	92	7.530.341
814	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	114	4.780.419
815	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	114	4.780.419
816	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	54	1.052.572
817	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	171	8.974.565
818	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	160	5.671.804
819	Università di Catania	Sicilia	Catania	A1	97	2.714.652
820	Università di Catania	Sicilia	Catania	A1	250	22.608.320
821	Università di Catania	Sicilia	Catania	A1	204	16.274.780
822	IACP Catania	Sicilia	Catania	B	188	9.580.853
823	Università KORE di Enna	Sicilia	Enna	B	153	7.339.656
824	Università di Messina	Sicilia	Messina	A1	190	9.371.878
825	Casa SPA	Toscana	Firenze	A1	114	8.847.933
826	Scuola Superiore S. Anna Pisa	Toscana	Pisa	A1	69	5.482.198
827[1]	Scuola Normale Superiore Pisa	Toscana	Pisa	A1	46	2.030.278
828[1]				A1	16	2.036.532
829	DSU Toscana	Toscana	Siena	A1	52	2.794.440
830	Provincia di Bolzano	Trentino-Alto Adige	Bolzano	B	200	23.016.505
831	Fondazione Cassa Rurale Alta Valsugana	Trentino-Alto Adige	Pergine Valsugana	B	250	22.169.798
832	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Rovereto	B	208	21.603.573
833	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Trento	B	107	10.118.150
834	Sodalizio Cattolico [illegible]	Trentino-Alto Adige	Trento		90	13.286.519

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot. 2026/0000778/TN

835	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	A1	40	2.410.790
836	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	B	200	24.023.571
837	Fondazione ONAOSI	Umbria	Perugia	A1	121	6.398.099
838	Università di Padova	Veneto	Legnaro	B	90	4.170.474
839	ESU Padova	Veneto	Padova	A1	93	2.570.718
840	ESU Padova	Veneto	Padova	A1	109	4.543.605
841	Università di Padova	Veneto	Padova	A1	85	9.291.120
842	Fondazione CEUR	Veneto	Padova	C	230	15.005.000
843	Fondazione La Casa Onlus	Veneto	Padova	A1	45	1.550.000
844[1]	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	Veneto	Padova	A1	98	3.325.436
845[1]				C	32	1.275.000
846[1]				B	32	2.649.082
847	IUAV Venezia	Veneto	Venezia	A1	200	14.116.413
848	Università Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A1	207	26.905.785
849	IUAV Venezia	Veneto	Venezia	A1	40	4.455.642
850	IUAV Venezia	Veneto	Venezia	C	250	23.752.780
851	ESU Verona	Veneto	Verona	C	126	9.150.000
852	Collegio Don Nicola Mazza	Veneto	Verona	A1	40	2.384.410
853	ESU Padova	Veneto	Vicenza	A1	59	2.436.151
854	Urbana Società Cooperativa Sociale	Veneto	Vicenza	A1	40	3.261.416
855	Urbana Società Cooperativa Sociale	Veneto	Vicenza	B	40	2.212.723
155					**20.011**	**1.315.653.501[1]**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.
Le tipologie di intervento, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 1257/2021 sono:
A1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza;
A2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie;
B) gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, trasformazione o completamento di strutture residenziali universitarie;
C) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie.
Mettere nota

Tabella 22 - Il cofinanziamento degli interventi V bando

Interventi di tipologia A2 ammessi al cofinanziamento

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip.	p.a.	Cofin. €
701	Fondazione Experience	Abruzzo	Chieti	A2	464	371.436
702	Università della Calabria	Calabria	Rende	A2	56	736.624
703	Università della Calabria	Calabria	Rende	A2	84	749.901
704	IPE Napoli	Campania	Napoli	A2	40	584.793
705	Fondazione CEUR	Emilia-Romagna	Bologna	A2	266	1.000.000
706	Nuovo Mondo Società Cooperativa	Emilia-Romagna	Bologna	A2	65	928.387
707	Lazio DISCO	Lazio	Roma	A2	88	657.787
708	Fondazione RUI	Lazio	Roma	A2	52	348.009

[1] Per il Programma Unitario di cui ai FF. 746-747, il soggetto richiedente, in ciascuno dei due Modelli CARSU presentati, ha ripetuto l'importo del cofinanziamento richiesto complessivamente per l'intero Programma Unitario. Il dato indicato (€ 1.315.653.501) riporta il totale del cofinanziamento considerando solo una volta l'importo del cofinanziamento relativo al Programma Unitario FF. 746-747.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

709	Università di Milano Bocconi	Lombardia	Milano	A2	333	1.000.000
710	Fondazione CEUR	Lombardia	Milano	A2	161	1.000.000
711	Fondazione Collegio S. Caterina da Siena	Lombardia	Pavia	A2	77	923.517
712	ADISU Puglia	Puglia	Bari	A2	168	687.270
713	ADISU Puglia	Puglia	Lecce	A2	108	1.000.000
714	DSU Toscana	Toscana	Pisa	A2	170	1.000.000
715	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Trento	A2	110	990.338
716	Collegio Don Nicola Mazza	Veneto	Padova	A2	78	1.000.000
717	ESU Verona	Veneto	Verona	A2	79	227.253
718	ESU Verona	Veneto	Verona	A2	79	655.524
18					**2.478**	**13.860.839**

Interventi di tipologia A1, B, C ammessi al cofinanziamento in base alle quote regionali

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip.	p.a.	Cofin. €
722	Università del Sannio	Campania	Benevento	A1	69	5.107.680
733	Alma Mater Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	A1	88	6.908.275
737	Università di Ferrara	Emilia-Romagna	Ferrara	A1	119	13.104.308
740[1]	Università di Modena e Reggio Emilia	Emilia-Romagna	Modena	A1	70	8.635.450
741[1]				A1	36	0
742	Fondazione Collegio S. Carlo	Emilia-Romagna	Modena	A1	106	1.418.493
743	Università di Parma	Emilia-Romagna	Parma	A1	61	8.445.891
745	Lazio DISCO	Lazio	Roma	A1	41	3.497.109
746[1]	Università Cattolica Sacro Cuore	Lazio	Roma	B	15	10.973.360
747[1]				A1	80	0
748	Fondazione CEUR	Lazio	Roma	C	110	12.365.000
751	ALISEO Liguria	Liguria	La Spezia	A1	57	3.035.282
763	Università di Milano	Lombardia	Milano	A1	208	13.590.931
769	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	244	22.732.777
785	Università dell'Insubria	Lombardia	Varese	A1	46	4.167.280
792[2]	ERDIS Marche	Marche	Macerata	A1	91	8.287.506
801	EDISU Piemonte	Piemonte	Grugliasco	A1	250	21.649.853
809	Università di Foggia	Puglia	Foggia	A1	64	3.198.590
816	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	54	1.052.572
819	Università di Catania	Sicilia	Catania	A1	97	2.714.652
825	Casa SPA	Toscana	Firenze	B	114	8.847.933
826	Scuola Superiore S. Anna Pisa	Toscana	Pisa	A1	73	5.482.198
827[3]	Scuola Normale Superiore Pisa	Toscana	Pisa	A1	46	2.030.278
829	DSU Toscana	Toscana	Siena	A1	52	2.794.440
835	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	A1	40	2.410.790
840	ESU Padova	Veneto	Padova	A1	109	4.543.605
841	Università di Padova	Veneto	Padova	A1	85	9.291.120
843[4]	Fondazione La Casa Onlus	Veneto	Padova	A1	45	1.486.255
28					**2.470**	**187.771.628**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.
[2] Intervento presentato di tipologia C e modificato in sede di istruttoria in A1 (acquisto di edificio da ristrutturare).
[3] Domanda di cofinanziamento presentata con un programma unitario (FF. 827-828); dei due interventi, è stato ammesso solo il F. 727.
[4] Trattasi di demolizione e ricostruzione, quindi più propriamente da annoverare tra gli interventi di tipologia B.

Interventi di tipologia A1, B, C ammessi al cofinanziamento con l'utilizzazione delle risorse SUD

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip.	p.a.	Cofin. €
719	Fondazione CEUR	Abruzzo	Pescara	C	185	13.176.500
720	Università di Catanzaro	Calabria	Catanzaro	B	141	11.471.576
723	Università della Campania	Campania	Caserta	A1	122	10.959.828
725	Regione Campania	Campania	Napoli		50	4.599.694

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot. 2026/0000778/TN

728[1]	ADISURC	Campania	Napoli	A1	60	12.852.990
729[1]				B	40	0
730	Università di Napoli Parthenope	Campania	Napoli	A1	70	5.492.179
731	Fondazione CEUR	Campania	Napoli	C	142	10.495.000
732	Università di Napoli Federico II	Campania	Portici	A1	62	6.580.916
807	LUM	Puglia	Casamassima	B	242	16.238.916
808	ADISU Puglia	Puglia	Brindisi	A1	50	5.444.928
810	ADISU Puglia	Puglia	Lecce	A1	80	7.714.025
811	Università del Salento	Puglia	Lecce	A1	88	8.218.071
813	ADISU Puglia	Puglia	Taranto	A1	92	7.530.341
817	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	171	8.974.565
818	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	160	5.671.804
820	Università di Catania	Sicilia	Catania	A1	250	22.608.320
821	Università di Catania	Sicilia	Catania	A1	204	16.274.780
824	Università di Messina	Sicilia	Messina	A1	190	9.371.878
19					**2.399**	**183.676.311**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.

Interventi di tipologia A1, B, C ammessi al cofinanziamento con le restanti risorse disponibili

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip.	p.a.	Cofin. €
749	ALISEO Liguria	Liguria	Genova	A1	66	8.582.019
750	Università di Genova	Liguria	Genova	A1	92	6.289.653
771	Università Cattolica Sacro Cuore	Lombardia	Milano	A1	122	11.880.284
779	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	102	11.442.660
786	ERDIS Marche	Marche	Ancona	A1	85	7.716.000
796	Università di Urbino	Marche	Urbino	A1	780	19.398.300
800	EDISU Piemonte	Piemonte	Novara	A1	168	9.799.000
803	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1	208	15.639.795
805	Collegio Einaudi Torino	Piemonte	Torino	A1	40	1.727.852
842	Fondazione CEUR	Veneto	Padova	C	230	15.005.000
10					**1.893**	**107.478.063**

Interventi di tipologia A1, B, C ammessi al cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse (Fase 2)

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip.	p.a.	Cofin. €
*764	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	144	14.773.742
*761	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	259	16.967.499
*852	Collegio Don Nicola Mazza	Veneto	Verona	A1	40	2.384.409
*793	ERDIS Marche	Marche	Fano	A1	40	3.750.004
*799	EDISU Piemonte	Piemonte	Savigliano	A1	57	6.780.037
*848	Università Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A1	208	26.905.785
*778	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	116	4.869.703
*851	ESU Verona	Veneto	Verona	C	126	9.150.000
*806	Fondazione CEUR	Piemonte	Torino	C	207	14.362.500
*853	ESU Padova	Veneto	Vicenza	A1	59	2.436.151
*836	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	B	200	24.023.571
*794	ERDIS Marche	Marche	Urbino	A1[1]	105	3.928.237
*766	Università di Milano	Lombardia	Milano	B	106	4.974.593
*795	ERDIS Marche	Marche	Urbino	A1[1]	129	4.000.301
*837	Fondazione ONAOSI	Umbria	Perugia	A1	121	6.398.099
*788[2]	Università di Camerino	Marche	Camerino	A1	231	11.108.034
*789[2]				B	0	0
**773	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	Milano	A1	167	36.741.971
**768	Politecnico di Mila	Lombardia	Milano		250	23.469.052

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

**770	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	250	23.469.052
**833	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Trento	B	107	10.118.150
**753	ALISEO Liguria	Liguria	Savona	A1	40	5.074.486
**765	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	244	22.732.777
**783	Fondazione Collegio Ghislieri	Lombardia	Pavia	A1	113	6.089.911
**832	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Rovereto	B	208	21.603.573
**736	Fondazione CEUR	Emilia-Romagna	Bologna	C	172	18.526.000
847	IUAV Venezia	Veneto	Venezia	A1	200	14.116.413
735	Fondazione RUI	Emilia-Romagna	Bologna	A1	44	6.366.380
791	ERDIS Marche	Marche	Macerata	A1	42	2.519.853
804	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	B	224	17.317.731
780	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	326	21.019.353
772	Accademia Belle Arti Brera	Lombardia	Milano	B	200	17.533.170
762	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	A1	104	5.809.565
784	Fondazione CEUR	Lombardia	Pavia	C	189	18.412.500
734	Alma Mater Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	B	90	11.494.621
781	Istituto Universitario di Studi Superiori	Lombardia	Pavia	B	96	5.887.039
752	Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia	Liguria	La Spezia	A1	52	2.037.557
844[2]	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	Veneto	Padova	A1	93	7.237.018
845[2]				C	32	0
846[2]				B	0	0
754	Università di Bergamo	Lombardia	Bergamo	A1	255	27.902.263
757	Università Cattolica Sacro Cuore	Lombardia	Brescia	A1	72	6.840.094
838	Università di Padova	Veneto	Legnaro	B	90	4.170.474
839	ESU Padova	Veneto	Padova	A1	93	2.570.718
759	Politecnico di Milano	Lombardia	Mantova	B	79	8.572.987
767	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	137	13.290.122
777	Università Humanitas	Lombardia	Pieve Emanuele	B	119	8.696.461
744	ACER Azienda Casa Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Reggio Emilia	A1	80	10.608.072
739	Fondazione Almerici-Montevecchio	Emilia-Romagna	Cesena	A1	40	4.076.833
760	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	Garbagnate Milanese	A1	176	14.964.455
787	ERAP Ascoli Piceno	Marche	Ascoli Piceno	C	76	6.806.487
790	Università di Camerino	Marche	Camerino	B	40	3.275.811
726	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	186	17.273.328
797	Università di Urbino	Marche	Urbino	B	200	20.512.679
814	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	114	4.780.419
854	Urbana Società Cooperativa Sociale	Veneto	Vicenza	A1	40	2.964.115
855	Urbana Società Cooperativa Sociale	Veneto	Vicenza	B	40	1.956.494
822	IACP Catania	Sicilia	Catania	B	188	9.580.853
849	IUAV Venezia	Veneto	Venezia	A1	40	4.455.642
823	Università KORE di Enna	Sicilia	Enna	B	153	7.339.656
727	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	100	6.314.006
61					**7.709**	**641.340.794**

[1] Interventi presentati di tipologia C e modificati in sede di istruttoria in A1 (acquisto di edificio da ristrutturare).
[2] Interventi inseriti in un programma unitario.
* Interventi ammessi definitivamente, con scioglimento della riserva, a seguito del D.M. 1666/2024.
** Interventi ammessi definitivamente, con scioglimento della riserva, a seguito del D.M. 584/2025.

Interventi di tipologia A1, B, C non ammessi al cofinanziamento

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip.
721	Conservatorio Cimarosa	Campania	Avellino	A1
724	Aedificatores Società Cooperativa Edilizia	Campania	Caserta	C
738	Fondazione Bonifiche Ferraresi	Emilia-Romagna	Jolanda di Savoia	A1
755	Università di Bergamo	Lombardia	Dalmine	C
756	Università di Brescia	Lombardia	Brescia	C

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000378/CM

758	Fondazione Maddalena di Canossa	Lombardia	Rodengo Saiano	A1
774	Fondazione Campus Studi Martino	Lombardia	Milano	A1
775	Fondazione Campus Studi Martino	Lombardia	Milano	B
776	Fondazione Campus Studi Martino	Lombardia	Milano	B
782	Istituto Universitario di Studi Superiori	Lombardia	Pavia	A1
798	Asti Studi Superiori Società Consortile ASTISS S.c.r.l.	Piemonte	Asti	A1
812	Fondazione Venture Impatto Sociale ETS	Puglia	Monteroni di Lecce	B
815	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1
828	Scuola Normale Superiore Pisa	Toscana	Pisa	A1
830	Provincia di Bolzano	Trentino-Alto Adige	Bolzano	B
831	Fondazione Cassa Rurale Alta Valsugana	Trentino A.A.	Pergine Valsugana	B
834	Sodalizio Cattolico Italiano	Trentino A.A.	Trento	B
850	IUAV Venezia	Veneto	Venezia	C

Tabella 23 - Gli interventi che hanno rinunciato al cofinanziamento V bando

Interventi di tipologia A1, B, C per i quali è stata presentata formale rinuncia

Prima del Decreto di Piano

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip.
802	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1

Interventi di tipologia A1, B, C per i quali è stata presentata formale rinuncia

Dopo il Decreto di Piano

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip.
736	Fondazione CEUR	Emilia-Romagna	Bologna	C
766	Università di Milano	Lombardia	Milano	B
794	ERDIS Marche	Marche	Urbino	A1

Tabella 24 - Gli interventi di tipologia A2 attivi, suddivisi per area geografica V bando

NORD

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
705	Fondazione CEUR	Emilia-Romagna	Bologna	A2	266	1.000.000
706	Nuovo Mondo Società Cooperativa	Emilia-Romagna	Bologna	A2	65	928.387
709	Università di Milano Bocconi	Lombardia	Milano	A2	333	1.000.000
710[1]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. Fondo Camplus Long Term	Lombardia	Milano	A2	161	909.091
711	Fondazione Collegio S. Caterina da Siena	Lombardia	Pavia	A2	77	814.281
715	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Trento	A2	110	947.868
716	Collegio Don Nicola Mazza	Veneto	Padova	A2	78	893.815
717	ESU Verona	Veneto	Verona	A2	79	221.597
718	ESU Verona	Veneto	Verona	A2	79	642.978
9					**1.248**	**7.358.018[2]**

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

[1] La domanda è stata presentata dalla Fondazione CEUR, la quale ha successivamente optato per la cessione dell'immobile oggetto di intervento al Fondo Camplus Long Term gestito da Praemia REIM Italy SGR S.p.A.
[2] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

CENTRO

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
707	Lazio DISCO	Lazio	Roma	A2	88	601.269
708	Fondazione RUI	Lazio	Roma	A2	52	324.814
714	DSU Toscana	Toscana	Pisa	A2	170	8.08.516
3					**310**	**1.734.598[1]**

[1] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

SUD E ISOLE

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
701	Fondazione Experience	Abruzzo	Chieti	A2	464	326.834
702	Università della Calabria	Calabria	Rende	A2	56	597.266
703	Università della Calabria	Calabria	Rende	A2	84	586.170
704	IPE Napoli	Campania	Napoli	A2	40	548.721
712	ADISU Puglia	Puglia	Bari	A2	168	521.947
713	ADISU Puglia	Puglia	Lecce	A2	108	817.207
6					**920**	**3.434.145[1]**

[1] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

Tabella 25 - Gli interventi di tipologia A1, B, C attivi, suddivisi per area geografica V bando

NORD

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
733	Alma Mater Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	A1	88	4.860.535
734	Alma Mater Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	B	90	11.494.621
735	Fondazione RUI	Emilia-Romagna	Bologna	A1	44	3.542.250
737	Università degli Studi di Ferrara	Emilia-Romagna	Ferrara	A1	119	12.465.956
739	Fondazione Almerici-Montevecchio	Emilia-Romagna	Cesena	A1	40	4.076.833
740[1]	Università di Modena e Reggio Emilia	Emilia-Romagna	Modena	A1	70	6.034.315
741[1]				A1	36	2.601.135
742	Fondazione Collegio S. Carlo	Emilia-Romagna	Modena	A1	106	1.406.420
743	Università degli Studi di Parma	Emilia-Romagna	Parma	A1	61	7.005.391
744	ACER Azienda Casa Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Reggio Emilia	A1	80	10.608.071
749	ALISEO Liguria	Liguria	Genova	A1	66	7.173.602
750	Università degli Studi di Genova	Liguria	Genova	A1	92	6.289.653
751	ALISEO Liguria	Liguria	La Spezia	A1	57	3.035.282
752	Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia	Liguria	La Spezia	A1	52	2.037.557
753	ALISEO Liguria	Liguria	Savona	A1	40	5.074.486
754	Università di Bergamo	Lombardia	Bergamo	A1	255	27.902.263
757	Università Cattolica del Sacro Cuore	Lombardia	Brescia	A1	72	6.840.094
759	Politecnico di Milano	Lombardia	Mantova	B	79	8.572.987
760	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	Garbagnate Milanese	A1	176	14.964.455

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

761	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	259	16.967.499
762	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	A1	104	5.809.565
763	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	208	12.221.415
764	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	144	14.773.742
765	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	244	22.732.777
767	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	137	13.290.122
768	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	250	23.469.052
769	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	244	22.732.777
770	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	250	23.469.052
771	Università Cattolica del Sacro Cuore	Lombardia	Milano	A1	122	9.333.143
772	Accademia Belle Arti Brera	Lombardia	Milano	B	200	17.533.170
773	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	Milano	A1	167	34.711.591
777	Università Humanitas	Lombardia	Pieve Emanuele	B	119	8.696.461
778	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	116	4.869.703
779	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	102	9.475.922
780	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	326	21.019.353
781	Istituto Universitario di Studi Superiori	Lombardia	Pavia	B	96	5.887.039
783	Fondazione Collegio Ghislieri	Lombardia	Pavia	A1	113	6.089.911
784	Fondazione CEUR	Lombardia	Pavia	C	189	18.412.500
785	Università degli Studi dell'Insubria	Lombardia	Varese	A1	46	4.167.280
799	EDISU Piemonte	Piemonte	Savigliano	A1	57	6.780.028
800	EDISU Piemonte	Piemonte	Novara	A1	168	8.509.304
801	EDISU Piemonte	Piemonte	Grugliasco	A1	250	18.991.452
803	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1	208	14.158.712
804	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	B	224	17.317.731
805	Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi	Piemonte	Torino	A1	40	1.726.267
806	Fondazione CEUR	Piemonte	Torino	C	207	14.362.500
832	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Rovereto	B	208	21.603.573
833	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Trento	B	107	10.118.150
838	Università di Padova	Veneto	Legnaro	B	90	4.170.474
839	ESU di Padova	Veneto	Padova	A1	93	2.570.718
840	ESU di Padova	Veneto	Padova	A1	109	4.040.926
841	Università di Padova	Veneto	Padova	A1	85	9.291.120
842[2]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Sviluppo	Veneto	Padova	C	230	14.741.689
843	Fondazione La Casa Onlus	Veneto	Padova	A1	45	1.486.255
844[1]	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	Veneto	Padova	A1	93	7.237.018
845[1]				C	32	0
846[1]				B	0	0
847	Università IUAV Venezia	Veneto	Venezia	A1	200	14.116.413
848	Università Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A1	208	26.905.785
849	IUAV Venezia	Veneto	Venezia	A1	40	4.455.642
851	ESU Verona	Veneto	Verona	C	126	9.150.000
852	Collegio Don Nicola Mazza	Veneto	Verona	A1	40	2.236.860
853	ESU Padova	Veneto	Vicenza	A1	59	2.103.074
854	Urbana Società Cooperativa Sociale	Veneto	Vicenza	A1	40	2.964.115
855	Urbana Società Cooperativa Sociale	Veneto	Vicenza	B	40	1.956.494
65					**8.058**	**662.642.279[3]**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.

[2] La domanda è stata presentata dalla Fondazione CEUR, la quale ha successivamente optato per la cessione dell'immobile oggetto di intervento al Fondo Camplus Sviluppo gestito da Praemia REIM Italy SGR S.p.A.

[3] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

CENTRO

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
745	Lazio DISCO	Lazio	Roma		41	2.967.955

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

746[1]	Università Cattolica del Sacro Cuore	Lazio	Roma	B	80	9.227.178
747[1]				A1	15	0
748[2]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Sviluppo	Lazio	Roma	C	110	12.365.000
786	ERDIS Marche	Marche	Ancona	A1	85	6.527.237
787	ERAP Ascoli Piceno	Marche	Ascoli Piceno	C	76	6.806.487
788[1]	Università di Camerino	Marche	Camerino	A1	231	11.108.034
789[1]				B	0	0
790	Università di Camerino	Marche	Camerino	B	40	3.275.811
791	ERDIS Marche	Marche	Macerata	A1	42	2.519.853
792	ERDIS Marche	Marche	Macerata	A1	91	7.603.334
793	ERDIS Marche	Marche	Fano	A1	40	3.000.446
795	ERDIS Marche	Marche	Urbino	A1	129	3.658.055
796	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	Marche	Urbino	A1	780	19.398.300
797	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	Marche	Urbino	B	200	20.512.679
825	Casa SPA	Toscana	Firenze	B	114	6.861.893
826	Scuola Superiore S. Anna	Toscana	Pisa	A1	73	5.083.382
827	Scuola Normale Superiore	Toscana	Pisa	A1	46	1.662.643
829	DSU Toscana	Toscana	Siena	A1	52	2.255.970
835	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	A1	40	1.927.283
836	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	B	200	24.023.571
837	Fondazione ONAOSI	Umbria	Perugia	A1	121	6.398.099
22					**2.606**	**157.183.209[2]**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.
[2] La domanda è stata presentata dalla Fondazione CEUR, la quale ha successivamente optato per la cessione dell'immobile oggetto di intervento al Fondo Camplus Sviluppo gestito da Praemia REIM Italy SGR S.p.A.
[3] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

SUD E ISOLE

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
719[2]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Sviluppo	Abruzzo	Pescara	C	185	13.176.500
720	Università degli Studi di Catanzaro	Calabria	Catanzaro	B	141	11.471.576
722	Università degli Studi del Sannio	Campania	Benevento	A1	69	4.494.042
723	Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli	Campania	Caserta	A1	122	10.959.828
725	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	50	4.599.694
726	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	186	17.273.328
727	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	100	6.314.006
728[1]	ADISURC	Campania	Napoli	A1	60	9.631.366
729[1]				B	40	0
730	Università degli Studi di Napoli Parthenope	Campania	Napoli	A1	70	5.492.179
731[2]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Sviluppo	Campania	Napoli	C	142	10.495.000
732	Università degli Studi di Napoli Federico II	Campania	Portici	A1	62	6.580.916
807	LUM - Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro	Puglia	Casamassima	B	242	15.510.787
808	ADISU Puglia	Puglia	Brindisi	A1	50	4.658.836
809	Università di Foggia	Puglia	Foggia	A1	64	3.198.590
810	ADISU Puglia	Puglia	Lecce	A1	80	6.342.529
811	Università del Salento	Puglia	Lecce	A1	88	8.218.071
813	ADISU Puglia	Puglia	Taranto	A1	92	6.341.425
814	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	114	4.780.419
816	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	54	949.207
817	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	171	8.148.296

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

818	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	160	5.308.348
819	Università degli Studi di Catania	Sicilia	Catania	A1	97	1.910.010
820	Università degli Studi di Catania	Sicilia	Catania	A1	250	14.021.550
821	Università degli Studi di Catania	Sicilia	Catania	A1	204	9.901.177
822	IACP Catania	Sicilia	Catania	B	188	9.580.853
823	Università KORE di Enna	Sicilia	Enna	B	153	7.339.656
824	Università degli Studi di Messina	Sicilia	Messina	A1	190	9.052.020
28					**3.424**	**215.750.209[2]**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.
[2] La domanda è stata presentata dalla Fondazione CEUR, la quale ha successivamente optato per la cessione dell'immobile oggetto di intervento al Fondo Camplus Sviluppo gestito da Praemia REIM Italy SGR S.p.A.
[3] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

Tabella 26 - Gli interventi di tipologia A1, B, C attivi, suddivisi per tipologia V bando

INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
722	Università degli Studi del Sannio	Campania	Benevento	A1	69	4.494.042
723	Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli	Campania	Caserta	A1	122	10.959.828
725	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	50	4.599.694
726	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	186	17.273.328
727	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	100	6.314.006
728[1]	ADISURC	Campania	Napoli	A1	60	9.631.366
730	Università degli Studi di Napoli Parthenope	Campania	Napoli	A1	70	5.492.179
732	Università degli Studi di Napoli Federico II	Campania	Portici	A1	62	6.580.916
733	Alma Mater Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	A1	88	4.860.535
735	Fondazione RUI	Emilia-Romagna	Bologna	A1	44	3.542.250
737	Università degli Studi di Ferrara	Emilia-Romagna	Ferrara	A1	119	12.465.956
739	Fondazione Almerici-Montevecchio	Emilia-Romagna	Cesena	A1	40	4.076.833
740[1]	Università di Modena e Reggio Emilia	Emilia-Romagna	Modena	A1	70	6.034.315
741[1]				A1	36	2.601.135
742	Fondazione Collegio S. Carlo	Emilia-Romagna	Modena	A1	106	1.406.420
743	Università degli Studi di Parma	Emilia-Romagna	Parma	A1	61	7.005.391
744	ACER Azienda Casa Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Reggio Emilia	A1	80	10.608.071
745	Lazio DISCO	Lazio	Roma	A1	41	2.967.955
747[1]	Università Cattolica del Sacro Cuore	Lazio	Roma	A1	15	0
749	ALISEO Liguria	Liguria	Genova	A1	66	7.173.602
750	Università degli Studi di Genova	Liguria	Genova	A1	92	6.289.653
751	ALISEO Liguria	Liguria	La Spezia	A1	57	3.035.282
752	Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia	Liguria	La Spezia	A1	52	2.037.557
753	ALISEO Liguria	Liguria	Savona	A1	40	5.074.486
754	Università di Bergamo	Lombardia	Bergamo	A1	255	27.902.263
757	Università Cattolica del Sacro Cuore	Lombardia	Brescia	A1	72	6.840.094
760	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	Garbagnate Milanese	A1	176	14.964.455
761	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	259	16.967.499
762	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	A1	104	5.809.565
763	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	208	12.221.415
771	Università Cattolica del Sacro Cuore	Lombardia	Milano	A1	122	9.333.143
773	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	Milano	A1	167	34.711.591
778	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	116	4.869.703,00
779	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	102	9.475.922,41
780	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	326	21.019.353,00

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot. 2026/0000778/TN

783	Fondazione Collegio Ghislieri	Lombardia	Pavia	A1	113	6.089.911,00
785	Università degli Studi dell'Insubria	Lombardia	Varese	A1	46	4.167.280,00
786	ERDIS Marche	Marche	Ancona	A1	85	6.527.237,41
788[1]	Università di Camerino	Marche	Camerino	A1	231	11.108.034,00
791	ERDIS Marche	Marche	Macerata	A1	42	2.519.853,00
792	ERDIS Marche	Marche	Macerata	A1	91	7.603.333,89
793	ERDIS Marche	Marche	Fano	A1	40	3.000.446,23
795	ERDIS Marche	Marche	Urbino	A1	129	3.658.054,52
796	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	Marche	Urbino	A1	780	19.398.300,00
799	EDISU Piemonte	Piemonte	Savigliano	A1	57	6.780.028,00
800	EDISU Piemonte	Piemonte	Novara	A1	168	8.509.303,69
801	EDISU Piemonte	Piemonte	Grugliasco	A1	250	18.991.452,46
803	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1	208	14.158.711,71
805	Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi	Piemonte	Torino	A1	40	1.726.266,66
808	ADISU Puglia	Puglia	Brindisi	A1	50	4.658.836,05
809	Università di Foggia	Puglia	Foggia	A1	64	3.198.590,00
810	ADISU Puglia	Puglia	Lecce	A1	80	6.342.528,95
811	Università del Salento	Puglia	Lecce	A1	88	8.218.071,15
813	ADISU Puglia	Puglia	Taranto	A1	92	6.341.424,90
814	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	114	4.780.419,00
816	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	54	949.207,00
817	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	171	8.148.296,08
818	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	160	5.308.348,39
819	Università degli Studi di Catania	Sicilia	Catania	A1	97	1.910.009,82
820	Università degli Studi di Catania	Sicilia	Catania	A1	250	14.021.549,90
821	Università degli Studi di Catania	Sicilia	Catania	A1	204	9.901.176,92
824	Università degli Studi di Messina	Sicilia	Messina	A1	190	9.052.020,38
826	Scuola Superiore S. Anna	Toscana	Pisa	A1	73	5.083.381,73
827	Scuola Normale Superiore	Toscana	Pisa	A1	46	1.662.642,63
829	DSU Toscana	Toscana	Siena	A1	52	2.255.970,20
835	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	A1	40	1.927.282,72
837	Fondazione ONAOSI	Umbria	Perugia	A1	121	6.398.099,00
839	ESU di Padova	Veneto	Padova	A1	93	2.570.718,00
840	ESU di Padova	Veneto	Padova	A1	109	4.040.925,62
841	Università di Padova	Veneto	Padova	A1	85	9.291.120,00
843	Fondazione La Casa Onlus	Veneto	Padova	A1	45	1.486.255,17
844[1]	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	Veneto	Padova	A1	93	7.237.018,00
847	Università IUAV Venezia	Veneto	Venezia	A1	200	14.116.413,00
848	Università Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A1	208	26.905.785,00
849	IUAV Venezia	Veneto	Venezia	A1	40	4.455.642,00
852	Collegio Don Nicola Mazza	Veneto	Verona	A1	40	2.236.859,66
853	ESU Padova	Veneto	Vicenza	A1	59	2.103.073,63
854	Urbana Società Cooperativa Sociale	Veneto	Vicenza	A1	40	2.964.115,00
78					**8.871**	**600.443.796[2]**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.
[2] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
720	Università degli Studi di Catanzaro	Calabria	Catanzaro	B	141	11.471.576
729[1]	ADISURC	Campania	Napoli	B	40	0
734	Alma Mater Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	B	90	11.494.621
746[1]	Università Cattolica del Sacro Cuore	Lazio	Roma	B	80	9.227.178
759	Politecnico di Milano	Lombardia	Mantova	B	79	8.572.987
764	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	144	14.773.742
765	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	244	22.732.777

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot. 12026/0000778/TN

767	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	137	13.290.122
768	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	250	23.469.052
769	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	244	22.732.777
770	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	250	23.469.052
772	Accademia Belle Arti Brera	Lombardia	Milano	B	200	17.533.170
777	Università Humanitas	Lombardia	Pieve Emanuele	B	119	8.696.461
781	Istituto Universitario di Studi Superiori	Lombardia	Pavia	B	96	5.887.039
789[1]	Università di Camerino	Marche	Camerino	B	0	0
790	Università di Camerino	Marche	Camerino	B	40	3.275.811
797	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	Marche	Urbino	B	200	20.512.679
804	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	B	224	17.317.731
807	LUM - Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro	Puglia	Casamassima	B	242	15.510.787
822	IACP Catania	Sicilia	Catania	B	188	9.580.853
823	Università KORE di Enna	Sicilia	Enna	B	153	7.339.656
825	Casa SPA	Toscana	Firenze	B	114	6.861.893
832	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Rovereto	B	208	21.603.573
833	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Trento	B	107	10.118.150
836	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	B	200	24.023.571
838	Università di Padova	Veneto	Legnaro	B	90	4.170.474
846[1]	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	Veneto	Padova	B	0	0
855	Urbana Società Cooperativa Sociale	Veneto	Vicenza	B	40	1.956.494
28					**3.920**	**335.622.225**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.
[2] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

ACQUISTI

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
719[1]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Sviluppo	Abruzzo	Pescara	C	185	13.176.500
731[1]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Sviluppo	Campania	Napoli	C	142	10.495.000
748[1]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Sviluppo	Lazio	Roma	C	110	12.365.000
784	Fondazione CEUR	Lombardia	Pavia	C	189	18.412.500
787	ERAP Ascoli Piceno	Marche	Ascoli Piceno	C	76	6.806.487
806	Fondazione CEUR	Piemonte	Torino	C	207	14.362.500
842[1]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Sviluppo	Veneto	Padova	C	230	15.005.000
845[2]	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	Veneto	Padova	C	32	0
851	ESU Verona	Veneto	Verona	C	126	9.150.000
9					**1.297**	**99.509.676[3]**

[1] La domanda è stata presentata dalla Fondazione CEUR, la quale ha successivamente optato per la cessione dell'immobile oggetto di intervento al Fondo Camplus Sviluppo gestito da Praemia REIM Italy SGR S.p.A.
[2] Interventi inseriti in un programma unitario.
[3] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

Tabella 27 - Gli interventi conclusi e funzionanti V bando

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
704	I.P.E. Istituto per ricerche ed attività educative	Campania	Napoli	A2	40	548.720
705	Fondazione CEUR	Emilia-Romagna	Bologna	A2	266	1.000.000
708	Fondazione RUI	Lazio	Roma	A2	52	324.814
709	Università Commerciale Luigi Bocconi	Lombardia	Milano		333	1.000.000

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

711	Fondazione Collegio S. Caterina da Siena	Lombardia	Pavia	A2	77	814.281
713	ADISU Puglia	Puglia	Lecce	A2	108	817.207
716	Collegio Universitario Don Nicola Mazza	Veneto	Padova	A2	78	893.815
742	Fondazione Collegio S. Carlo	Emilia-Romagna	Modena	A1	106	1.406.420
842[1]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Sviluppo	Veneto	Padova	C	230	14.741.689
9					**1.290**	**21.546.947[2]**

[1] La domanda è stata presentata dalla Fondazione CEUR, la quale ha successivamente optato per la cessione dell'immobile oggetto di intervento al Fondo Camplus Sviluppo gestito da Praemia REIM Italy SGR S.p.A.
[2] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

Tabella 28 - Gli interventi funzionanti non formalmente conclusi V bando

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
701	Fondazione Experience	Abruzzo	Chieti	A2	464	362.834
706	Nuovo Mondo Società Cooperativa	Emilia-Romagna	Bologna	A2	65	928.387
710[1]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Long Term	Lombardia	Milano	A2	161	909.091
712	ADISU Puglia	Puglia	Bari	A2	168	521.947
826	Scuola Superiore S. Anna	Toscana	Pisa	A1	73	5.083.382
5					**931**	**7.805.641[2]**

[1] La domanda è stata presentata dalla Fondazione CEUR, la quale ha successivamente optato per la cessione dell'immobile oggetto di intervento al Fondo Camplus Long Term gestito da Praemia REIM Italy SGR S.p.A.
[2] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

Tabella 29 - Gli interventi per i quali i lavori risultano terminati V bando

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
702	Università della Calabria	Calabria	Rende	A2	56	597.265,86
703	Università della Calabria	Calabria	Rende	A2	84	586.170,38
715	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Trento	A2	110	947.868,32
717	ESU Verona	Veneto	Verona	A2	79	221.597,20
718	ESU Verona	Veneto	Verona	A2	79	642.977,72
5					**408**	**2.995.879[1]**

[1] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

Tabella 30 - Gli interventi in corso di realizzazione V bando

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
707[3]	Lazio DiSCo	Lazio	Roma	A2	88	601.269
714[3]	DSU Toscana	Toscana	Pisa	A2	170	808.516
719	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Sviluppo	Abruzzo	Pescara	C	185	13.176.500
722[3]	Università degli Studi del Sannio	Campania	Benevento	A1	69	4.494.042
731[3]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Sviluppo	Campania	Napoli	C	142	10.495.000
737	Università degli Studi di Ferrara	Emilia-Romagna	Ferrara	A1	119	12.465.956
743	Università degli Studi di Parma	Emilia-Romagna	Parma		61	7.005.391

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot. 2026/0000778/TN

745	Lazio DISCO	Lazio	Roma	A1	41	2.967.955
746[1]	Università Cattolica del Sacro Cuore	Lazio	Roma	B	80	9.227.178
747[1]				A1	15	0
748[3]	Praemia REIM Italy SGR S.p.A. - Fondo Camplus Sviluppo	Lazio	Roma	C	110	12.365.000
750	Università degli Studi di Genova	Liguria	Genova	A1	92	6.289.653
*761	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	A1	259	16.967.499
763[3]	Università degli Studi di Milano	Lombardia	Milano	A1	208	12.221.415
769	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	244	22.732.777
771	Università Cattolica del Sacro Cuore	Lombardia	Milano	A1	122	9.333.143
785	Università degli Studi dell'Insubria	Lombardia	Varese	A1	46	4.167.280
786	ERDIS Marche	Marche	Ancona	A1	85	6.527.237
792	ERDIS Marche	Marche	Macerata	A1	91	7.603.334
805[3]	Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi	Piemonte	Torino	A1	40	1.726.267
*806	Fondazione CEUR	Piemonte	Torino	C	207	14.362.500
819	Università degli Studi di Catania	Sicilia	Catania	A1	97	1.910.010
820	Università degli Studi di Catania	Sicilia	Catania	A1	250	14.021.550
821	Università degli Studi di Catania	Sicilia	Catania	A1	204	9.901.177
824	Università degli Studi di Messina	Sicilia	Messina	A1	190	9.052.020
827	Scuola Normale Superiore	Toscana	Pisa	A1	46	1.662.643
829	DSU Toscana	Toscana	Siena	A1	52	2.255.970
835[3]	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	A1	40	1.927.283
840	ESU di Padova	Veneto	Padova	A1	109	4.040.926
*848	Università Ca' Foscari Venezia	Veneto	Venezia	A1	208	26.905.785
*851	ESU Verona	Veneto	Verona	C	126	9.150.000
*852[3]	Collegio Don Nicola Mazza	Veneto	Verona	A1	40	2.236.860
32					**3.836**	**258.602.136[2]**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.
[2] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.
[3] Interventi per i quali la messa in esercizio è prevista entro il 2026.
* Interventi di Fase 2 ammessi definitivamente con il primo scorrimento (D.M. 1666/2024).

Tabella 31 - Gli interventi per i quali i lavori non sono ancora iniziati V bando

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
720	Università degli Studi di Catanzaro	Calabria	Catanzaro	B	141	11.471.576
723	Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli	Campania	Caserta	A1	122	10.959.828
725	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	50	4.599.694
728[1]	ADISURC	Campania	Napoli	A1	60	9.631.366
729[1]				B	40	0
730	Università degli Studi di Napoli Parthenope	Campania	Napoli	A1	70	5.492.179
732	Università degli Studi di Napoli Federico II	Campania	Portici	A1	62	6.580.916
733	Alma Mater Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	A1	88	4.860.535
740[1]	Università di Modena e Reggio Emilia	Emilia-Romagna	Modena	A1	70	6.034.315
741[1]				A1	36	2.601.135
749	ALISEO Liguria	Liguria	Genova	A1	66	7.173.602
751	ALISEO Liguria	Liguria	La Spezia	A1	57	3.035.282
**753	ALISEO Liguria	Liguria	Savona	A1	40	5.074.486
*764	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	144	14.773.742
**765	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	244	22.732.777
**768	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	250	23.469.052
**770	Politecnico di Milano	Lombardia	Milano	B	250	23.469.052
**773	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	Milano	A1	167	34.711.591
*778	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia		116	4.869.703
779	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia		102	9.475.922

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

**783	Fondazione Collegio Ghislieri	Lombardia	Pavia	A1	113	6.089.911
*788[1]	Università di Camerino	Marche	Camerino	A1	231	11.108.034
*789[1]				B	0	0
*793	ERDIS Marche	Marche	Fano	A1	40	3.000.446
*795	ERDIS Marche	Marche	Urbino	A1	129	3.658.055
796	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	Marche	Urbino	A1	780	19.398.300
*799	EDISU Piemonte	Piemonte	Savigliano	A1	57	6.780.028
800	EDISU Piemonte	Piemonte	Novara	A1	168	8.509.304
801	EDISU Piemonte	Piemonte	Grugliasco	A1	250	18.991.452
803	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	A1	208	14.158.712
807	LUM - Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro	Puglia	Casamassima	B	242	15.510.787
808	ADISU Puglia	Puglia	Brindisi	A1	50	4.658.836
809	Università di Foggia	Puglia	Foggia	A1	64	3.198.590
810	ADISU Puglia	Puglia	Lecce	A1	80	6.342.529
811	Università del Salento	Puglia	Lecce	A1	88	8.218.071
813	ADISU Puglia	Puglia	Taranto	A1	92	6.341.425
816	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	54	949.207
817	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	171	8.148.296
818	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	160	5.308.348
825	Casa SPA	Toscana	Firenze	B	114	6.861.893
**832	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Rovereto	B	208	21.603.573
**833	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	Trento	B	107	10.118.150
*836	ADISU Umbria	Umbria	Perugia	B	200	24.023.571
*837	Fondazione ONAOSI	Umbria	Perugia	A1	121	6.398.099
841	Università di Padova	Veneto	Padova	A1	85	9.291.120
843	Fondazione La Casa Onlus	Veneto	Padova	A1	45	1.486.255
*853	ESU di Padova	Veneto	Vicenza	A1	59	2.103.074
47					**6.091**	**443.272.818[2]**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.
[2] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.
* Interventi di Fase 2 ammessi definitivamente con il primo scorrimento (D.M. 1666/2024).
** Interventi di Fase 2 ammessi definitivamente con il secondo scorrimento (D.M. 584/2025).

Tabella 32 - Gli interventi ammessi in fase 2 in attesa dell'ammissione definitiva V bando

F.	Soggetto	Regione	Città	Tip	p.a.	Cofin. €
726	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	186	17.273.328
727	Regione Campania	Campania	Napoli	A1	100	6.314.006
734	Alma Mater Università di Bologna	Emilia-Romagna	Bologna	B	90	11.494.621
735	Fondazione RUI	Emilia-Romagna	Bologna	A1	44	3.542.250
739	Fondazione Almerici-Montevecchio	Emilia-Romagna	Cesena	A1	40	4.076.833
744	ACER Azienda Casa Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Reggio Emilia	A1	80	10.608.071
752	Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia	Liguria	La Spezia	A1	52	2.037.557
754	Università di Bergamo	Lombardia	Bergamo	A1	255	27.902.263
757	Università Cattolica del Sacro Cuore	Lombardia	Brescia	A1	72	6.840.094,00
759	Politecnico di Milano	Lombardia	Mantova	B	79	8.572.987,00
760	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	Garbagnate Milanese	A1	176	14.964.455
762	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	A1	104	5.809.565
767	Università di Milano Bicocca	Lombardia	Milano	B	137	13.290.122
772	Accademia Belle Arti Brera	Lombardia	Milano	B	200	17.533.170

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

777	Università Humanitas	Lombardia	Pieve Emanuele	B	119	8.696.461
780	EDISU Pavia	Lombardia	Pavia	A1	326	21.019.353
781	Istituto Universitario di Studi Superiori	Lombardia	Pavia	B	96	5.887.039
784	Fondazione CEUR	Lombardia	Pavia	C	189	18.412.500
787	ERAP Ascoli Piceno	Marche	Ascoli Piceno	C	76	6.806.487
790	Università di Camerino	Marche	Camerino	B	40	3.275.811
791	ERDIS Marche	Marche	Macerata	A1	42	2.519.853
797	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	Marche	Urbino	B	200	20.512.679
804	EDISU Piemonte	Piemonte	Torino	B	224	17.317.731
814	ERSU Catania	Sicilia	Catania	A1	114	4.780.419
822	IACP Catania	Sicilia	Catania	B	188	9.580.853
823	Università KORE di Enna	Sicilia	Enna	B	153	7.339.656
838	Università di Padova	Veneto	Legnaro	B	90	4.170.474
839	ESU di Padova	Veneto	Padova	A1	93	2.570.718
844[1]	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	Veneto	Padova	A1	93	7.237.018
845[1]				C	32	0
846[1]				B	0	0
847	IUAV Venezia	Veneto	Venezia	A1	200	14.116.413
849	IUAV Venezia	Veneto	Venezia	A1	40	4.455.642
854	Urbana Società Cooperativa Sociale	Veneto	Vicenza	A1	40	2.964.115
855	Urbana Società Cooperativa Sociale	Veneto	Vicenza	B	40	1.956.494
35					**4.010**	**313.879.037[2]**

[1] Interventi inseriti in un programma unitario.

Tabella 33 - Il quadro complessivo di attuazione degli interventi V bando

	n.	%	Cofin. €	%	p.a.	%
Interventi chiusi e funzionanti	**9**	**6,77**	**21.546.947**	**2,06**	**1.290**	**7,79**
Interventi funzionanti ma non formalmente chiusi	**5**	**3,76**	**7.805.641**	**0,74**	**931**	**5,62**
Interventi per i quali i lavori risultano terminati	**5**	**3,76**	**2.995.879**	**0,29**	**408**	**2,46**
Interventi in corso di realizzazione	**32**	**24,06**	**258.602.136**	**24,67**	**3.836**	**23,16**
Interventi per i quali i lavori non sono ancora iniziati	**47**	**35,34**	**443.272.818**	**42,29**	**6.091**	**36,77**
Interventi ammessi in fase 2 in attesa dell'ammissione definitiva	**35**	**26,32**	**313.879.037**	**29,95**	**4.010**	**24,21**
Totale degli interventi attivi	**133**	**100**	**1.048.102.458[1]**	**100**	**16.566**	**100**

[1] Il cofinanziamento indicato tiene conto delle rideterminazioni effettuate a seguito di economie conseguite.

5. Il premio "professor Romano Del Nord" alla migliore residenza universitaria italiana

Con specifico Decreto il MUR, nel febbraio del 2018, ha istituito il "Premio 'professor Romano Del Nord' alla migliore residenza universitaria italiana – legge n. 338/2000". Il premio nasce con il duplice obiettivo di affermare le opportunità fornite dall'applicazione della legge in termini di sperimentazioni processuali, tipologiche, tecnologiche e gestionali, e riconoscere il valore

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

dell'attività svolta dal professor Romano Del Nord, prematuramente scomparso, sul tema della residenza universitaria.
Romano Del Nord, professore ordinario di Tecnologia dell'Architettura, è stato capace di compenetrare ad alto livello la ricerca scientifica, l'impegno accademico e quello professionale, costituendo così con la sua personalità un esempio di come queste tre dimensioni si intendano fortemente connesse. Ha svolto numerose ricerche per importanti e qualificati committenti e ha ricoperto ruoli di rappresentanza e consulenza per istituzioni di livello nazionale e internazionale.
È stato consulente del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute per i quali ha svolto ricerche per la definizione di standard normativi e di modelli di calcolo del fabbisogno di edilizia universitaria e scolastica e sul tema dell'umanizzazione delle strutture ospedaliere. È stato componente dell'Osservatorio Nazionale per l'Edilizia Scolastica e responsabile del gruppo di lavoro per l'elaborazione di norme tecniche di indirizzo sempre per la edilizia scolastica, consulente esperto per l'Osservatorio centrale dei Lavori Pubblici e coordinatore del gruppo di definizione dei costi standardizzati per l'edilizia Ospedaliera per l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. Il professor Del Nord ha promosso l'approvazione della legge n. 338/2000, ha contribuito alla definizione degli standard quali-quantitativi delle residenze universitarie, ha messo a punto le procedure di richiesta del cofinanziamento statale e ha guidato la Commissione per quindici anni.
Il Decreto prevede l'istituzione di un Comitato di valutazione, nominato dalla stessa Commissione con durata triennale, composto da un architetto di chiara fama, un membro della Commissione, un rappresentante della Società Italiana di Tecnologia dell'Architettura, un rappresentante del Dipartimento di Architettura di Firenze e un componente designato dalla famiglia del professor Del Nord.

La prima edizione del premio, per l'anno 2018, è stata assegnata alla Residenza universitaria "Collegio via dei Benedettini" di Palermo, promossa dalla fondazione CEUR (codice E7S8AW8/01, II bando); l'edizione del 2019 è stata assegnata alla residenza "ex convento dei Crociferi" di Venezia, promossa dalla Fondazione IUAV (codice E1SRH9K/01, III bando) e l'edizione del 2020 alla residenza Castiglioni promossa dall'Università di Milano Bocconi (codice E1S5H3A/01, III bando). La quarta edizione del premio, per l'anno 2021, è stata assegnata alla Residenza universitaria "Villa Val di Rose" di Sesto Fiorentino (FI), promossa dall'Università di Firenze (codice EFUTEYF/01-02, I bando); la quinta edizione, per l'anno 2022, è stata assegnata alla residenza "Mayer" di Trento, promossa dall'Opera universitaria di Trento (codice E7SE7A4/01, II bando) e la sesta edizione, per l'anno 2023, è stata assegnata alla residenza "Campus San Giobbe" a Venezia, promossa dall'Università Ca' Foscari (codice E1S84XF/01, III bando). Attualmente sono in corso le attività di valutazione per la settima edizione.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN

6. I pignoramenti nei confronti del MUR

Come noto, sul conto di tesoreria n. 23374/1298, intestato a "MIUR Alloggi Studenti L. 338/00", Cassa Depositi e prestiti S.p.A. (CDP) è autorizzata, quale gestore dei fondi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, ad effettuare operazioni di prelevamento e di versamento, come da nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2005, n. 166134. La Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato di Roma, con nota del 28 aprile 2017, n. 562266/17, ha comunicato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), a CDP e all'Avvocatura Generale dello Stato il trasferimento dal 1° gennaio 2017 sul già menzionato conto corrente n. 23374 degli accantonamenti ai fini di giustizia contro il MIUR, che si sono verificati fino al 31/12/2024 nel numero di 3.795 di operazioni di prelievo per un importo complessivo di € 54.426.686,17.

Con l'art. 17, comma 1, lettera d) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, è stato introdotto nel corpo della legge 14 novembre 2000, n. 338 l'articolo 2-bis, rubricato "Disposizioni sulle risorse per gli alloggi e residenze per studenti universitari" del quale rileva, il primo comma, a mente del quale "*Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal MUR al finanziamento delle attività di cui alla legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio*".

La Commissione ha preso atto assai favorevolmente di quanto previsto dal nuovo articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338 ed evidenzia la necessità di individuare strumenti che consentano il recupero delle somme prelevate nel passato, che hanno comportato un depauperamento del conto di tesoreria destinato agli interventi della legge n. 338/2000 attualmente quantificato in oltre 54 milioni di euro.

Nel corso del 2025 si sono verificati accantonamenti ai fini di giustizia contro il MIUR nel numero di 6 operazioni di prelievo per un importo complessivo di € 247.977,00 e operazioni di riaccredito nel numero di 10 operazioni per un importo complessivo di € 8.308,66.

Il Presidente della Commissione
prof. Stefano Paolo Corgnati

.....

Firmato digitalmente da: Stefano Paolo Corgnati
Organizzazione: POLITECNICO DI TORINO/00518460019
Unità organizzativa: PERSONALE
Data: 17/02/2026 08:30:58

Camera dei Deputati **ARRIVO 07 maggio 2026 Prot: 2026/0000778/TN**
